

---

**ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
ТОО "ENGINEERING SERVICES"**

---



---

**ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  
ТОО "ENGINEERING SERVICES"**

---

**Отчет инжиниринговой компании в сфере  
долевого участия в жилищном строительстве о  
результатах мониторинга за ходом  
строительства многоквартирного жилого дома**

**ОБЪЕКТ: «Строительство среднеэтажных жилых домов,  
расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453. I, II  
очередь (без наружных инженерных сетей)»**

**Февраль, 2023г.**

## Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга с «1» по «28» февраля 2023г.;

Периодичность: ежемесячно;

**Круг лиц, представляющих:** юридические лица Республики Казахстан, заключившие договора на оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора - ТОО «Engineering Services» на основании договора о предоставлении инжиниринговых услуг №ДИУ-22-10-007/108 от 16.09.2022г.;

**Куда представляется:** Единый оператор жилищного строительства и ТОО «Инновация плюс»;

**Сроки предоставления:** ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем.

**Порядковый номер отчета:** № ДИУ-22-10-007/108/2023-02;

**Информация по проекту:** «Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453. I, II очередь (без наружных инженерных сетей)»

**Общие сроки реализации проекта:** 28.04.2022г.-28.10.2023г

**Начало строительно-монтажных работ:** 28 апреля 2022 года (согласно уведомлению о начале СМР).

**Ввод объекта в эксплуатацию:** 28 октября 2023г. (согласно ДПГ-22-10- 056/121 от 19.09.22г.)

**Нормативный срок строительства:** 18 месяцев (согласно заключению ТОО «КАЗ ЖОБА ЭКСПЕРТИЗА» в г. Нур-Султан.)

### 1. Участники проекта:

Таблица 1

№ п/п	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	ТОО «Инновация плюс»	Строительство		Нысанов У.Б.	Директор	<a href="mailto:kst-sn@mail.ru">kst-sn@mail.ru</a>
2	Генеральный подрядчик	ТОО «Trans Service Company AST»	Подрядные работы	№01 от 22.04.2022г.	Шеремет В.А.	Директор	+7(701)233-3422
3	Авторский надзор	ТОО "Қостанайжобақұрылыс"	Проектирование	№ 4-027/20 от 06.08.2021 г.	Абдуллин Г.С.	Директор	+7(705)450-4240
5	Инжиниринговая компания	ТОО «Engineering Services»	Инжиниринговые услуги	№ДИУ-22-10-007/108 от 16.09.2022г	Бикбаев К.Н	Директор	+7(771)505-1980 <a href="mailto:info@eng-services.kz">info@eng-services.kz</a>
6	Генеральный проектировщик	ТОО "Қостанайжобақұрылыс"	Проектирование	№1 от 06.01.2021г.	Абдуллин Г.С	Директор	+7(705)450-4240





- 1.7 Акт освидетельствования и приемки котлована;
- 1.8 Акт скрытых работ на устройство фундаментов;
- 1.9 Акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;
- 1.10 Акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;

**2) Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительной и приемо-сдаточной документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан:** замечаний нет, все необходимые документы предоставлены в полном объеме

#### **7. Анализ проектной документации:**

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета:

1.1 Договор №1 от 06.01.2021г. на разработку проектно-сметной документации без наружных инженерных сетей (Генеральный проектировщик ТОО «ТОО "Қостанайжобақұрылыс"», лицензия ГСЛ № 15011805 от 23.06.2015г на осуществление проектной деятельности. Договор исполнен.

1.2 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлены положительные заключения:

- ТОО «КАЗ ЖОБА ЭКСПЕРТИЗА» в г.Нур-султан от 09.06.2022г. №КЖЭ-0108/22

**Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков:**

Выполнена корректировка проектно-сметной документации, в связи с изменениями планировки дома, с получением положительных заключений экспертизы, выданных ТОО «Smart System Service» в г. Астана №SSS-0015/22 от 29.11.20г. Было произведено проектирование 64-квартирного жилого дома I-й очереди и 68-квартирного жилого дома II-й очереди. Несоответствия нормативной базе РК не выявлены.

#### **8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ**

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период;

За отчетный период выполнялись:

- Кладка стен и перегородок

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта

#### **Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта**

Таблица 3

Разделы проекта	План на месяц, %	Факт на месяц, %	Отклонение на месяц (+/-), %
<b>ВСЕГО по объекту, в том числе:</b>	<b>6,31%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-6,31%</b>
Конструкции железобетонные	0,92%	0,00%	-0,92%
Архитектурно-строительные решения	3,03%	0,00%	-3,03%
Отопление и вентиляция	0,25%	0,00%	-0,25%
Водопровод и канализация	0,72%	0,00%	-0,72%
Электрооборудование, слабые токи	1,39%	0,00%	-1,39%

*Примечание: факт отражает документально закрытыми объемами работ (ЗКС, АВР).*

*1) По плану выполнение работ на 28.02.2023г. –58,14%, факт выполнения работ на 28.02.2023г. –50%, отставание составляет 8,14% (согласно приложению №1 к отчету).*

2)СМР+прочее План 58,49%, факт 50,11%, отставание составляет 8,38%

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на информацию по текущему состоянию, согласно [приложению 1](#) к настоящему отчету.

4) Соблюдение графика производства работ: на отчетный период имеются отставания от графика производства работ по кладочным работам.

анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ:

#### Отставание/опережение по объекту

Таблица 4

Наименование работ	Отставание (-) /опережение (+) по видам работ, дней	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	-4	Не достаточное количество рабочей силы
Архитектурно-строительные решения	-13	Не достаточное количество рабочей силы
Отопление и вентиляция	-1	Не достаточное количество рабочей силы
Водопровод и канализация	-3	Не достаточное количество рабочей силы
Электрооборудование, слабые токи	-6	Не достаточное количество рабочей силы
<b>итого</b>	<b>-28</b>	Отставание за февраль 2023г.
<b>Итого отставание</b>	<b>-23</b>	Итого отставание за февраль 28 дней и отставание с нарастающим итогом с начала строительства составляет 23 дня

1) анализ влияния отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения проекта строительства:

На момент составления отчета, имеются отставания не оказывающие влияние на окончательный срок завершения проекта.

2) предложения по возможным способам устранения отставания (при наличии):

1. Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company AST» СМР выполнять в соответствии с графиком производства работ.

2. Заказчику ТОО ТОО «Инновация плюс» обеспечить завершение строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не позднее 28.10.2023 года.

#### 9. Мероприятия по контролю качества:

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период:

серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют;

причины возникновения выявленных дефектов - нет;

2) Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по разделам: документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-монтажных работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрические и

слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии):

### Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№ п/п	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период		Итого не устранено на текущую дату
				Выявлено	Устранено	
1.	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2.	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3.	По качеству СМР, в том числе:					
3.1.	Архитектурно-строительный раздел	0	0	0	0	0
3.2.	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.3.	Водопровод и канализация	0	0	0	0	0
3.4.	Электрические и слаботочные сети	0	0	0	0	0
3.5.	Газоснабжение (при его наличии)	0	0	0	0	0
3.6.	Благоустройство	0	0	0	0	0
3.7.	Внутриплощадочные сети	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций:

1.нет

Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета:

1. Не устраненные замечания за отчетный период отсутствуют.

#### 10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется.

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): замечаний нет.

#### 11. Сведения об изменениях на объекте, перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов

**Ноябрь 2022г.** В рабочей документации была выполнена корректировка проектно-сметной документации, в связи с изменениями планировки дома, с получением положительных заключений экспертизы, выданных ТОО «Smart System Service» в г. Астана №SSS-0015/22 от 29.11.20г.;

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало;

Сведения об изменениях графиков производства работ: отсутствуют.

## 12. Анализ финансовой части

Таблица 6

тенге

Сумма оплат и сумма освоения

№ п/п	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка проектно-сметной документации	6 776 000	6 776 000	6 776 000	-	-	-	-	6 776 000	6 776 000
2	Прохождение экспертизы	1 400 000	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
3	Строительно-монтажные работы и оборудование	<b>1 676 543 405</b>	<b>208 972 456</b>	208 972 456	81 300 000	239 200 000	-	629 299 246	448 172 456	<b>838 271 702</b>
	<i>в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года "О долевом участии в жилищном строительстве" изм. от 09.06.20г. №341-VI</i>	<i>167 654 341</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4	Авторский надзор	<b>15 256 545</b>	<b>2 839 845</b>	2 839 845	-	-	-	-	2 839 845	2 839 845
5	Технический надзор	63 205 686	12 654 155	12 654 155	-	-	-	21 676 663	12 654 155	34 330 818
	<b>Всего по проекту (смета)</b>	<b>1 763 181 636</b>	<b>232 642 456</b>	<b>232 642 456</b>	<b>81 300 000</b>	<b>239 200 000</b>	<b>-</b>	<b>650 975 909</b>	<b>471 842 456</b>	<b>883 618 365</b>
6	Иные расходы	<b>176 318 164</b>	-	-	180 361	2 824 091	180 361	2 824 091	2 824 091	2 824 091
	<b>Всего по проекту (смета) и иные расходы:</b>	<b>1 939 499 800</b>	<b>232 642 456</b>	<b>232 642 456</b>	<b>81 480 361</b>	<b>242 024 091</b>	<b>180 361</b>	<b>653 800 000</b>	<b>474 666 546</b>	<b>886 442 455</b>

Вывод: Инжиниринговая компания подтверждает целевое использование денежных средств дольщиков, фактов не целевого использования денежных средств в отчетном месяце не было зафиксировано

\*Бюджет строительства складывается из затрат на ПИР, Прочие затраты (10% от стоимости строительства), затраты на СМР (работы, материалы), затраты на авторский, технический надзор.

## Информация по источникам финансирования

Таблица 7

тенге

№ п/п	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	81 819 322	242 391 918
1.1.	банк		0
1.2.	Застройщик минус пеня и КСК застр.	51 757 000	198 899 949
1.3.	прочие	30 062 322	41 975 422
1.5.	прочие ГВ ИК 3%	0	1 516 546
2.	Дольщики	0	0
	итого ДДУ	<b>0</b>	<b>0</b>
	Всего:	<b>81 819 322</b>	<b>242 391 918</b>
Вывод: Нет поступления денежных средств от дольщиков			

Примечание: \*За отчетный период квартиры не были проданы



**\*\*С начала продаж по отчетный период было продано (по ДДУ):**

- 0 квартир

### Анализ договоров

Таблица 8  
тенге

№ п/п	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	1 676 543 405	1 676 543 405	0
2	Договора поставки материалов, договора аренды техники*	0	0	0
3	Договор оказание услуг авторского надзора	3 539 845	15 256 545	11 716 700
4	Договор оказание услуг технического надзора	63 205 686	63 205 686	0
	* при наличии специальной экономической зоны			
Вывод: Стоимость по договорам не превышает стоимость по проектно-сметной документации				

### Анализ плана финансирования

Таблица 9  
тенге

№ п/п	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 763 181 636	98 287 499	81 300 000	16 987 499	1 111 467 958	471 842 456	639 625 503

### 13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что:

По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации.

По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы.

По срокам производства работ: По 2-ой очереди жилых домов имеются отставания от графика производства работ по кладочным работам и по установке плит перекрытий.

По качеству выполняемых работ – серьезные недостатки и дефекты за данный период отсутствуют. На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества за ходом строительно-монтажных работ.

#### Рекомендации от инжиниринговой компании:

##### Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company AST»:

1. Увеличить количество рабочей силы;
2. Обеспечить завершение всех работ согласно графику производства работ.

**Заказчику ТОО «Иновация плюс»:**

1. Обеспечить завершение строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не позднее 28.10.2023 года.
2. Продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

**Состав инжиниринговой компании:**

**Руководитель организации:**

Директор ТОО «Engineering Services» - Бикбаев К.Н.

Эксперт ТН по общестроительным работам ТОО «Engineering Services» - Балымбетов А.


Специалист по учету затрат ТОО «Engineering Services» - Ошан М.М.

Дата составления отчета «15» марта 2023г.

Информация по текущей ситуации



Процент фактического выполнения высчитан согласно ЗКС и АВР.

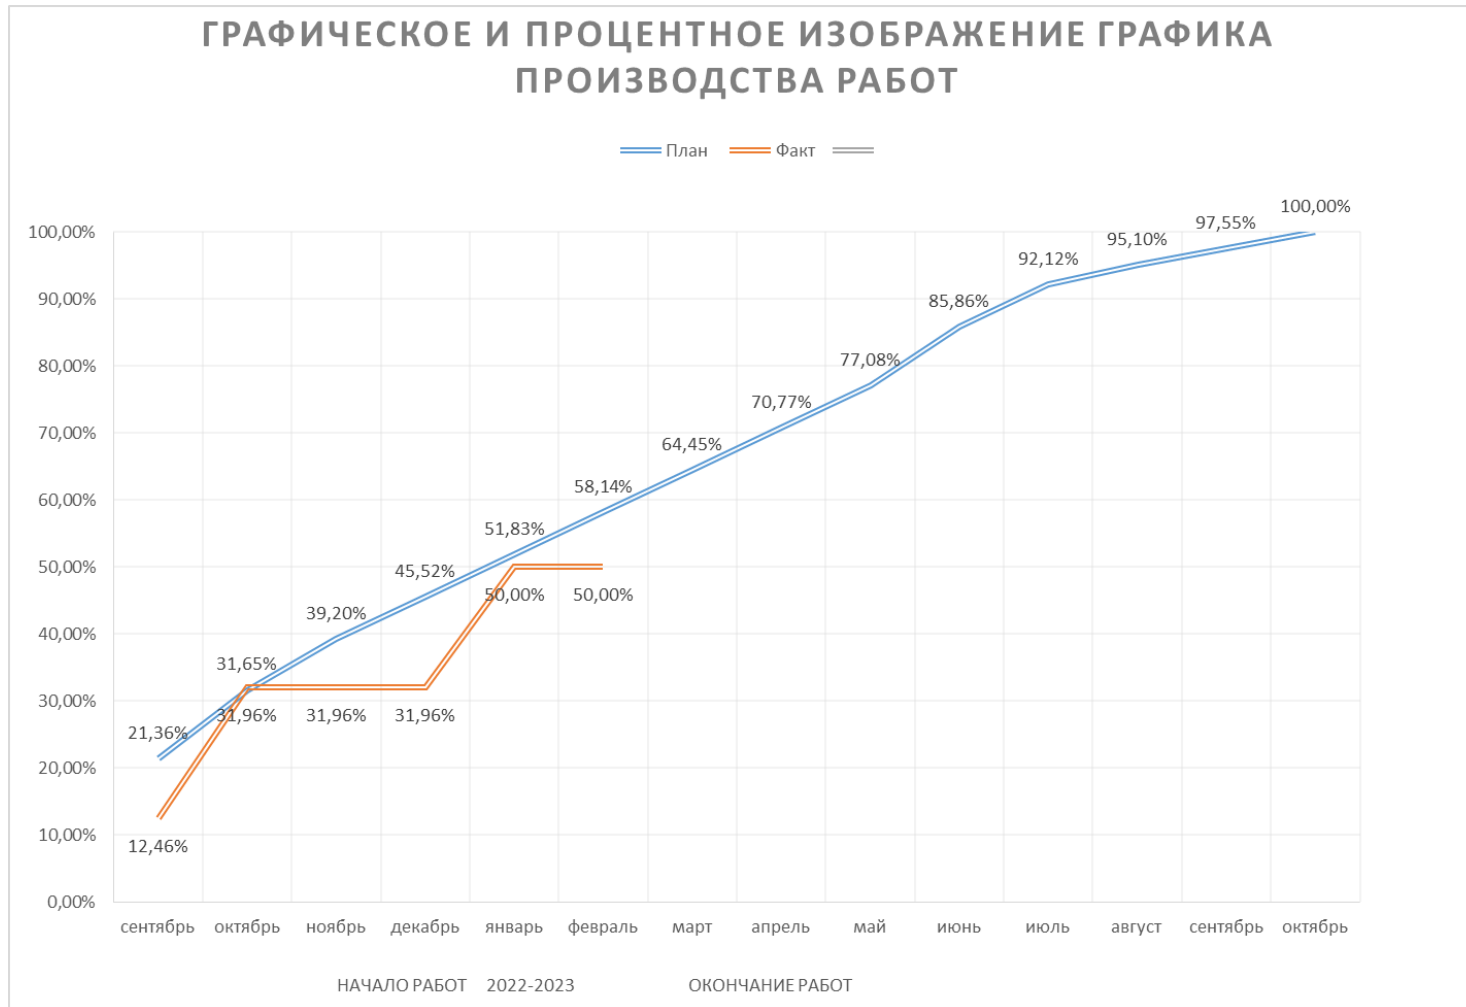

**Вертикальный график фактически выполненных работ по объекту "Строительство среднеэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г.Костанай, ул. Каирбекова, 453".**

**Секции 1-2**

Процент выполнения	Конструктивные решения		Архитектурные решения		Водопровод канализация		Отопление вентиляция, блочный тепловой пункт		Электромонтажные работы	
	ГПР	Факт	ГПР	Факт	ГПР	Факт	ГПР	Факт	ГПР	Факт
Дата завершения по графику производства работ	30.06.23		01.10.23		01.10.23		01.10.23		01.10.23	
100%										
90%										
80%	80%									
70%		72%								
60%			61%							
50%						50%		50%		50%
40%				41%	42%		42%			
30%									38%	
20%										
10%										

■ План по графику производства

■ Выполнено фактически

■ Работы по которым имеются отставания

<b>Отставание</b>	Имеются отставания от ГПР по секциям с 1 по 2: - по кладочным работам по установке плит перекрытий	<b>Действия инжиниринговой компании</b>	в отчете за январь были выданы рекомендации об устранении отставаний от ГПР	<b>Рекомендации</b>	1. Генеральному подрядчику ТОО «Trans Service Company AST» устранить отставания по СМР, СМР выполнять в соответствии с графиком производства работ. 2. Заказчику ТОО «Иновация плюс» обеспечить завершение строительства объекта и приемку объекта в эксплуатацию не позднее 28.10.2023 года.	<b>План мероприятий</b>	
-------------------	---	---	---	---------------------	--	-------------------------	--

## Электронный документ подписан с использованием электронной цифровой подписи в Unity BPM

Наименование документа	Подписание ежемесячных отчетов
Номер и дата документа	№ 00001413 от 14.03.2023
Электронные цифровые подписи документа	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ENGINEERING SERVICES" ЭЦП сотрудника: ЕСАРТИЯ МАРИЯ 850411450608 Дата и время подписания: 14.03.2023 15:15:37
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ENGINEERING SERVICES" ЭЦП сотрудника: ОШАН МАДИНА 961116450312 Дата и время подписания: 14.03.2023 09:51:18
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ENGINEERING SERVICES" ЭЦП сотрудника: БАЛЫМБЕТОВ АКНИЕТ 661212350177 Дата и время подписания: 15.03.2023 10:45:21
