

**«Технадзор-Строй и К» ЖШС**

РҚ, Қостана қ. д-лы Нұрсултан  
Назарбаев 193А, кабинет №14  
БСН 160740001609  
ЖСК KZ1696513F0007234433  
Қостанай қ. "ForteBank" АҚ филиалы  
БСК IRTYZKA



**ТОО «Технадзор-Строй и К»**

РҚ, г. Костанай, пр-т Нұрсултана  
Назарбаева 193А кабинет №14  
БИН 160740001609  
ИИК KZ1696513F0007234433  
Филиал АО "ForteBank" в г.Костанай  
БИК IRTYKZKA

**Отчет инжиниринговой компании в сфере  
долевого участия в жилищном строительстве  
о результатах мониторинга за ходом  
строительства жилого дома (жилого здания)**

**ОБЪЕКТ: «Строительство многоквартирного жилого дома №109 по  
ГП со в мкр. Береке в городе Костанай Костанайской области» (без  
наружных инженерных сетей и благоустройства)**

**Январь 2023г.  
г. Костанай**

**Индекс: 110000**

**Отчетный период мониторинга:** с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.

**Периодичность:** ежемесячно;

**Круг лиц представляющих:** юридические лица Республики Казахстан, заключившие договора на оказание инжиниринговых услуг, осуществляющих функцию технического надзора – ТОО «Технадзор Строй и К», (свидетельство об аккредитации №KZ06VWC0055874 от 25.02.2022 г. на право осуществления экспертных работ на объектах первого и второго уровня ответственности);

**Куда предоставляется:** АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО «БК-ИНВЕСТ-109»;

**Сроки предоставления:** ежемесячно к 15-ому числу месяца, следующего за отчетным месяцем;

**Порядковый номер отчета:** № 11

**Информация по проекту:** *«Строительство многоквартирного жилого дома №109 по ГП со в мкр. Береке в городе Костанай Костанайской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)*

**Общие сроки реализации проекта:**

**Начало строительно-монтажных работ** 04.03.2022 года

**Ввод объекта в эксплуатацию:** 09.03.2023 года

**Нормативный срок строительства:** 12 месяцев

### 1. Участники проекта:

Таблица 1

<u>№ п/п</u>	<u>Участники процесса</u>	<u>Наименование организаций</u>	<u>Основания деятельности организации</u>	<u>Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)</u>	<u>ФИО</u>	<u>Должность</u>	<u>Контактные данные (телефон электронная почта)</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
<u>1</u>	<u>Заказчик</u>	ТОО «БК-ИНВЕСТ-109»	Устав	Договор №ДПГ-22-10-048/107 от 04.03.2022г.	Ким О.Р.	Директор	8(701)513-33-90 <a href="mailto:bk-invest18@bk.ru">bk-invest18@bk.ru</a>
<u>2</u>	<u>Генеральный подрядчик</u>	ТОО «БК-СТРОЙ»	Гос. лицензия 1 категории (ГСЛ №180211006 от 22.11.2018г)	Договор №09-02/03343 от 06 декабря 2021 г.	Ким И.Р.	Директор	8(7142)28-64-42 <a href="mailto:bk_stroy@mail.ru">bk_stroy@mail.ru</a>
<u>3</u>	<u>Авторский надзор</u>	ТОО «БК-СТРОЙ»	Гос. лицензия 2 категории (ГСЛ №18010959 от 31.05.2018 г.)	Приказ 14-01-391 от 10 августа 2022 г.	Ким И.Р.	Директор	8(7142)28-64-42 <a href="mailto:bk_stroy@mail.ru">bk_stroy@mail.ru</a>
<u>4</u>	<u>Инжиниринговая компания</u>	ТОО «Технадзор Строй и К»	Свидетельство об аккредитации №KZ06VWC0055874 от 25.02.2022г. на право осуществления экспертных работ на объектах первого и второго уровня ответственности	ДИУ -22 -10-02 I /089 от 04 марта 2022 г. по оказанию инжиниринговых услуг	Шаимов И.Б.	Директор	8(701)318-20-50 <a href="mailto:tehnadzork211291@mail.ru">tehnadzork211291@mail.ru</a>
<u>5</u>	<u>Генеральный проектировщик</u>	ТОО «БК-СТРОЙ»	Государственная лицензия 2 категории ГСЛ № 18010959 от 31.05.2018 года	Приказ 01-01-01 от 06 декабря 2021г.	Ким И.Р.	Директор	8(7142)28-64-42 <a href="mailto:bk_stroy@mail.ru">bk_stroy@mail.ru</a>

## 2. Место расположения объекта строительства на карте города или план-схема расположения пятен застройки (ситуационная схема):

Площадка строительства объекта расположена в городе Костанай микрорайон Береке.



## 3. Краткое описание проекта (состав проекта):

Рабочим проектом предусмотрено строительство здания жилого дома № 109, который входит в состав жилого комплекса.

Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф1.3.

Класс жилья – IV.

Многоквартирный жилой дом - 9-ти этажный, четырех-секционный, с подвалом, прямоугольной формы в плане, с габаритными размерами в осях 26,55x123,98 м.

Высота жилого этажа в чистоте – 2,7 м. Высота подвала в чистоте – 2,76 м. Высота чердака в чистоте - 1,8 м.

Блок - секции разделены между собой на пожарные отсеки противопожарными стенами и сообщаются между собой в уровне подвала через двери, отвечающие требованиям противопожарной преграды.

За относительную отметку  $\pm 0.000$  принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа равная абсолютной отметке 173,60 м.

Подвал предназначен для прокладки инженерных сетей и размещения технических помещений. В помещении подвала предусмотрены продухи. Из каждой секции подвала организованы эвакуационные выходы непосредственно наружу через лестницу, обособленную от общей лестничной клетки.

Состав и площади основных, вспомогательных и бытовых помещений приняты в соответствии с СН РК 3.02-01-2018 «Здания жилые многоквартирные».

На 1-9 этажах размещены жилые квартиры.

Крыша - чердачная вентилируемая, с внутренним организованным водостоком.

Кровля – плоская совмещенная, из рулонных материалов. Водосток с кровли машинного отделения - наружный неорганизованный. Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки.

Внутренняя отделка принята в соответствии с заданием на проектирование. Стены, перегородки, потолок и полы в помещениях квартир выполнены в предчистовой отделке.

Стены, перегородки и потолок в помещениях общего пользования окрашены водоэмульсионными составами. Полы в помещениях общего пользования - покрытие керамогранитной плиткой.

Наружная отделка выполнена в соответствии с эскизным проектом, согласованным главным архитектором города. Стены облицованы керамическим лицевым кирпичом персикового цвета, ограждения лоджий – кирпич желтого цвета, лицевая поверхность стен входной группы – декоративная штукатурка; боковые стенки крылец с пандусом – плитка керамогранитная. Оконные блоки – с ПВХ профилями белого цвета. Цоколь – бетонная плитка «Рваный камень».

Двери наружные входные в секцию – стальные по ГОСТ 31173-2003; ПВХ по ГОСТ 30970-2014; двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6620-88. Двери в помещение электрощитовой, водомерно-теплового узла - противопожарные металлические с пределом огнестойкости EL30, по ГОСТ 31173-2003.

Оконные блоки и балконные двери – ПВХ профили по ГОСТ 30674-99, с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом.

Витражи - из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003, с заполнением стеклопакетом с энергосберегающим стеклом по ГОСТ 31364-2007.

Полы: керамогранит неполированный в местах общего пользования; в квартирах - бетонная подготовка под чистовое покрытие.

#### 4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту:

Таблица 2

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II (нормальный)
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота потолков в квартирах	метр	2,7
Этажность зданий	этаж	9
Площадь застройки здания	квадратный метр	2 435,79
Общая площадь здания	квадратный метр	19 437,12
Общая площадь квартир	квадратный метр	13 241,86
Общая площадь коммерческих помещений (при наличии)	квадратный метр	нет
Количество машиномест (при наличии)	штук	нет
Строительный объем	квадратный метр	76 015,06
Количество квартир в том числе:		207
однокомнатных		39
двухкомнатных	штук	96
трехкомнатных		72
четырёхкомнатных		-
Общая сметная стоимость строительства в текущем (прогнозом) уровне цен	миллион. тенге	2 548,284
В том числе:		
строительно-монтажные работы	миллион. тенге	2 084,774
оборудование	миллион. тенге	49,817
прочие	миллион. тенге	413,693

#### 5. Анализ исходно-разрешительной документации:

##### 1) Перечень имеющейся документации и согласований:

✓ Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Кокшетау от 30 июня 2021 года № 12-0193/21 по рабочему проекту: *«Строительство многоквартирного жилого дома №109 по ГП со в мкр. Береке в городе Костанай Костанайской области» (без сметной документации, наружных инженерных сетей и благоустройства)* в электронном варианте;

✓ Заключение экспертизы выдано ТОО «СНК-Проект» в городе Костанай от 10 ноября 2021 года № СНКП-0178/21 по рабочему проекту: *«Строительство многоквартирного жилого дома №109 по ГП со в мкр. Береке в городе Костанай Костанайской области» (без наружных инженерных сетей и благоустройства). Сметная документация.* в электронном варианте;

✓ Выписка из постановления акимата города Костанай Костанайской области от 16 октября 2019 года №2246 о предоставлении и продажи права временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) на земельном участке площадью 0,3433 га;

✓ Рабочая документация на электронном носителе, 1 экз.;

✓ Акты выполненных работ с начала строительства по март 2021г.;

✓ Талон (уведомление на разрешение строительства) №KZ46REA00263590 от 18.02.2022 г., №KZ40REA00290470 от 15.08.2022 г., №KZ39REA00295629 от 15.09.2022 г.,

##### 2) Перечень отсутствующей документации: замечаний нет

3) **Выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исходно – разрешительной документации в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:** по итогу проведенного анализа по предоставленной разрешительной документации со стороны Заказчика и Генерального подрядчика нарушений законодательства в сфере строительства не обнаружены. В связи с чем, рекомендации и риски к проекту строительства отсутствуют.

#### 6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации:

##### 1) Перечень предоставленной документации (при необходимости сопровождается ссылкой на

**Приложение со скан-версией необходимых документов):**

1.1.	Акты выполненных работ и оказанных услуг за период с начала строительства по 31.01.2023г.
1.2.	Журнал технического надзора для ознакомления

1.3.	Журнал авторского для ознакомления
1.4.	Журнал ОТиТБ для ознакомления
1.5.	Журнал производства работ для ознакомления
1.6.	Журнал входного контроля материалов для ознакомления
1.7.	Журнал бетонных работ для ознакомления
1.8.	Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
1.9.	Журнал монтажа строительных конструкций
1.10	Журнал сварочных работ
1.11	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
1.12	Акты скрытых работ

2) **Перечень отсутствующих необходимых документов, выводы Исполнителя с указанием рисков и рекомендаций относительно приведения исполнительской и приемо-сдаточной документации в соответствие требованиям действующего законодательства Республики Казахстан:** нет

#### 7. Анализ проектной документации:

1) **Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроков выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета:**

1.1. Заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в городе Кокшетау от 30 июня 2021 года № 12-0193/21;

1.2. Заключение экспертизы выдано ТОО «СНК-Проект» в городе Костанай от 10 ноября 2021 года № СНКП-0178/2.

2) **Информация о принятых изменениях проектных решений, информация о выявленных несоответствиях нормативной базе Республике Казахстан, выводы с рекомендациями Исполнителя и указанием рисков:** по состоянию на 31.01.2023 не выявлено

#### 8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период: — работы ведутся по устройству кирпичных стен, монтаж плит перекрытий, заполнения проемов, внутренние отделочные работы, монтаж систем отопления, электроснабжения.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

Таблица 3

Разделы проекта	План на месяц*, %	Факт**, %	Отклонение (+/-), %
<b>ВСЕГО по объекту, в том числе:</b>	<b>11,87%</b>	<b>11,87%</b>	<b>0%</b>
Конструктивные решения	0,00%	0,00%	0,00%
Архитектурные решения	8,22%	8,22%	6,40%
Лифты	0,00%	0,00%	-1,20%
Водопровод и канализация	2,47%	2,47%	-0,62%
Отопление и вентиляция	0,00%	0,00%	0,78%
Газоснабжение	0,00%	0,00%	-0,31%
Электрические	1,18%	1,18%	0,07%
Слаботочные сети	0,00%	0,00%	-0,26%

*Примечание: факт отражает освоенные, т.е. документально закрытые объемы работ и может расходиться с фактически выполненными работами;*

*\*с нарастающим итогом план составил – 100,00%, освоение по принятым объемам работ составляет – 92,27%, (отклонение – -7,73%).*

*\*\*с нарастающим итогом СМР + прочие: план составил – 100,00%, фактическое освоение составило – 77,19% (отклонение – -22,81%).*

3) Графическое и процентное изображение графика производства работ и вертикальный график фактически выполненных работ, с разделением на основные разделы проекта со ссылками на информацию по текущему состоянию, согласно приложению 1 к настоящему отчету.

4) Соблюдение графика производства работ.

Анализ хода выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ  
Отставание/опережение по объекту:

Таблица 4

Наименование работ согласно ПСД и ППЗ	Отставание, опережение	причины
КЖ (земляные+фундамент)	-1	Увеличить темпы производства работ
Архитектурно-строительные решения (АР)	-10	
Лифты	-8	
Водопровод канализация	-0,4	
Отопление вентиляция	-0,6	
Газоснабжение	-2	
Электромонтажные работы	-1	
Слаботочные сети	-2	
<b>Всего по проекту за отчетный м-ц</b>	<b>-1</b>	<b>опережение</b>
<b>Всего отставание с начала ст-ва</b>	<b>-26</b>	<b>отставание</b>

**9. Мероприятия по контролю качества:**

- 1) **Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период:** В отчетный период серьезные недостатки и дефектов в СМР не выявлено. На постоянной основе проводится мероприятия по контролю качества работ по кирпичной кладке стен, внутренней отделке (включая виды: входной, операционный и приемочный).
- 2) **Свод данных по состоянию за отчетный период по выявленным нарушениям по разделам: документация и организационные вопросы, техника безопасности, качество строительно-монтажных работ (включая разделы: архитектурно-строительный, отопление и вентиляция, водопровод и канализация, электрические и слаботочные сети, газоснабжение (при его наличии)):**

Таблица 5

№ п/п	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период		Итого не устранено на текущую дату
				Выявлено	Устранено	
1.	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2.	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3.	По качеству СМР, в том числе:					
3.1.	Архитектурно-строительный раздел	1	1	0	0	0
3.2.	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.3.	Водопровод и канализация	0	0	0	0	0
3.4.	Электрические и слаботочные сети	0	0	0	0	0
3.5.	Газоснабжение (при его наличии)	0	0	0	0	0
3.6.	Благоустройство	0	0	0	0	0
3.7.	Внутриплощадочные сети	0	0	0	0	0
<b>Всего</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций: 1. В ходе операционного контроля работ выявлено, что при устройстве внутренних перегородок санузлов местами смонтированы листы ГСП тип А, вместо проектного типа Н2, согласно ведомости отделки помещений альбома АР. Замечание устранено. Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета – нет.

## **10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта**

**Перечень и описание проблем и ситуаций, возникающих по ходу реализации проекта и ведущих к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения Объекта, а также предложения по устранению этих проблем (при наличии):** Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется.

**Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период):** замечаний нет

### **11. Сведения об изменениях на Объекте**

**Перечень измененных технических решений в рабочей документации с приложением копий обосновывающих материалов:** изменений нет

**Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов:** нет

**Сведения об изменениях графиков производства работ:** нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№п/п	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка проектно-сметной документации	60 552 341	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Прохождение экспертизы	2 794 822	0	0		-	0	0	0	0
3	Строительно-монтажные работы и оборудование:	2 390 741 926	0	0		1797619 400,00	283843 823,00	2205832 796,00	1 797 619 400	2 205 832 796
4	<i>в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона Республики Казахстан от 7 апреля 2016 года "О долевом участии в жилищном строительстве" изм. от 09.06.2020г. №341-VI</i>	239 074 193	0	0		-	-	-	-	-
5	Авторский надзор	24 146 493	0	0		1 351 117	438 434,67	3383 655,67	1 351 117	3 383 656
6	Технический надзор и управление проектом	70 048 738	0	0		22 565 565	6233 128,11	48439 448,26	22 565 565	48 439 448
7	Всего по проекту (смета)	2 548 284 320	0	0		1821536 082,00	290515 385,78	2257655 899,93	1 821 536 082	2 257 655 900
8	Иные расходы	254 828 432	0	0	126 505,48	52356 196,28	126 505,48	52356 196,28	52 356 196	52 356 196
9	Всего по проекту (смета) и иные расходы	2 803 112 752	0	0	126 505,48	1873892 278,28	290641 891,26	2310012 096,21	1 873 892 278	2 310 012 096

Вывод: за отчетный период инжиниринговой компанией не было выявлено фактов нецелевого использования денежных средств.



Таблица 7

Информация по источникам финансирования объекта			
№ п/п	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	-	383 795 965,79
1.1	Банк		
1.2	Застройщик	-	382 220 965,79
1.3	Прочие*	-	1 575 000,00
2	Дольщики	294 352 963,00	3 552 316 881,00
	<b>Всего:</b>	<b>294 352 963,00</b>	<b>3 936 112 846,79</b>
Вывод: В отчетном периоде произведено зачисления денежных средств УК в размере 311418194 * прочие источники финансирования включают в себя вознаграждение банка и гарантийный взнос			

Примечание: Кол-во квартир – 185, S= 11 401,78 м2, ДДУ = 4 162 542 209,00 тенге.

#### Анализ договоров

Таблица 8

№ п/п	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	2 390 741 926	2 390 741 926	-
2	Договора поставки материалов, договора аренды техники*	-	-	-
3	Договор оказание услуг авторского надзора	3 692 820	24 146 493	20 453 673
4	Договор оказание услуг технического надзора и управление проектом	52 500 000	70 048 738	17 548 738

Примечание: Дополнительное соглашение №2 от 16 мая 2022 к договору подряда №09-02/03343 от 06.12.2021

\* при наличии специальной экономической зоны

#### Анализ плана финансирования

Таблица 9

№ п/п	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 548 284 320	-	-	-	2 548 284 320	1 821 536 082	-726 748 238

### 13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительными работами утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству)

- качество СМР удовлетворительное;
- изменений в проектной документации с момента получения гарантии нет;
- основной источник финансирования включает в себя поступления от дольщиков;
- общее отставание с начала строительства составляет 26 дней;
- рекомендации от инжиниринговой компании: усилить контроль со стороны ИТР, увеличить количество работников, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Состав инжиниринговой компании:

Руководитель организации: И. Шаймов Шаймов И.Б.  
(подпись, место печати если предусмотрено)



Состав группы (согласна приказа):

Шаимов Ильяс Баянович – эксперт технического надзора И. Шаимов подпись

Ткаченко Сергей Павлович – эксперт технического надзора С. Ткаченко  
подпись

Акбужуров Болатбек Жумабекович – эксперт технического надзора Б. Акбужуров  
подпись

Симачков Алексей Николаевич – эксперт технического надзора А. Симачков  
подпись

Токарева Инна Вадимовна – специалист для осуществления контроля за целевым использованием денег И. Токарева подпись

Дата составления отчета « 13 » февраль 20 23 г.;

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

(Приложение №1)

Приложение 1

К отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого дома (жилого здания)

Вертикальный график фактически выполненных работ по строительству ж.д. №109 мкрп. «Береке» в городе Костанай.

Графическое и процентное изображение графика производства работ с разделением на основные разделы проекта

по состоянию на 31.01.2023г.

Этаж	СМР фундаменты		СМР Стены подвала		СМР Перекрытие подвала		СМР стены		СМР перекрытия		СМР полы		СМР кровля		СМР перегородки		СМР Внутренняя отделка		СМР вентшахты		СМР Вход группа		Водопровод канализация		Отопление и вентиляция		Газоснабжение		ЭОМ Силовое электрооборудование		ЭОМ Слаботочные устройства		Лифты			
	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак	ГПР	Фак				
ДАТА	31.01.2023																																			
Тех этаж																																				
9																																				
8																																				
7																																				
6																																				
5																																				
4																																				
3																																				
2																																				
1																																				
Ниже отм.0,000																																				
Земляные работы																																				
Отставание	Информация касательно отставания		Действия инжиниринговой компании				Меры, принятые инжиниринговой компании для устранения отставания				Рекомендации				Рекомендации инжиниринговой компании для устранения отставания				План мероприятий				Меры, предприняты Генподрядчи ком		Риски		Возможные невыполнения в целом или отдельных видов работ									


План по графику производства работ  
 Выполнено фактически  
 Работы по которым имеются отставания



Приложение 1  
 К отчету инжиниринговой компании в сфере  
 долевого участия в жилищном строительстве о  
 результатах мониторинга за ходом строительства  
 жилого дома (жилого здания)

**Графическое и процентное изображение графика производства работ**

Наименование	фев.22	мар.22	апр.22	май.22	июн.22	июл.22	авг.22	сен.22	окт.22	ноя.22	дек.22	янв.23
<b>План</b>	3,15%	6,08%	9,01%	17,40%	30,10%	42,79%	56,63%	70,48%	87,47%	94,39%	100,00%	100,00%
<b>Факт</b>	0,00%	0,00%	9,81%	13,26%	22,19%	32,41%	44,71%	51,91%	59,53%	69,93%	80,39%	92,27%

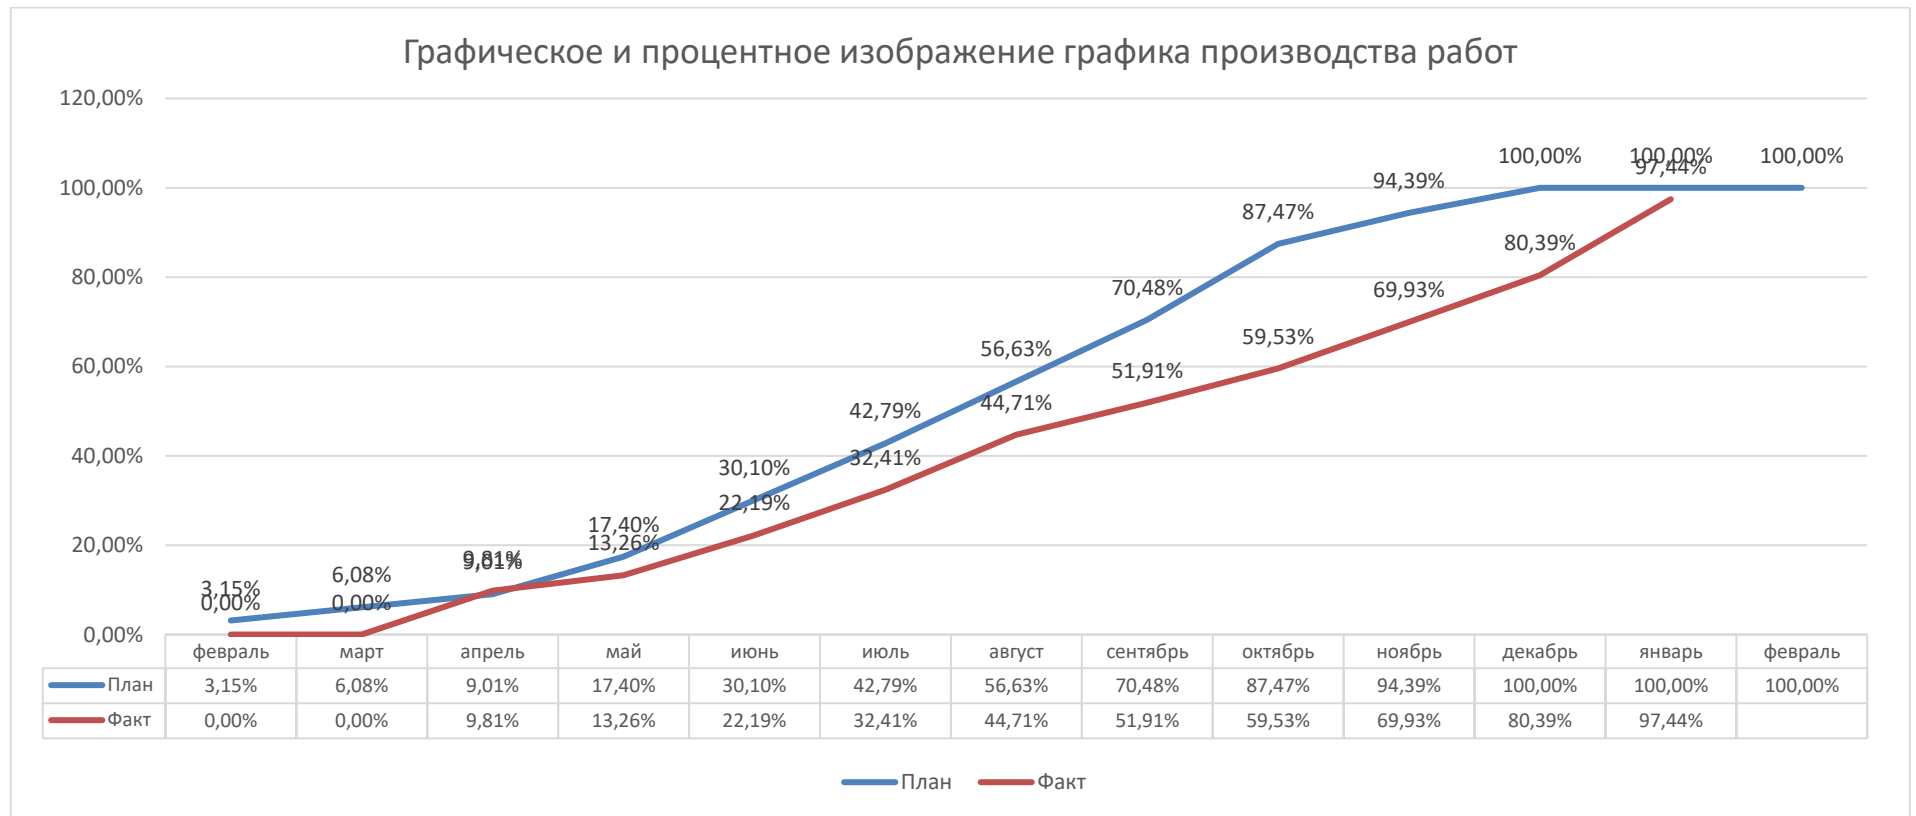

Примечание : в данном графике отобрано плановое и фактическое выполнение только строительно-монтажных работ.

**Фото Объекта:**













