



Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого дома (жилого здания)

ЖК V-Club

Код: № ДПГ-23-16-068/155

Отчетный период: 202312

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.12.2023 года по 31.12.2023 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "Алатау сапа құрылыс", БИН 050140003046

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "УК Шанырак Строй"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: № ДПГ-23-16-068/155/202312

Информация по проекту: ЖК V-Club

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2023-09-10 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2024-09-21 года

Нормативный срок строительства: 9 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: 06-0049/23 от 2023-02-21 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	230340036850 - ТОО "УК Шанырак Строй"		ДПГ-23-16-068/155, от 11.10.2023 года	Хамзина Л.Н	Директор	null, null
2	Подрядчик	171240023488 - ТОО "Biryuza Construction"		1, от 29.05.2023 года	Султанов А.М	Директор	null, null
3	Авторский надзор	130740019150 - ТОО "Корсар Инжиниринг"		КИ-1-23/АВТ, от года	Садвокасов А.А	Директор	null, null
4	Инжиниринговая компания	050140003046 - ТОО "Алатау сапа құрылыс"		ДИУ-23-16-024/036, от 03.10.2023 года	Омаров С.С	Директор	null, null
5	Генеральный проектировщик	null - null		null, от года			null, null

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)

Место реализации строительства: Республика Казахстан, г. Усть - Каменогорск, пр. Сатпаева, позиция 77, 78.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Архитектурно-планировочное задание № KZ82VUF00730371 от 24 августа 2022 года ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» на проектирование объекта;

земельно-кадастровый план № 087458 от 23 ноября 2020 года на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 0,7883 га (кадастровый номер 05-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу ВКО, город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берег (2-я очередь) (позиции 77, 88);

договор аренды земельного участка № 358 от 08 апреля 2022 года между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» и ТОО «Элит Construction» о предоставлении во временное возмездное пользование сроком на три года земельного участка площадью 0,7883 га (кадастровый номер 0,5-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берега (2-я очередь), позиции 77, 78;

постановление № 2095 от 14 июня 2022 года акимата города Усть-Каменогорска об изменении целевого назначения земельного участка в жилом районе Левого берега (2-я очередь) (позиция 77, 78) для проектирования, строительства и размещения многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями;

справка № 10100636601495 от 11 января 2023 года портала электронного правительства о перерегистрации юридического лица (БИН 040440036894) с переименованием ТОО «Элит Construction» в ТОО «Biryuza Construction»;

Месторасположение: Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, жилой район Левого берега.

Сейсмичность района: 7 баллов

Сейсмичность площадки: 7 баллов

Технические условия:

№ 387 от 20 июня 2022 года ГКП «Оскемен Водоканал» на водоснабжение и канализацию;

№ 152 от 31 января 2023 года ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» на подключение ливневой канализации;

№ 07-01-02-10/00134 от 11 июля 2022 года АО «УК ТС» на теплоснабжение №1497/846 от 12 августа 2022 года ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» на подключение электроснабжения;

№ 183 от 11 августа 2022 года СП «OST-проект» на подключение электроснабжения;

№ 4-1/57-22/Л от 21 июня 2022 года ВК ДЭСД объединения «Дивизион «Сеть» филиала АО «Казтелеком» на прокладку оптического кабеля.

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям

и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1
Этажность зданий	этаж	9
Класс комфортности жилого здания	-	4
Уровень ответственности здания	-	2
Степень огнестойкости здания	-	
Высота жилых этажей	метр	
Площадь застройки здания	квадратный метр	4001,36
Общая площадь здания	квадратный метр	6888.13
Общая площадь квартир	квадратный метр	5523.29
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	
Строительный объем здания	кубический метр	29488.0
Количество квартир	шт.	63
в том числе: однокомнатные	шт.	11
в том числе: двухкомнатные	шт.	17
в том числе: трехкомнатные	шт.	26
в том числе: четырехкомнатные	шт.	9
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	1802,299
в том числе: СМР	миллион тенге	21511,390
в том числе: оборудование	миллион тенге	30,762
в том числе: прочие	миллион тенге	250,147
Продолжительность строительства	месяц	13

5. Анализ исходно–разрешительной документации

задание на проектирование объекта от 15 марта 2022 года, утвержденное заказчиком; письмо № 24 от 25 ноября.2022 года заказчика о строительстве за счет собственных средств;

письмо № 13 от 31 января 2023 года заказчика о начале строительства – март 2023 года; архитектурно-планировочное задание № KZ82VUF00730371 от 24 августа 2022 года ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города УстьКаменогорска» на проектирование объекта;

земельно-кадастровый план № 087458 от 23 ноября 2020 года на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 0,7883 га (кадастровый номер 05-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу ВКО, город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берег (2-я очередь) (позиции 77, 88);

договор аренды земельного участка № 358 от 08 апреля 2022 года между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» и ТОО «Элит Construction» о предоставлении во временное возмездное пользование сроком на три года земельного участка площадью 0,7883 га (кадастровый номер 0,5-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берега (2-я очередь), позиции 77, 78;

постановление № 2095 от 14 июня 2022 года акимата города Усть-Каменогорска об изменении целевого назначения земельного участка в жилом районе Левого берега (2-я очередь) (позиция 77, 78) для проектирования, строительства и размещения многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями;

справка № 10100636601495 от 11 января 2023 года портала электронного правительства о перерегистрации юридического лица (БИН 040440036894) с переименованием ТОО «Элит Construction» в ТОО «Biryuza Construction»;

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

На водоснабжение и канализацию № 387 от 20 июня 2022 года ГКП «Оскемен Водоканал»;
На подключение ливневой канализации № 152 от 31 января 2023 года ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»;
На теплоснабжение № 07-01-02-10/00134 от 11 июля 2022 года АО «УК ТС»
На подключение электроснабжения №1497/846 от 12 августа 2022 года ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»;
На подключение электроснабжения № 183 от 11 августа 2022 года СП «OST-проект»;
На прокладку оптического кабеля № 4-1/57-22/Л от 21 июня 2022 года ВК ДЭСД объединения «Дивизион «Сеть» филиала АО «Казтелеком» .

7. Анализ проектной документации

задание на проектирование объекта от 15 марта 2022 года, утвержденное заказчиком; письмо № 24 от 25 ноября.2022 года заказчика о строительстве за счет собственных средств;

письмо № 13 от 31 января 2023 года заказчика о начале строительства – март 2023 года; архитектурно-планировочное задание № KZ82VUF00730371 от 24 августа 2022 года ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» на проектирование объекта;

земельно-кадастровый план № 087458 от 23 ноября 2020 года на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок площадью 0,7883 га (кадастровый номер 05-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу ВКО, город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берег (2-я очередь) (позиции 77, 88);

договор аренды земельного участка № 358 от 08 апреля 2022 года между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска» и ТОО «Элит Construction» о предоставлении во временное возмездное пользование сроком на три года земельного участка площадью 0,7883 га (кадастровый номер 0,5-085-091-1400) для проектирования, строительства и размещения многоэтажных жилых домов по адресу город Усть-Каменогорск, в жилом районе Левого берега (2-я очередь), позиции 77, 78;

постановление № 2095 от 14 июня 2022 года акимата города Усть-Каменогорска об изменении целевого назначения земельного участка в жилом районе Левого берега (2-я очередь) (позиция 77, 78) для проектирования, строительства и размещения многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и коммерческими помещениями;

справка № 10100636601495 от 11 января 2023 года портала электронного правительства о регистрации юридического лица (БИН 040440036894) с переименованием ТОО «Элит Construction» в ТОО «Biryuza Construction»;

протокол дозиметрического контроля № 6п от 28 октября 2022 года, выданный филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК;

протокол измерений плотности радона № 6п от 28 октября 2022 года, выданный филиалом РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК;

письмо № 1315 от 12 июля 2022 года заказчика с подтверждением гарантийного напора в водопроводной сети 10 м;

письмо №05-03/5567 от 31 октября 2022 года РГУ «Усть-Каменогорское ГУ СЭК Департамента СЭК МЗ РК» об отсутствии на участке почвенных очагов сибирской язвы;

письмо № 17 от 25 ноября 2022 года заказчика об отсутствии прайс-листов;

письмо № 10 от 31 января 2023 года заказчика о делении по блокам;

письмо № 11 от 31 января 2023 года заказчика о делении по пусковым комплексам;

письмо № 3Т-М-189 ГУ «отдел ЖКХ, Пт и АД» об отсутствии на участке зеленых насаждений;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ТОО «Ульба-Геология» в 2022 г. (государственная лицензия № 18014253 от 24 июля 2018 года);
топографическая съемка, выполненная ТОО «Ульба-Геология» в 2022 году.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	6.14	0.00	-6.14	35.80	21.28	-14.51
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Фасадное освещение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Земляные работы	0.00	0.00	0.00	0.18	0.14	-0.04
11	Всего (только СМР)	6.14	0.00	-6.14	35.98	21.83	-14.15
12	Прочее	0.12	0.02	-0.10	0.88	0.67	-0.21
13	Всего (СМР + Прочее)	6.11	0.02	-6.09	35.96	21.95	-14.01

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3	4
Конструкции железобетонные	-31	-33	
Архитектурно-строительные решения (АР)	0	1	
Отопление вентиляция	0	0	
Водопровод канализация	0	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	0	
Лифты	0	0	
Паркинг	0	0	
Благоустройство	0	0	
Фасадное освещение	0	0	
Земляные работы	0	0	
Прочее	0	0	
Итого	-31	-32	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений в последствии, риски неисполнения рекомендаций

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Основная проблема это отставание от графика СМР

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменения отсутствуют

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	6 435 703.68	6 435 703.68	6 435 703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6 435 703.68	6 435 703.68
2	Экспертиза	1 205 854.00	1 205 854.00	1 205 854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 205 854.00	1 205 854.00
3	СМР и оборудование	1 757 710 552.43	308 154 398.18	308 154 398.18	-2 250 000.00	66 920 000.00	0.00	75 534 094.00	375 074 398.18	383 688 492.18
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	175 771 055.24			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Авторский надзор	12 128 202.81			0.00	1 400 000.00	350 000.00	1 750 000.00	1 400 000.00	1 750 000.00
5	Технический надзор	24 818 230.08	1 600 000.00	1 600 000.00	0.00	0.00	0.00	1 009 960.13	1 600 000.00	2 609 960.13
	Всего СМР	1 802 298 543.00	317 395 955.86	317 395 955.86	-2 250 000.00	68 320 000.00	350 000.00	78 294 054.13	385 715 955.86	395 690 009.99
6	Иное	180 229 854.30			171 586.58	1 431 538.58	171 586.58	1 431 538.58	1 431 538.58	1 431 538.58
	Всего СМР и Иное	1 982 528 397.30	317 395 955.86	317 395 955.86	-2 078 413.42	69 751 538.58	521 586.58	79 725 592.71	387 147 494.44	397 121 548.57

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	-2 316 250.00	2 859 715.73
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	-2 316 250.00	2 859 715.73
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	0.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	0.00	66 898 400.00
	ВСЕГО	-2 316 250.00	69 758 115.73

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	3	192.35	66 898 400.00	66 898 400.00
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	3	192.35	66 898 400.00	66 898 400.00

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	1 757 710 552.43	1 757 710 552.43	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	10 000 000.00	12 128 202.81	2 128 202.81
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	19 381 895.57	24 818 230.08	5 436 334.51
	в т.ч. ДИУ			0.00
	НОК			0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 802 298 543.00	96 966 110.99	-2 250 000.00	-99 216 110.99	784 620 546.95	385 715 955.86	-398 904 591.09

13. Заключение

Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: За отчетный период при проведении мониторинга экспертами технического надзора все работы велись в рамках действующего законодательства и договорных отношений. По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах сметной стоимости утвержденной заключением государственной экспертизы. Все договора на оказание услуг и генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации. По объемам строительно-монтажных работ - все объемы подтверждены экспертами технического надзора, соответствует рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. По срокам производства работ: в отчетном месяце строительно-монтажные работы выполнялись с отставанием от графика производства работ. По качеству выполняемых работ – за данный период отсутствуют. На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества производимых строительно-монтажных работ.

Рекомендации от инжиниринговой компании: ускорить темпы строительства, выполнять все работы согласно графику производства работ, усилить контроль со стороны ИТР и контроль по качеству выполняемых работ, увеличить количество рабочих на объекте.

За отчетный период инжиниринговой компанией не было выявлено фактов нецелевого использования денежных средств. Изменения в проектно-сметную документацию в отчетном периоде не вносились


1. Участники проекта

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	811015401335 - БАЙТУРСЫНОВА АСЕМ НУРДАНОВНА		NEW	
2	TECHNICAL_SUPERVISION	900524300651 - ЗАИТОВ ШЫҢҒЫС ӘЛЕМИСҰЛЫ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	920628300155 - САГИНБАЕВ НУРБОЛ САМАТОВИЧ		NEW	
4	HEAD	450425300083 - ОМАРОВ САҒАТБЕК СЫДЫКОВИЧ		NEW	




Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта


ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

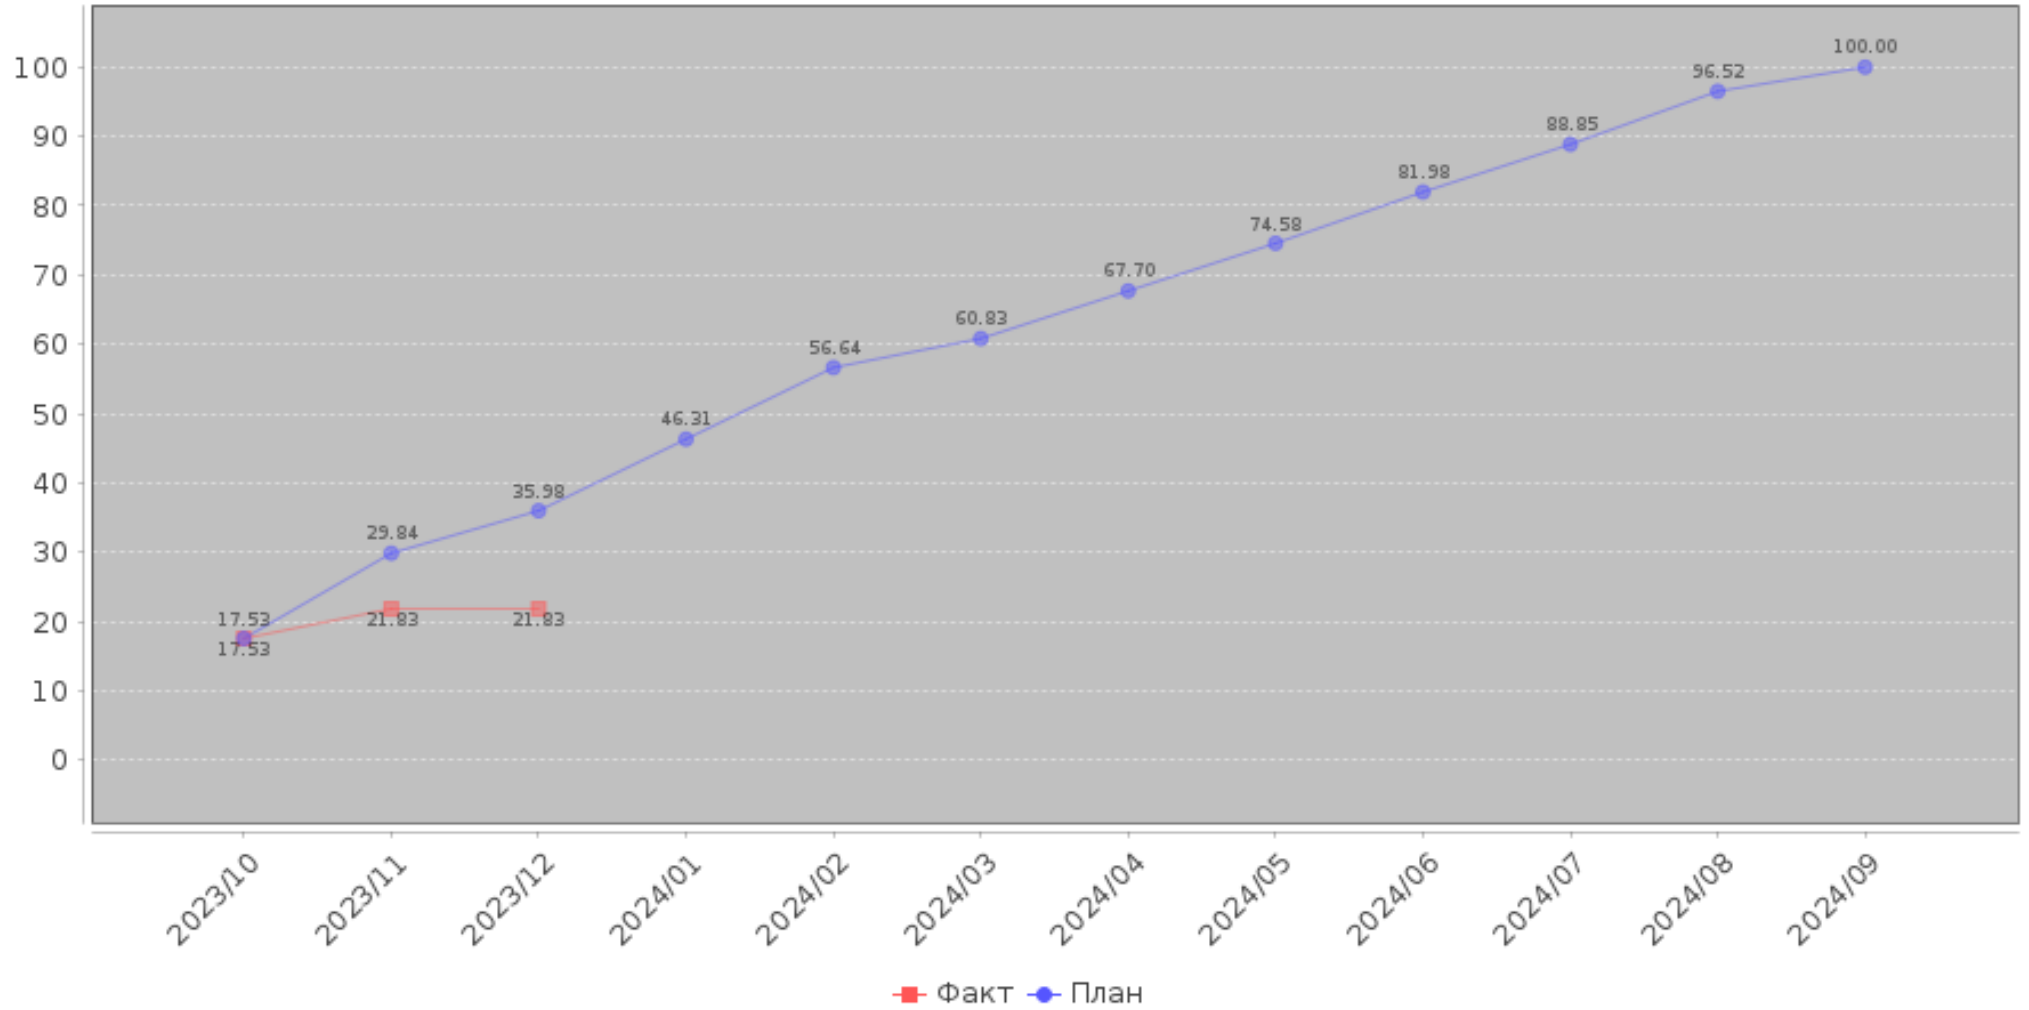

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

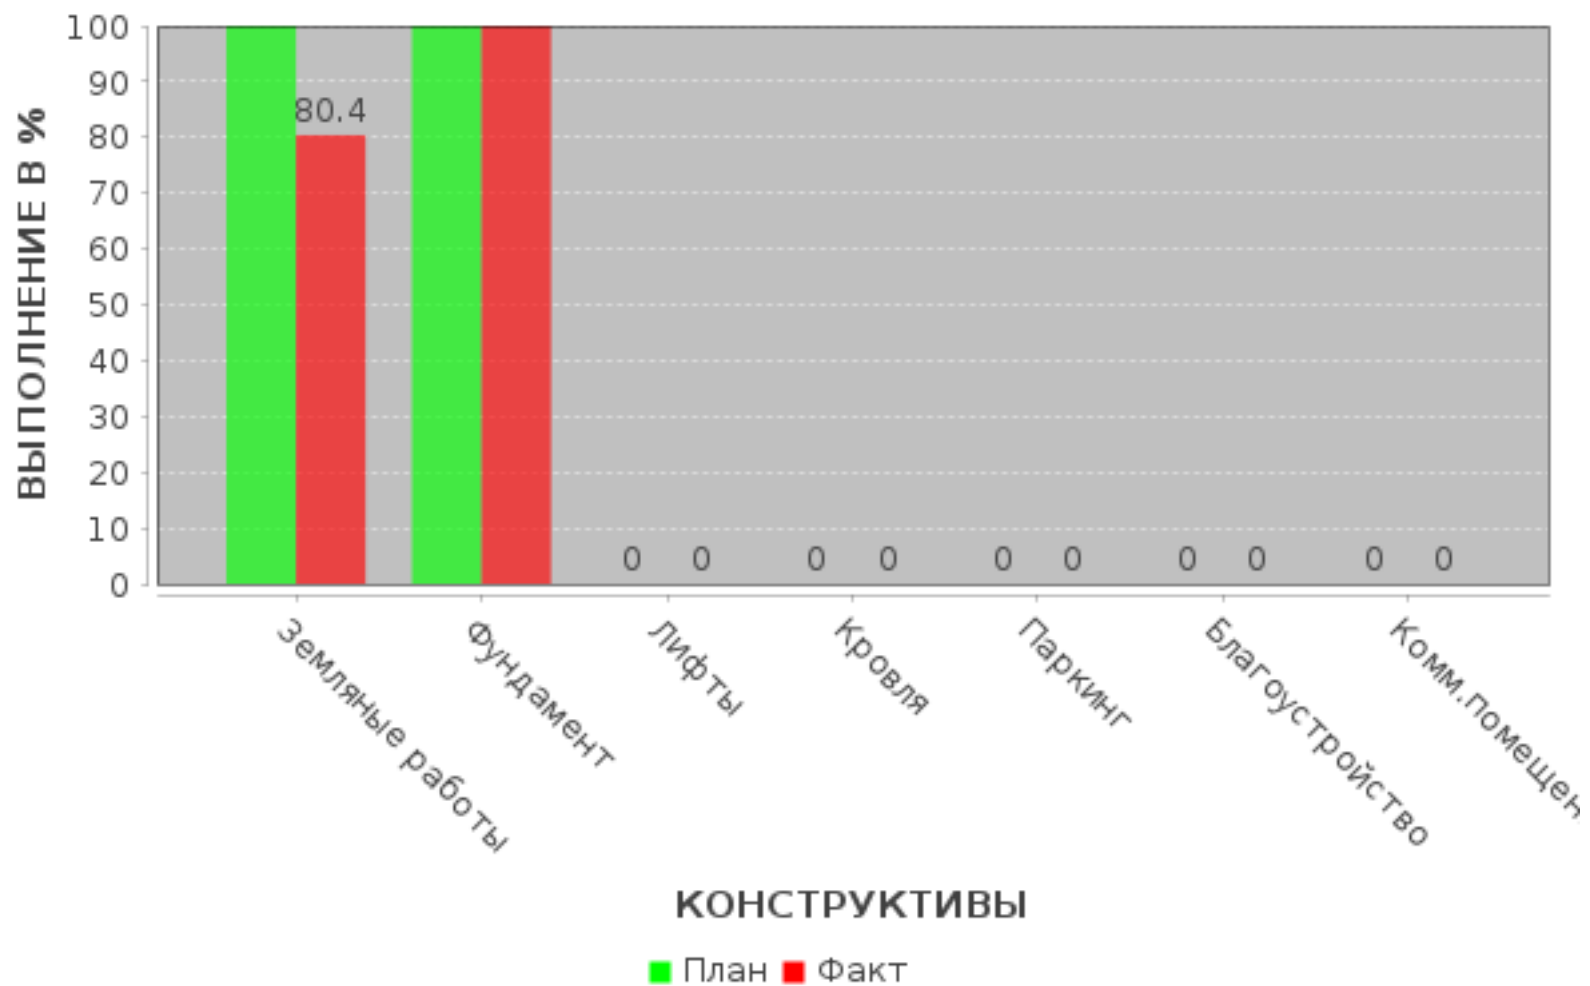

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

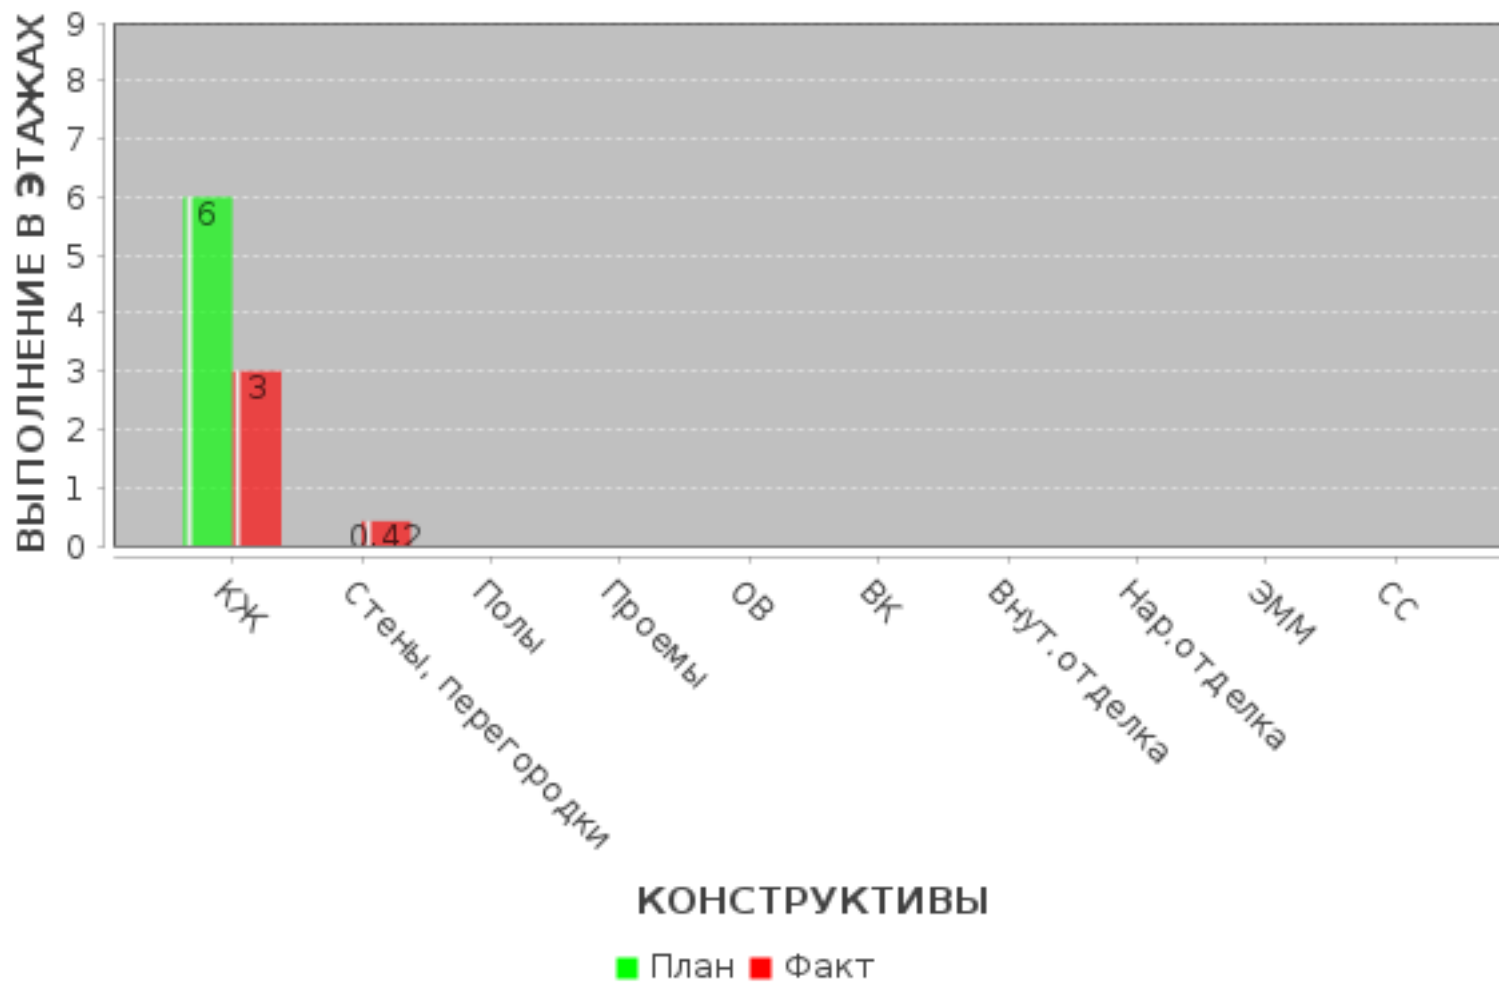

Фотофиксация за отчетный период









Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	14.01.2024 16:48	БАЙТУРСЫНОВА АСЕМ НУРДАНОВНА	Отправка отчета
2	14.01.2024 16:49	БАЙТУРСЫНОВА АСЕМ НУРДАНОВНА	Отчет подписан
3	15.01.2024 03:23	ОМАРОВ САГАТБЕК СЫДЫКОВИЧ	Отчет подписан
4	15.01.2024 10:59	САГИНБАЕВ НУРБОЛ САМАТОВИЧ	Отчет подписан
5	15.01.2024 11:32	ЗАИТОВ ШЫҢҒЫС ӘЛЕМИСҰЛЫ	Отчет подписан
6	16.01.2024 04:17	АРМИС ДАРХАН null	Отчет согласован
7	17.01.2024 06:15	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА	Отчет согласован
8	17.01.2024 06:15	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА МАТВЕЕВНА	Отчет согласован
9	17.01.2024 10:53	КАБЫЛДИН АДІЛЬЖАН АСАТОВИЧ	Отчет согласован
