



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

ЖК "Sezim Qala" 13 оч.

Код: null

Отчетный период: 202411

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.11.2024 года по 30.11.2024 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "Engineering Services" , БИН 130440013597

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», Гимарат НС

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: null/202411

Информация по проекту: ЖК "Sezim Qala" 13 оч.

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2023-05-31 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2024-11-24 года

Нормативный срок строительства: 21 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: 01-0022/23 от 2023-01-20 года

1. Участники проекта

| # | Участники процесса | Наименование организаций | Основания деятельности организации | Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата) | ФИО | Должность | Контактные данные (телефон электронная почта) |
|---|------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Заказчик | 130740010573 - Fимарат HC | | GMT/Под/Sez/14351, от 20.02.2023 года | Б.Ж. | директор | null, zhuman_b@bi.group |
| 2 | Подрядчик | 100640016266 - ТОО СтройИнжСервис | | GMT/Под/Sez/14351, от 20.02.2023 года | Белобров И.В. | директор | null, belobrov_i@u-nrg.kz |
| 3 | Авторский надзор | 090140006800 - ТОО TAIMAS PARTNERS | | GMT/Оку/Sez/14233, от 21.02.2023 года | Акмурзинов С.С. | директор | null, taimas_partners@mail.ru |
| 4 | Инженеринговая компания | 130440013597 - ТОО "Engineering Services" | | №ДИУ-21-01-007/015 , от 30.05.2023 года | Бикбаев К.Н. | директор | null, abdumanap_a@eng- services.kz |
| 5 | Генеральный проектировщик | 090140006800 - ТОО TAIMAS PARTNERS | | б/н, от 20.01.2023 года | Акмурзинов С.С. | директор | null, taimas_partners@mail.ru |

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г. Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, участок №55/5. Проектируемым жилым комплексом предусмотрено 2 жилых секции С-1, С-2. Горизонтальная взаимосвязь квартир осуществляется через поэтажные общие коридоры, а вертикальная поэтажная взаимосвязь - через лестничную клетку типа Н1 и лифты. Проектом, согласно требованиям, предусмотрено 4 лифта грузоподъемностью: 630кг и 1150кг. Лифты - Lincoln elevator, без машинного помещения.

В каждой квартире предусмотрены лоджии. Санитарные узлы запроектированы совмещенными в 1-2х комнатных квартирах и раздельными в 3х комнатных квартирах. Объемно-планировочное решение квартир обеспечивает условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для иной деятельности в быту.

Секция С-1 (20 этажный жилой блок).

Секция 1 имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2x24м.

Этажность - 20 надземных этажа, из них 20 жилых и 1 подземный этаж.коридор, ИТП, Насосная, Электрощитовая.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3м включает в себя жилые квартиры, помещение сервиса (без пребывания людей), венткамера, ПУИ, вестибюль.

Со 2го по 20ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей этаж от пола до потолка принята 2,7м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной

фурнитуры заводского изготовления.

Здание имеет 7 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через

лестницу, основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет основной вход на отметке 0.000.

На 1ом этаже расположены 5 квартир, 2-20 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 7 квартир.

Секция С-2 (20 этажный жилой блок).

Секция 2, имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях 25,2x24м.

Этажность - 20 надземных этажа, из них 20 жилых и 1 подземный этаж.

Подвальный этаж высотою от пола до потолка 2,35м включают в себя технический коридор, ИТП, Насосная, Электрощитовая.

Первый этаж высотою от пола до потолка 3м включает в себя жилые квартиры, помещение сервиса (без пребывания людей), венткамера, ПУИ, вестибюль.

Со 2го по 20ый этажи расположены жилые квартиры. Высота жилых этажей этаж от пола до потолка принята 2,7м.

Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки.

Так же в проекте предусмотрены мероприятия, исключающие возможность передачи шума и вибрации, для защиты смежных помещений, включающие в себя: устройство "плавающего пола", звукоизоляцию стен, применение в инженерном оборудовании шумо-виброизоляционной

фурнитуры заводского изготовления.

Здание имеет 7 выхода. Основной вход в здание предусмотрен с отм.0.000, с уличной стороны. С данного этажа имеется возможность подняться как посредством лифтов, так и через

лестницу, основной лестничной клетки типа Н1 которая имеет основной вход на отметке 0.000.

На 1ом этаже расположены 5 квартир, 2-20 этажи имеют схожую планировку, на каждом этаже предусмотрено по 7 квартир.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

| Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Количество жилых домов | шт. | 2 |
| Этажность зданий | этаж | 20 |
| Класс комфортности жилого здания | - | IV |
| Уровень ответственности здания | - | II |
| Степень огнестойкости здания | - | II |
| Высота жилых этажей | метр | 2.7, 3.00 |
| Площадь застройки здания | квадратный метр | 1382 |
| Общая площадь здания | квадратный метр | 20565,12 |
| Общая площадь квартир | квадратный метр | 16685,20 |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | квадратный метр | |
| Строительный объем здания | кубический метр | 82481,52 |
| Количество квартир | шт. | 278 |
| в том числе: однокомнатные | шт. | 80 |
| в том числе: двухкомнатные | шт. | 120 |
| в том числе: трехкомнатные | шт. | 78 |
| в том числе: четырехкомнатные | шт. | |
| в том числе: пятикомнатные | шт. | |
| Количество машино-мест | шт. | |
| Общая сметная стоимость строительства | миллион тенге | 6219,694 |
| в том числе: СМР | миллион тенге | 5006,280 |
| в том числе: оборудование | миллион тенге | 241,261 |
| в том числе: прочие | миллион тенге | 972,153 |
| Продолжительность строительства | месяц | 21 |

5. Анализ исходно–разрешительной документации

- 1.1 Задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 01 июня 2021 года.
- 1.2 Архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование объекта: «Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, участок №55/5 (Sezim Qala 13 -очередь) и Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, уч. №55/5» (ЖКК «Sezim Qala» 13 очередь строительства). Наружные инженерные сети со сметной документацией» от 08 ноября 2021 года № 443;
- 1.3 Акт на право частной собственности на земельный участок кадастровый номер 21-320-135-4200 площадью 0,6658 га АН № 0347079 от 11 марта 2020 года № 03-01-29-11/211;
- 1.4 архитектурно-планировочное задание, утвержденное ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны от 08 ноября 2021 года № KZ21VUA00550661;
- 1.5 Технические условия:
 - ГКП «Астана Су Арнасы» от 31 декабря 2021 года № 3-6/2659 на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию;
 - ГКП на ПВХ «Elorda Eco System» от 03 ноября 2022 года № 1296 на водопонижение;
 - ГКП на ПВХ «Elorda Eco System» от 30 декабря 2021 года № 2171 на ливневую канализацию;
 - ТОО «КаР-Тел» Отдел панирования и развития Фиксированной сети от 27 сентября 2022 года № 156-27/09/2022, на телефонизацию объекта;
 - АО «Астана-Теплотранзит» от 26 мая 2021 года № 3094-11, от 23 ноября 2021 года № 7214-11 и от 06 декабря 2021 года № 7555-11, с продлением от 31 октября 2022 года № 6076-11, на присоединение к тепловым сетям;
 - АО «Астана-РЭК» от 20 апреля 2018 года № 5-Е-20/1-1727 (основные), от 15 августа 2019 года № 5-Е-20/1-1461 (изменения), от 10 декабря 2021 года № 5-Е-20/1-2267 (изменения), от 30 декабря 2021 года № 5-Е-20/1-2395 (изменения), на проектирование и присоединение к электрическим сетям.
- 1.6 Эскизный проект Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, участок №55/5 (Sezim Qala 13 -очередь) и Многоквартирный жилой комплекс, расположенный по адресу г.Нур-Султан, район Есиль, пр.Туран, уч. №55/5» (ЖКК «Sezim Qala» 13 очередь строительства). Наружные инженерные сети со сметной документацией» «ТОО Sezim Arena» в 2022 году.
- 1.7 Рабочий проект (предоставлен в электронном виде);
- 1.8 Сметная документация (предоставлена в электронном виде);

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №230210920715709 от 01.02.2023

Журнал производства работ;

Журнал забивки свай;

Журнал бетонных работ;

Журнал ухода за бетоном;

7. Анализ проектной документации

1) Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчета:

1.1 Договор на разработку проектно-сметной документации б/н от 20.01.2023г. без наружных инженерных сетей (Генеральный проектировщик: ТОО «TAIMAS PARTNERS», лицензия №21031527 от 11.11.2021г. на осуществление проектной деятельности. Договор исполнен).

1.2 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлено положительное заключение филиала РГП «Госэкспертиза» г.Алматы) № 0-0022/23 от 20.01.2023г

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Таблица 3

| | Разделы проекта | План, % | Факт, % | Отклонение (+/-), % | План с нарастающим, % | Факт с нарастающим, % | Отклонение по нарастающему (+/-), % |
|----|--|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Конструкции железобетонные | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.94 | 30.97 | -0.96 |
| 2 | Архитектурно-строительные решения (AP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.16 | 23.76 | -10.40 |
| 3 | Отопление вентиляция | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 7.89 | -0.24 |
| 4 | Водопровод канализация | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 4.12 | -0.74 |
| 5 | Электрооборудование, слабые токи | 0.07 | 0.00 | -0.07 | 9.68 | 9.03 | -0.64 |
| 6 | Лифты | 0.77 | 0.00 | -0.77 | 3.83 | 0.87 | -2.96 |
| 7 | Паркинг | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Благоустройство | 0.36 | 0.00 | -0.36 | 1.52 | 1.28 | -0.24 |
| 9 | наружные сети | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | -5.91 |
| 10 | Всего (только СМР) | 1.20 | 0.00 | -1.20 | 100.00 | 77.93 | -22.07 |
| 11 | Прочее | 3.08 | 0.00 | -3.08 | 5.49 | 1.62 | -3.87 |
| 12 | Всего (СМР + Прочее) | 4.22 | 0.00 | -4.22 | 100.00 | 75.27 | -24.73 |

Таблица 4

| Разделы проекта | Отставание (-)/опережение (+) по видам работ* | Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим* | Причины отставания/опережения по видам работ |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Конструкции железобетонные | 0 | 0 | |
| Архитектурно-строительные решения (AP) | 0 | 0 | |
| Отопление вентиляция | 0 | 0 | |
| Водопровод канализация | 0 | 0 | |
| Электрооборудование, слабые токи | -2 | 0 | |
| Лифты | -19 | 0 | |
| Паркинг | 0 | 0 | |
| Благоустройство | -9 | 0 | |
| наружные сети | 0 | 0 | |
| Прочее | 0 | 0 | Объект введен |
| Итого | -30 | 0 | |

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

| № | Замечания | Итого выявлено за период строительства | Итого устранено за период строительства | За отчетный период - выявлено | За отчетный период - устранено | Итого не устранено на текущую дату |
|-----|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Документация и организационные вопросы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | По технике безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | По качеству строительно-монтажных работ, в том числе: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Конструкции железобетонные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Общестроительные работы АР | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Лифты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водоснабжение и канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | Электромонтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Слаботочные сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Паркинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Сети электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Всего | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

3) Перечень предписаний, не устраниенных на дату мониторингового отчета

Перечень предписаний не устраниенных на дату мониторинг: нет

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Проблем в ходе работ за отчетный период не было.

11. Сведения об изменениях на Объекте

За отчетный период в рабочей документации изменений не было;

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

| № | Наименование статей расходов | Планируемый бюджет | Оплаты до получения гарантии | Освоение до получения гарантии | Оплаты за отчетный период | Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии | Освоение за отчетный период | Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии | Всего оплаты | Всего освоение |
|-----|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Разработка ПСД | 152 979 543.36 | | | 0.00 | 4 000 000.00 | 0.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
| 2 | Экспертиза | 5 498 888.64 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | CMP и оборудование | 6 246 181 713.40 | | | 0.00 | 4 514 433 007.00 | 0.00 | 4 867 534 525.68 | 4 514 433 007.00 | 4 867 534 525.68 |
| 3.1 | в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве' | 624 818 171.34 | | | 0.00 | 186 712 614.52 | 0.00 | 145 501 706.36 | 186 712 614.52 | 145 501 706.36 |
| 4 | Авторский надзор | 52 325 388.64 | | | 0.00 | 2 300 000.00 | 0.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| 5 | Технический надзор | 151 831 660.96 | | | 0.00 | 70 773 320.82 | 0.00 | 100 571 677.69 | 70 773 320.82 | 100 571 677.69 |
| | Всего CMP | 6 608 817 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 591 506 327.82 | 0.00 | 4 974 406 203.37 | 4 591 506 327.82 | 4 974 406 203.37 |
| 6 | Иное | 330 440 859.75 | | | 2 922 161.97 | 160 280 477.69 | 2 922 161.97 | 160 280 477.69 | 160 280 477.69 | 160 280 477.69 |
| | Всего CMP и Иное | 6 939 258 054.75 | 0.00 | 0.00 | 2 922 161.97 | 4 751 786 805.51 | 2 922 161.97 | 5 134 686 681.06 | 4 751 786 805.51 | 5 134 686 681.06 |

Таблица 7

| № | Наименование источника финансирования | Поступления в отчетном периоде | Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заемные средства | -22 986 466.50 | 503 054 226.70 |
| 1.1 | Банк | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Застройщик | -22 986 466.50 | 499 182 519.35 |
| 1.3 | Прочее 3% ИК | 0.00 | 3 871 707.35 |
| 2.1 | Бронь ДДУ | 1 609 898.87 | 839 863 929.99 |
| 2.2 | Поступление по другой очереди ДДУ | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | ДДУ | 63 699 279.00 | 4 810 701 556.00 |
| | ВСЕГО | 42 322 711.37 | 6 153 619 712.69 |

Приложение 2 к Таблице 7

| № | Данные по ДДУ | Количество | Площадь, м ² | Стоимость ДДУ, тенге | Оплачено, тенге |
|---|------------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Квартиры | 279 | 15 915.54 | 6 326 121 402.00 | 4 810 701 556.00 |
| 2 | Коммерческие помещения | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Паркинг | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Кладовое помещение | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Всего | 279 | 15 915.54 | 6 326 121 402.00 | 4 810 701 556.00 |

Таблица 8

| № | Наименование договоров | Стоимость по договору | Стоимость по проектно-сметной документации | Разница |
|---|---|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Договор генерального подряда | 6 246 181 713.40 | 6 246 181 713.40 | 0.00 |
| | Договора поставки материалов, договора аренды техники * | | | 0.00 |
| 2 | Договор оказание услуг авторского надзора | 10 500 000.00 | 52 325 388.64 | 41 825 388.64 |
| | в т.ч. ДАУ | | | 0.00 |
| | НОК | | | 0.00 |
| 3 | Договор оказание услуг технического надзора | 129 056 911.82 | 151 831 660.96 | 22 774 749.14 |
| | в т.ч. ДИУ | | | 0.00 |
| | НОК | | | 0.00 |

Таблица 9. Анализ плана финансирования

| № | Общая сумма по плану финансирования | План на отчетный месяц | Факт на отчетный месяц | Отклонение | Итого План финансирования с нарастающим | Итого Факт финансирования с нарастающим | Отклонение |
|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 6 608 817 195.00 | 271 086 538.08 | 0.00 | -271 086 538.08 | 6 608 817 195.00 | 4 591 506 327.82 | -2 017 310 867.18 |

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

По стоимости строительно-монтажных работ – работы велись в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. В отчетном периоде СМР по строительству объекта выполнялись в среднем темпе, СМР соответствуют требованиям утвержденной рабочей документации. в отчетный период подписан акт ввода объекта в эксплуатацию.

На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества работ по наружной кладке стен, монтажу внутренних инженерных сетей и внутренней отделке (включая виды: входной, операционный и приемочный).

Рекомендации от инжиниринговой компании: нет.

Состав инжиниринговой компании:

Директор ТОО «Engineering Services» _____ Бикбаев К.Н.

Эксперт технического надзора ТОО «Engineering Services» _____ Кудияров Т.М.

Эксперт технического надзора ТОО «Engineering Services» _____ Мустахимов А.С.

Эксперт технического надзора ТОО «Engineering Services» _____ Байкенов А.Е.


Специалист по учету затрат ТОО «Engineering Services» _____ Садвакасова А.К.


Дата составления отчета «15» декабря 2024г

Подписанты

| # | Участники процесса | ИИН - ФИО | Организация | Статус | Дата подписи |
|---|-----------------------|---|-------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | INITIATOR | 880710450679 - САДВАКАСОВА АЗИЗА | | NEW | |
| 2 | HEAD | 800728000769 - БИКБАЕВ КАРИМЖАН НУРГАЛЕЕВИЧ | | NEW | |
| 3 | TECHNICAL_SUPERVISION | 831208300422 - КУДИЯРОВ ТАЛГАТ МИРЗАШЕВИЧ | | NEW | |
| 4 | TECHNICAL_SUPERVISION | 811029302254 - МУСТАХИМОВ АНАРБЕК САЙЛАУБАЕВИЧ | | NEW | |
| 5 | TECHNICAL_SUPERVISION | 990618350368 - БАЙКЕНОВ АСЫЛБЕК ЕРБОЛОВИЧ | | NEW | |



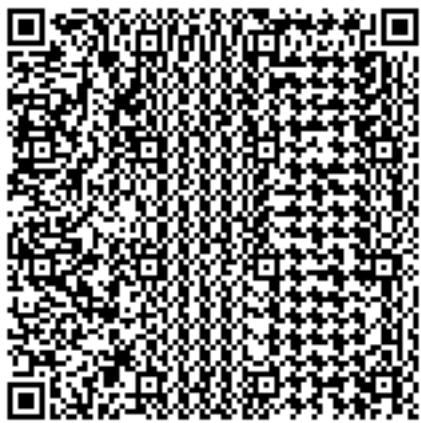

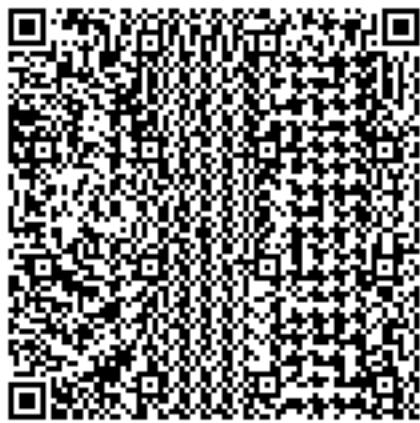


















ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

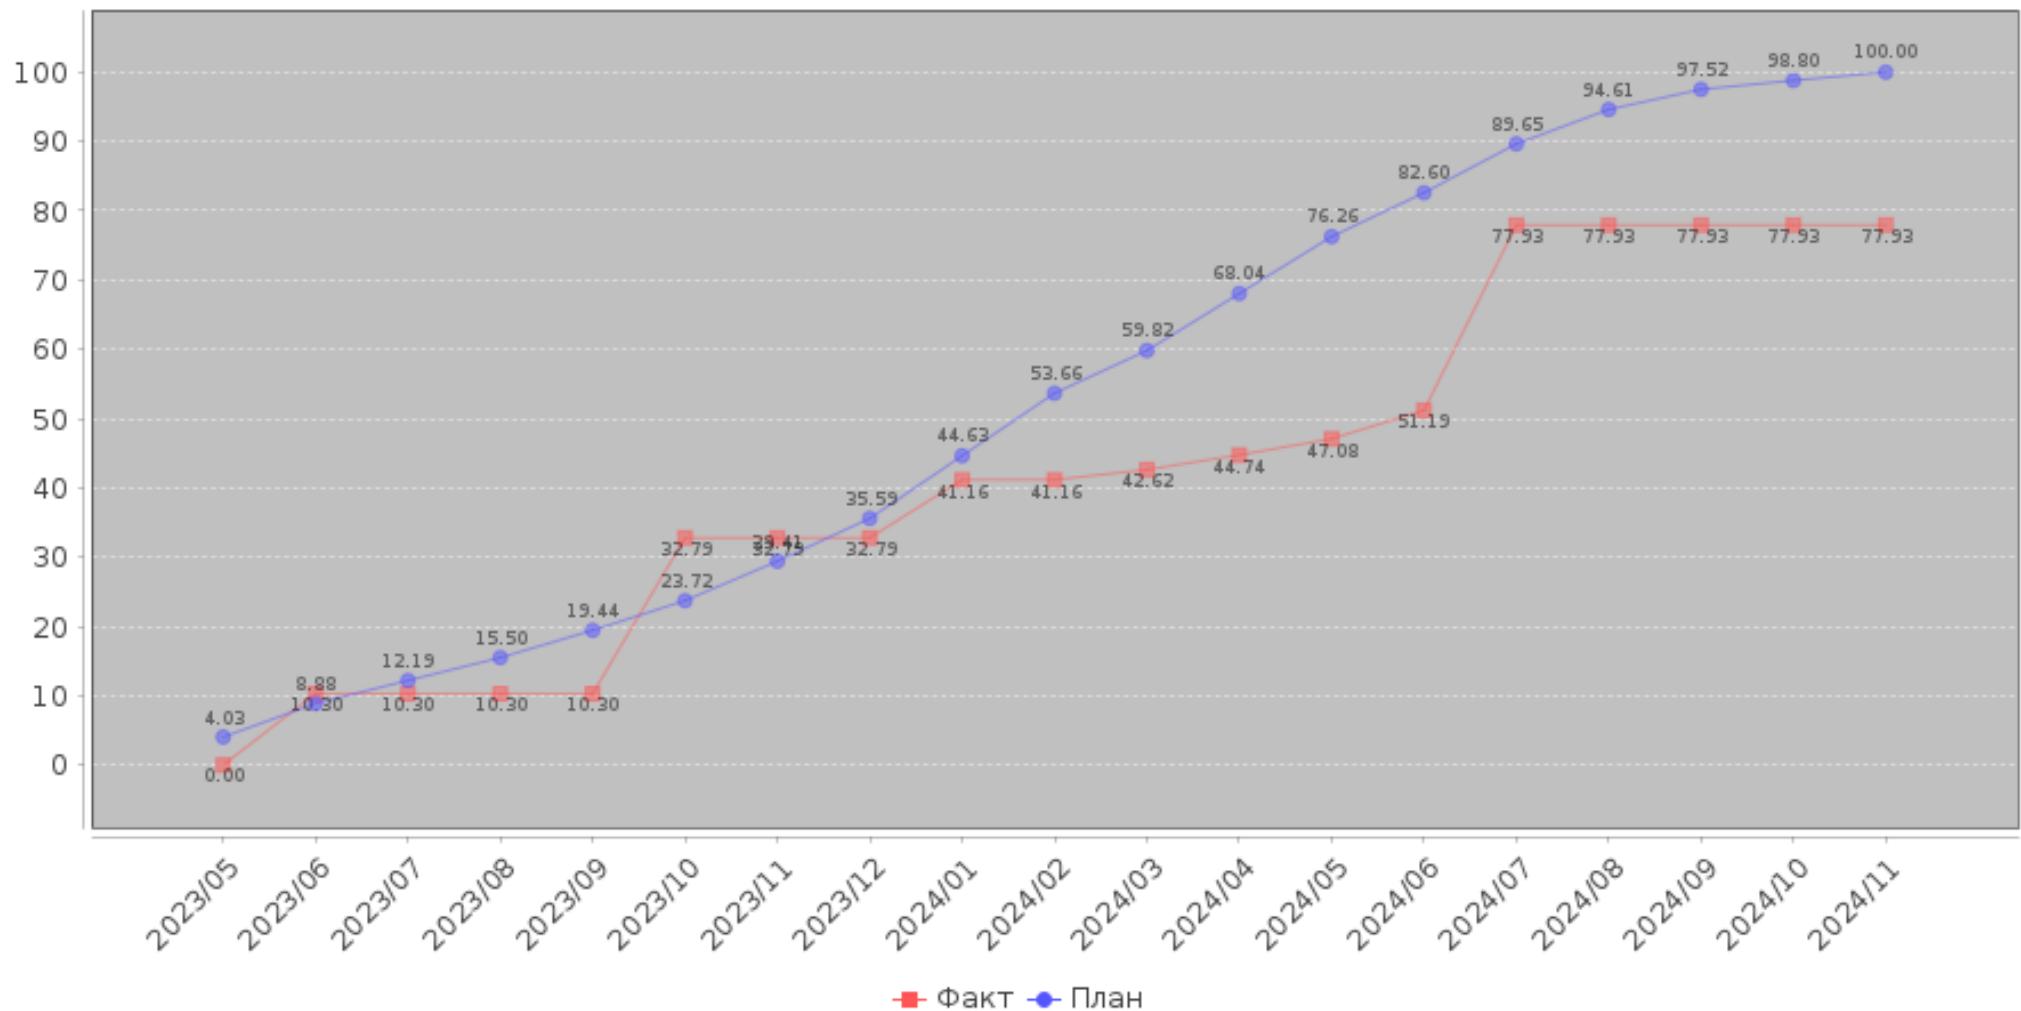

Вертикальный график

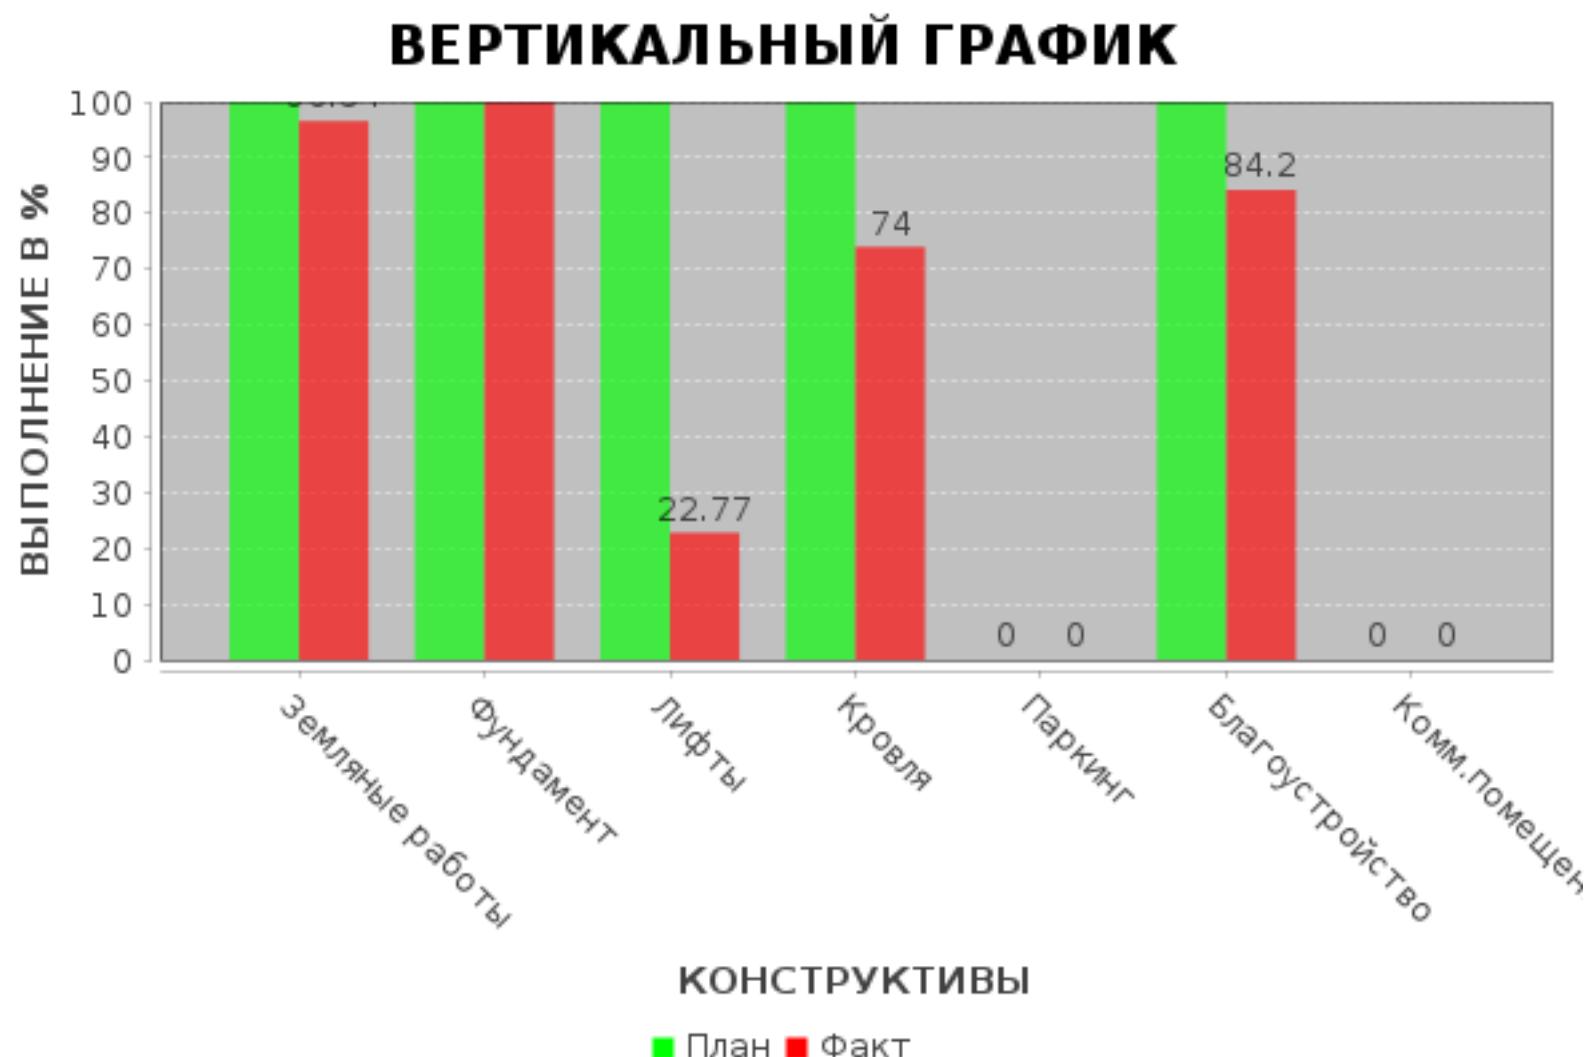

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

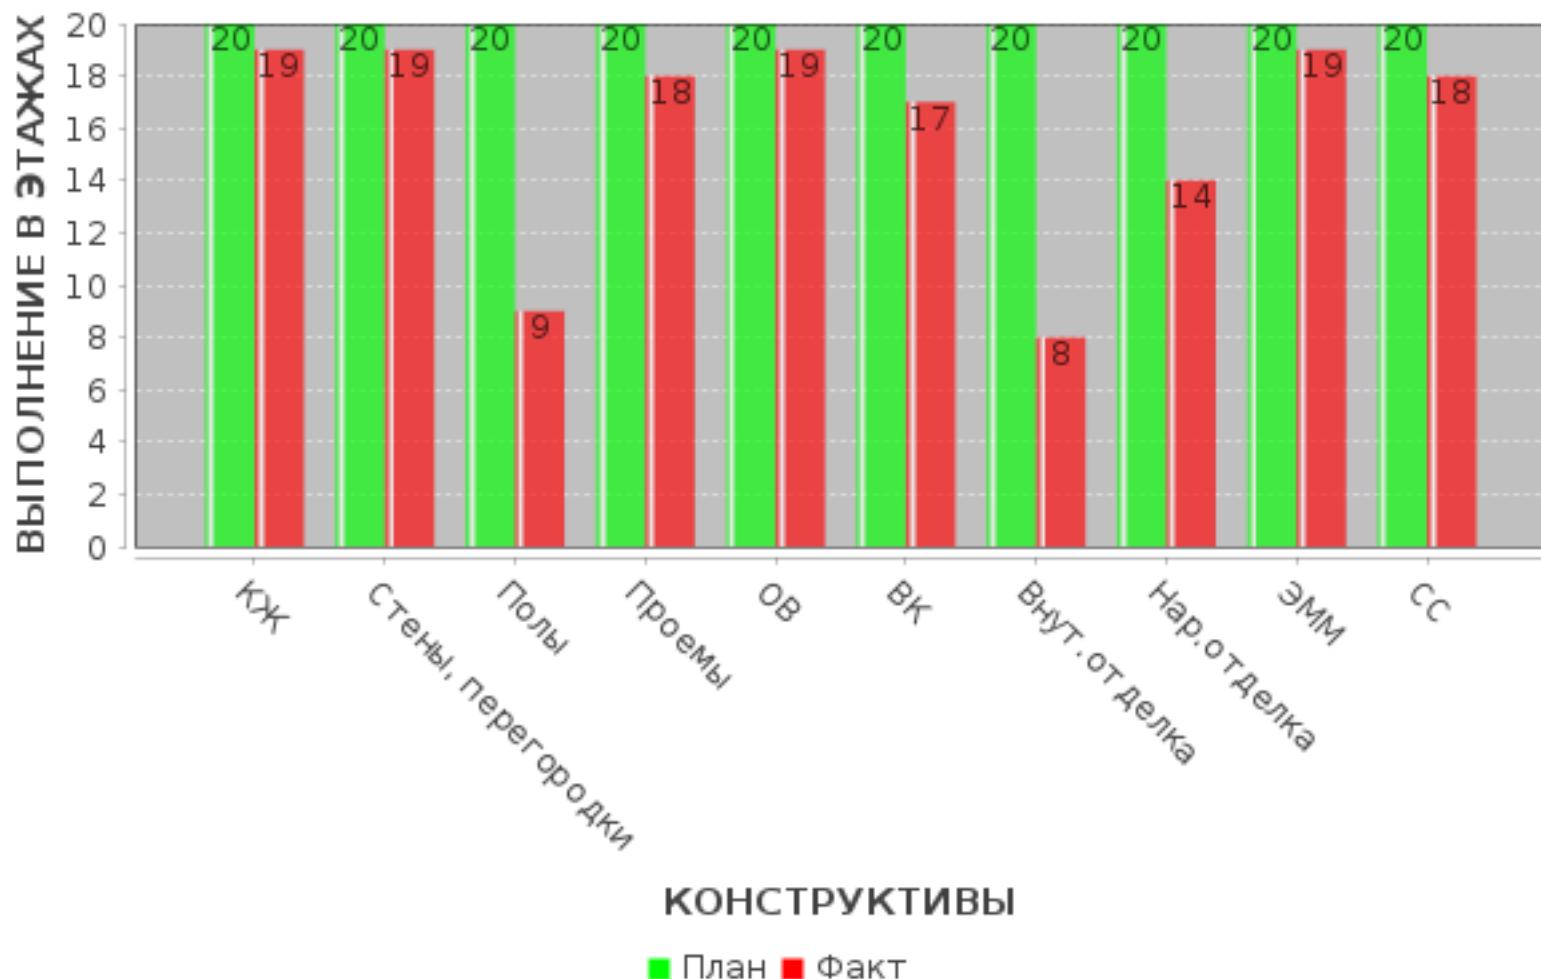


Фотофиксация за отчетный период



22 ноября 2024 г. 11:17:14



22 ноября 2024 г. 11:17:56
Есильский район
Астана
Astana

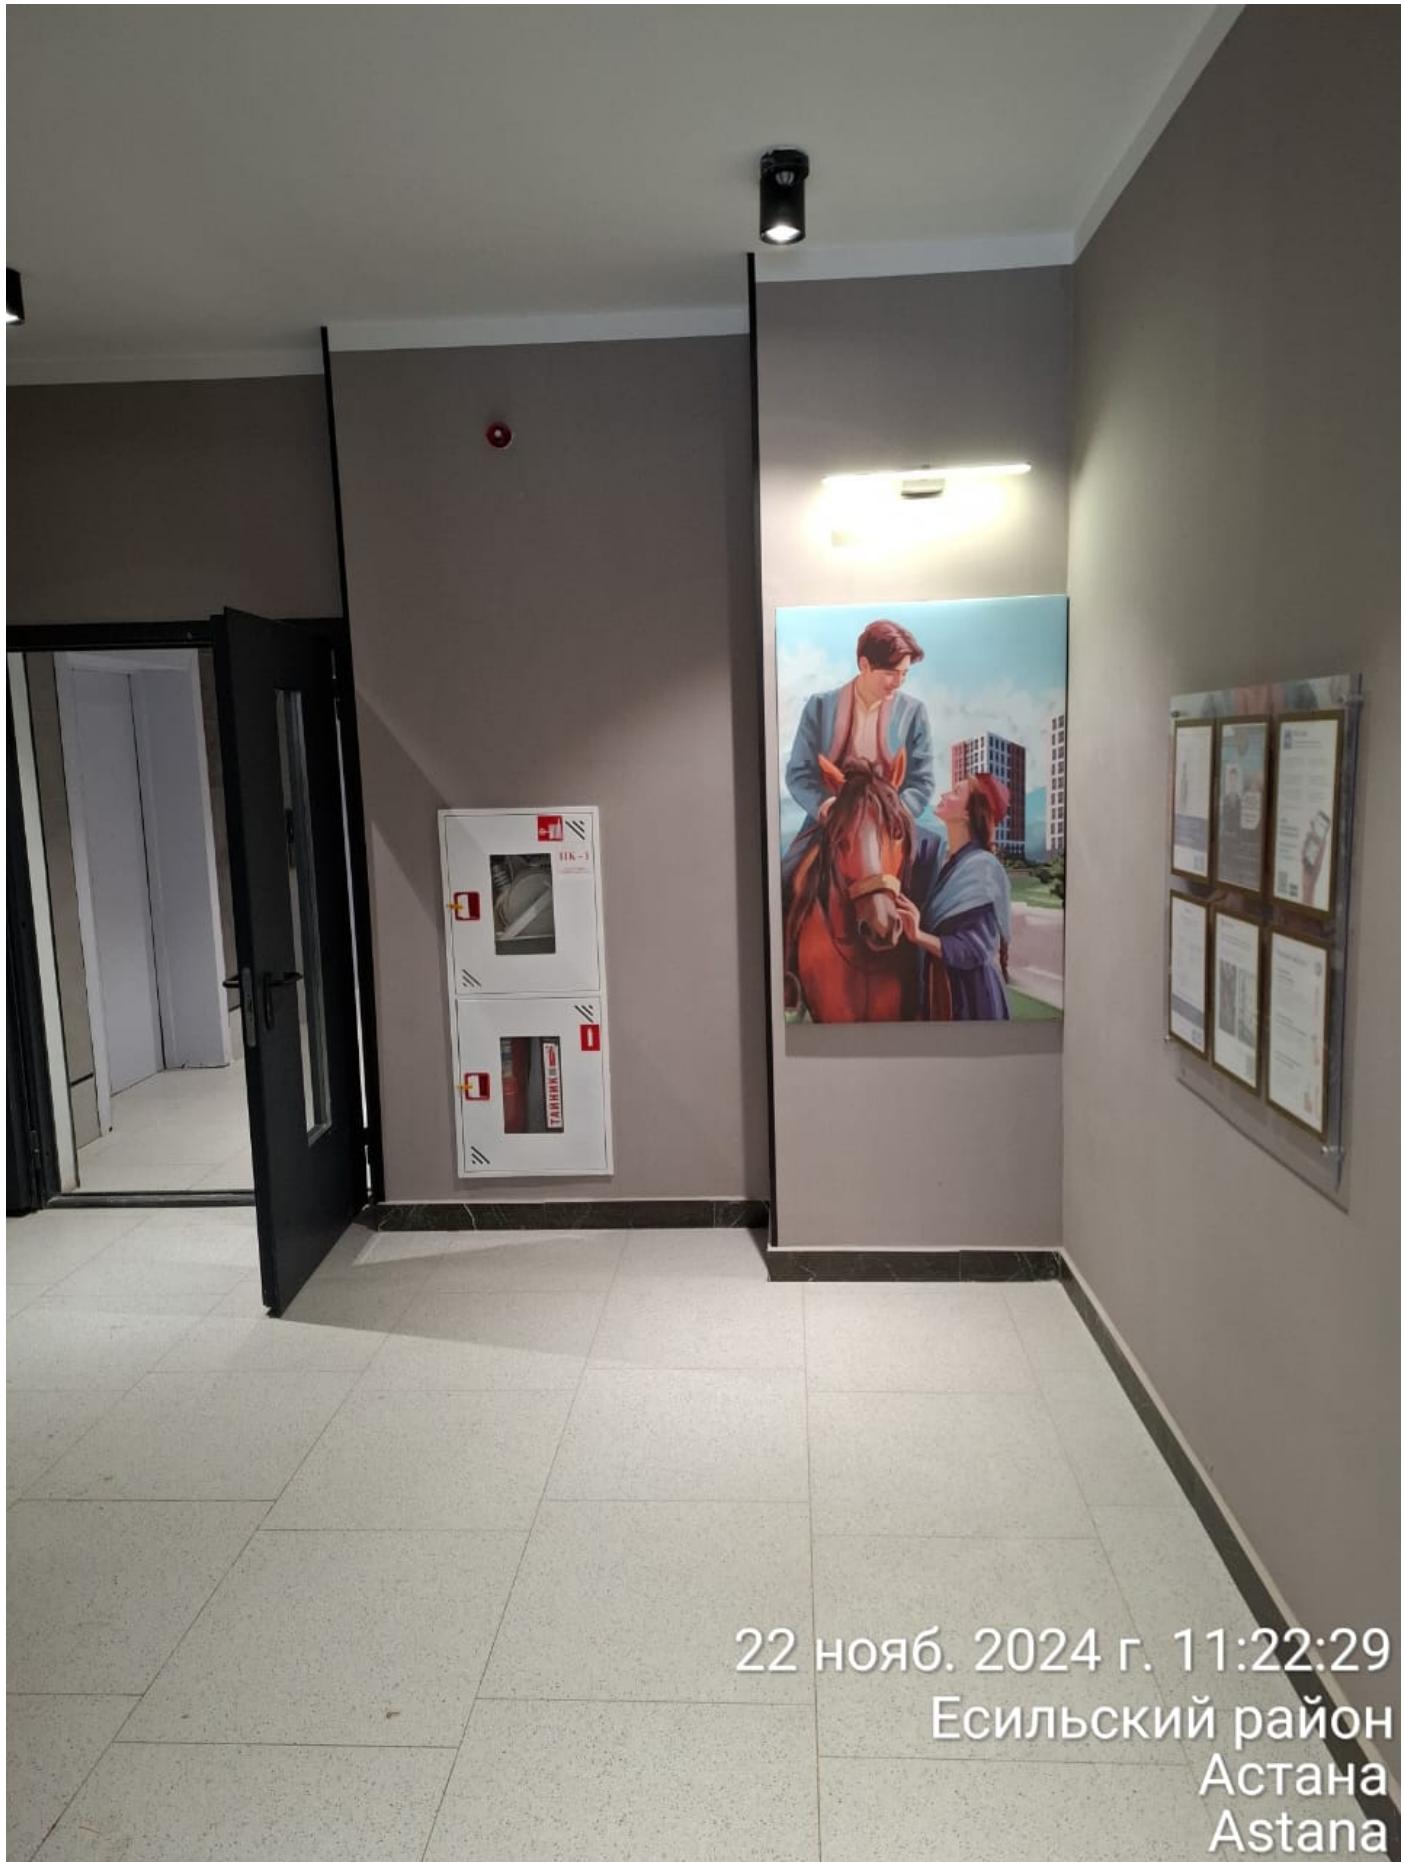

22 нояб. 2024 г. 11:22:29
Есильский район
Астана
Astana



22 нояб. 2024 г. 11:22:38
Есильский район
Астана
Astana

Лист согласования

| # | Дата | ФИО | Комментарий |
|---|------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 12.12.2024 09:22 | САДВАКАСОВА АЗИЗА null | Отправка отчета |
| 2 | 13.12.2024 10:41 | БИКБАЕВ КАРИМЖАН null | Отчет подписан |
| 3 | 17.12.2024 06:56 | БАЙКЕНОВ АСЫЛБЕК null | Отчет подписан |
| 4 | 17.12.2024 07:01 | МУСТАХИМОВ АНАРБЕК null | Отчет подписан |
| 5 | 17.12.2024 10:00 | КУДИЯРОВ ТАЛГАТ null | Отчет подписан |
| 6 | 17.12.2024 10:59 | САДВАКАСОВА АЗИЗА null | Отчет подписан |
| 7 | 17.12.2024 11:45 | ИСКАКОВ НУРСУЛТАН null | Отчет согласован |
| 8 | 23.12.2024 11:28 | ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null | Отчет согласован |
| 9 | 23.12.2024 11:33 | ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null | Отчет согласован |
