



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - II очередь

Код: ДС №2 от 10.07.2024 к № ДПГ-23-17-050-159 от 28.12.2023

Отчетный период: 202503

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.03.2025 года по 31.03.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "D & J EMPORIO", БИН 081240016084

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "Otbasz Satu"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: ДС №2 от 10.07.2024 к № ДПГ-23-17-050-159 от 28.12.2023 /202503

Информация по проекту: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - II очередь

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2024-06-10 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2025-11-29 года

Нормативный срок строительства: 19 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: 19-0022/24 от 2024-01-17 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	230240002119 - TOO "Otbasu Satu"	устав	№ 09/Otbasy, от 22.01.2024 года	Ибраймов Н.Б.	директор	+77077800501, null
2	Подрядчик	060340004172 - TOO «Kanfar Building»	Лицензия:12021953, 07.12.2012	№ 09/Otbasy, от 22.01.2024 года	Баймуханов Тлеу Кобегенович	директор	+77778808999, null
3	Авторский надзор	011040008574 - TOO "Компания TALAP PROJECT"		№ 24/01/2024, от 24.01.2024 года	Калмаганбетов Мадии Абилкасымович	директор	+77027604830, null
4	Инжиниринговая компания	081240016084 - TOO "D & J EMPORIO"	KZ39VWC0089618	ДИУ-24-06-004/017, от 28.06.2024 года	Дюсенов Данияр Алшынович	директор	+77015447430, e-emporio@mail.ru
5	Генеральный проектировщик	050740007308 - TOO "ОЮ Project Group"	15- ГСЛ №002373	№ 1, от 29.01.2024 года	Хан А.Е.	директор	null, null

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Площадка расположена на пересечении улиц К. Толеметова и А2 города Шымкента.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Проектируемый объект «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - II очередь, размещается на отведенной территории в 1,5243 га. II очередь строительства – 1,5243 га. II очередь строительства – 9 жилых блоков этажностью 9 этажей и одноэтажная коммерция. В блоках II очереди строительства на первых этажах в зданиях в блоках 7,8,9,10, на первом этаже располагаются встроенные помещения общественного назначения (офисы) с самостоятельными входными группами и санузлами, в блоках 6,11,12,13,14 с первого по девятый этажи расположены жилые квартиры.. В блоках предусмотрен подвал, для размещения технических помещений и коммуникаций. Входы в подъезды жилого дома расположены на первом этаже - со стороны главного фасада, а также со стороны двора. В зданиях предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: отопление автономное от газовых котлов расположенных в кухнях квартир, горячее водоснабжение от газовых котлов расположенных в кухнях квартир, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	9
Этажность зданий	этаж	9
Класс комфортности жилого здания	-	4
Уровень ответственности здания	-	2
Степень огнестойкости здания	-	2
Высота жилых этажей	метр	2,7
Площадь застройки здания	квадратный метр	4520.5
Общая площадь здания	квадратный метр	33009,83
Общая площадь квартир	квадратный метр	20716,57
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	1103,86
Строительный объем здания	кубический метр	119339,69
Количество квартир	шт.	348
в том числе: однокомнатные	шт.	134
в том числе: двухкомнатные	шт.	111
в том числе: трехкомнатные	шт.	103
в том числе: четырехкомнатные	шт.	
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	43
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	11 265.640
в том числе: СМР	миллион тенге	9 111. 202
в том числе: оборудование	миллион тенге	367.123
в том числе: прочие	миллион тенге	1 787.315
Продолжительность строительства	месяц	

5. Анализ исходно–разрешительной документации

задание на проектирование рабочего проекта «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - II очередь, согласованное ТОО «ОЮ Project Group» и утвержденное ТОО «Otbasy Satu» 14.08.2023 года;

протокол общего собрания ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года с решением создать и учредить ТОО «Otbasy Satu» в размере 100% доли в уставном капитале;

решение единственного учредителя об учреждении ТОО «Otbasy Satu», выданное ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года;

справка о государственной регистрации юридического лица № 10100640898334 от 01.02.2023 года, выданная Управлением регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

передаточный акт №1 от 25.09.2023 года о передаче прав на имущество и документы, утвержденный ТОО «Kanfar Building»;

план очередности строительства, утверждённый ТОО «ОЮ Project Group» и ТОО «Otbasy Satu» в 2023 году;

архитектурно-планировочное задание №KZ02VUA00837444 от 13.02.2023 года на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.К.Тулеметова, уч.11/3, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент»;

протокол дозиметрического контроля №01-пл/д/РО-220-3109 от 26.12.2022 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №23-пл/д/РО-23-00869 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением РГП «Госэкспертиза»

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-1/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-2/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

акт №2211051520627798 на земельный участок площадью 0,5023 га (кадастровый номер 22-330-033-1048), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

акт №2301231720706099 на земельный участок площадью 4,3376 га (кадастровый номер 22-330-033-1113), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент №0318-29-03-15/524 от 08.11.2022 года о разделении земельных участков с кадастровыми номерами 22-330-033-1048 и 22-330-033-1049;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02075053 от 23.10.2023 года о ПДП;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02642997 от 22.12.2023 года с пояснением об эскизном проекте;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» №21-08-12/3762 от 14.12.2022 года об отсутствии скотомогильников;

письмо ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» №39-08-04/2 от 04.01.2023 года об отсутствии зеленых насаждений;

письмо ТОО «Kanfar Building» №59-1 от 15.06.2023 года о согласовании трубошпунтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №34-Ш от 23.10.2023 года о разработке наружных инженерных сетей отдельным проектом;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №35-Ш от 23.10.2023 года о начале строительства – 1 квартал 2024 года;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №36-Ш от 23.10.2023 года об источнике финансирования – собственные средства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №37-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №38-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки супеси;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №39-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии вывозимого грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №40-Ш от 23.10.2023 года недостающие парковочные места и гостевые парковки для коммерческих помещений 1, 2, 4 очередей будут располагаться в паркинге 3 очереди строительства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №41-Ш от 23.10.2023 года не предусматривать затраты на управление проектом;

РГП «Госэкспертиза»

письмо ТОО «Otbasý Satu» №62-Ш от 20.12.2023 года – не предусматривать во 2 очереди паркинг;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №63-Ш от 20.12.2023 года о согласовании лифтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №65-Ш от 20.12.2023 года план благоустройства и озеленения будет выполнен после прокладки наружных инженерных сетей;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №66-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, деление на очереди условное, корректировка топосъемки не требуется;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №67-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована

будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, объемы по земляным работам котловна будут учтены отдельно по очередям строительства; в сметной документации стоимость материала грунтовой подушки не учитывать, учитывать только стоимость работ; письмо ТОО «Otbasy Satu» №1-Ш от 10.01.2024 года о составе покрытия; письмо ТОО «Otbasy Satu» №2-Ш от 15.01.2024 года не выделять в сметной стоимости затраты на жилую и офисную части, не выделять стоимость 1 м²; письмо ТОО «Otbasy Satu» №3-Ш от 16.01.2024 года не учитывать в сметной стоимости затраты на газовые плиты; письмо ТОО «Otbasy Satu» №4-Ш от 10.01.2024 года о корректировке парковочных мест и пересогласовании эскизного проекта; письмо ТОО «Otbasy Satu» №6-Ш от 17.01.2024 года о согласовании трубошпунтов; технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях (заказ №5577) и топографическая съемка, согласованная со всеми заинтересованными инстанциями, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в сентябре 2022 года; технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Инженерные изыскания» (заказ №5577) в ноябре 2022 года.

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

на водоснабжение и канализацию №871 от 27.07.2023 года, выданные ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент;

на подключение к газораспределительным сетям №11-гор-2023-000004618 от 07.08.2023 года, выданные АО «КазТрансГазАймақ» Шымкентский производственный филиал;

на телефонизацию №4-387-23/Л от 31.07.2023 года, выданные АО «Қазақтелеком» ЮК ДЭСД;

на электроснабжение №18-07-42-1857 от 14.07.2023 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

7. Анализ проектной документации

протокол общего собрания ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года с решением создать и учредить ТОО «Otbasy Satu» в размере 100% доли в уставном капитале;

решение единственного учредителя об учреждении ТОО «Otbasy Satu», выданное ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года;

справка о государственной регистрации юридического лица № 10100640898334 от 01.02.2023 года, выданная Управлением регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

передаточный акт №1 от 25.09.2023 года о передаче прав на имущество и документы, утвержденный ТОО «Kanfar Building»;

план очерёдности строительства, утверждённый ТОО «ОЮ Project Group» и ТОО «Otbasy Satu» в 2023 году;

архитектурно-планировочное задание №KZ02VUA00837444 от 13.02.2023 года на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.К.Тулеметова, уч.11/3, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент»;

протокол дозиметрического контроля №01-пл/д/РО-220-3109 от 26.12.2022 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №23-пл/д/РО-23-00869 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением РГП «Госэкспертиза» Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-1/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-2/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

акт №2211051520627798 на земельный участок площадью 0,5023 га (кадастровый номер 22-330-033-1048), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

акт №2301231720706099 на земельный участок площадью 4,3376 га (кадастровый номер 22-330-033-1113), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент №0318-29-03-15/524 от 08.11.2022 года о разделении земельных участков с кадастровыми номерами 22-330-033-1048 и 22-330-033-1049;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02075053 от 23.10.2023 года о ПДП;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02642997 от 22.12.2023 года с пояснением об эскизном проекте;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» №21-08-12/3762 от 14.12.2022 года об отсутствии скотомогильников;

письмо ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» №39-08-04/2 от 04.01.2023 года об отсутствии зеленых насаждений;

письмо ТОО «Kanfar Building» №59-1 от 15.06.2023 года о согласовании трубошпунтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №34-Ш от 23.10.2023 года о разработке наружных инженерных сетей отдельным проектом;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №35-Ш от 23.10.2023 года о начале строительства – 1 квартал 2024 года;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №36-Ш от 23.10.2023 года об источнике финансирования – собственные средства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №37-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №38-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки супеси;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №39-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии вывозимого грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №40-Ш от 23.10.2023 года недостающие парковочные места и гостевые парковки для коммерческих помещений 1, 2, 4 очередей будут располагаться в паркинге 3 очереди строительства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №41-Ш от 23.10.2023 года не предусматривать затраты на управление проектом;

РГП «Госэкспертиза»

письмо ТОО «Otbasý Satu» №62-Ш от 20.12.2023 года – не предусматривать во 2 очереди паркинг;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №63-Ш от 20.12.2023 года о согласовании лифтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №65-Ш от 20.12.2023 года план благоустройства и озеленения будет выполнен после прокладки наружных инженерных сетей;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №66-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, деление на очереди условное, корректировка топосъемки не требуется;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №67-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, объемы по земляным работам котловна будут учтены отдельно по очередям строительства; в сметной документации стоимость материала грунтовой подушки не учитывать, учитывать только стоимость работ;

письмо ТОО «Otbasy Satu» №1-Ш от 10.01.2024 года о составе покрытия;
письмо ТОО «Otbasy Satu» №2-Ш от 15.01.2024 года не выделять в сметной стоимости затраты на жилую и офисную части, не выделять стоимость 1 м²;
письмо ТОО «Otbasy Satu» №3-Ш от 16.01.2024 года не учитывать в сметной стоимости затраты на газовые плиты;
письмо ТОО «Otbasy Satu» №4-Ш от 10.01.2024 года о корректировке парковочных мест и пересогласовании эскизного проекта;
письмо ТОО «Otbasy Satu» №6-Ш от 17.01.2024 года о согласовании трубошпунтов;
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях (заказ №5577) и топографическая съемка, согласованная со всеми заинтересованными инстанциями, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в сентябре 2022 года;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Инженерные изыскания» (заказ №5577) в ноябре 2022 года.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

Блоки 6,7,8,9.

Выполняются каменная кладка стен ,шахты поэтажно из газоблоков, отделочные, сантехнические, электромонтажные, отопление и вентиляционные работы, остекление окон и установка оконных блоков, стяжка пола.

Блок -10. Выполняются установка опалубки стены и ДЖМ восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок номер 11.

Выполняются бетонирование плиты перекрытия седьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок 12.

Выполняются бетонирование плиты перекрытия восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок 13.

Выполняются бетонирование стен и ДЖМ восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные, вентиляционные работы.

Блок 14.

Выполняются демонтаж опалубки стены и ДЖМ седьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы, сантехнические, электромонтажные, вентиляционные работы.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	1.96	4.35	2.40	27.02	37.70	10.67
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	2.60	2.50	-0.10	17.47	12.39	-5.08
3	Отопление вентиляция	0.19	0.00	-0.19	1.27	1.37	0.10
4	Водопровод канализация	0.46	0.00	-0.46	1.39	0.76	-0.63
5	Электрооборудование, слабые токи	0.33	0.00	-0.33	2.05	0.14	-1.92

6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66
7	Паркинг	0.08	0.00	-0.08	0.40	0.00	-0.40
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	газоснабжение	0.12	0.00	-0.12	0.58	0.00	-0.58
10	Металлоконструкции КМ (кровля)	0.00	0.00	0.00	0.38	0.09	-0.29
11	Всего (только СМР)	5.74	6.86	1.11	50.57	53.10	2.53
12	Прочее	0.17	0.15	-0.02	1.19	0.94	-0.24
13	Всего (СМР + Прочее)	5.58	6.61	1.03	48.84	50.98	2.14

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ, с нарастающим*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3	4
Конструкции железобетонные	12	51	
Архитектурно-строительные решения (АР)	-1	-27	отставание связано с не закрытием форм выполнения
Отопление вентиляция	-1	1	
Водопровод канализация	-2	-3	отставание связано с не закрытием форм выполнения
Электрооборудование, слабые токи	-2	-10	отставание связано с не закрытием форм выполнения
Лифты	0	3	
Паркинг	0	-2	отставание связано с не закрытием форм выполнения
Благоустройство	0	0	
газоснабжение	-1	0	
Металлоконструкции КМ (кровля)	0	0	
Прочее	0	0	
Итого	5	13	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Качество работ субподрядных организаций оцениваются удовлетворительно. Итн рекомендовано усилить качество смр и разработать план мероприятий по устранению отставания. Опережение за отчетный месяц 13 дней.

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0

	Всего	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

За отчетный период предписаний нет

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций

а отчетный период были выполнены следующие виды работ:

Блоки 6,7,8,9.

Выполняются каменная кладка стен ,шахты поэтажно из газоблоков, отделочные, сантехнические, электромонтажные, отопление и вентиляционные работы, остекление окон и установка оконных блоков, стяжка пола.

Блок -10. Выполняются установка опалубки стены и ДЖМ восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок номер 11.

Выполняются бетонирование плиты перекрытия седьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок 12.

Выполняются бетонирование плиты перекрытия восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы.

Блок 13.

Выполняются бетонирование стен и ДЖМ восьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы, сантехнические и электромонтажные, вентиляционные работы.

Блок 14.

Выполняются демонтаж опалубки стены и ДЖМ седьмого этажа, каменная кладка стен и перегородок, отделочные работы, сантехнические, электромонтажные, вентиляционные работы.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Проблем, влияющих на качество смр и ввод объекта в эксплуатацию, отсутствуют.

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений в проекте нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	343 040 850.88			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	7 934 295.04			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	10 615 852 648.40	1 128 331 430.00	1 128 331 430.00	422 400 000.00	3 244 913 000.00	727 888 268.00	4 509 058 723.00	4 373 244 430.00	5 637 390 153.00
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	1 061 585 264.84			0.00	707 357 430.72	54 268 882.59	336 180 138.08	707 357 430.72	336 180 138.08
4	Авторский надзор	76 473 686.24			300 000.00	2 100 000.00	300 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00	2 100 000.00
5	Технический надзор	222 338 549.44			0.00	14 000 000.00	16 827 783.91	104 243 287.25	14 000 000.00	104 243 287.25
	Всего СМР	11 265 640 030.00	1 128 331 430.00	1 128 331 430.00	422 700 000.00	3 261 013 000.00	745 016 051.91	4 615 402 010.25	4 389 344 430.00	5 743 733 440.25
6	Иное	22 531 280.06			1 500 000.00	11 397 390.58	1 500 000.00	11 397 390.58	11 397 390.58	11 397 390.58
	Всего СМР и Иное	11 288 171 310.06	1 128 331 430.00	1 128 331 430.00	424 200 000.00	3 272 410 390.58	746 516 051.91	4 626 799 400.83	4 400 741 820.58	5 755 130 830.83

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	-14 122 691.13	119 111 351.94
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	-14 122 691.13	112 531 195.94
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	6 580 156.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	14 502 000.00
2.2	ДДУ	435 998 883.00	3 139 219 590.00
	ВСЕГО	421 876 191.87	3 272 832 941.94

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	175	11 077.53	3 657 426 924.00	3 031 933 460.00
2	Коммерческие помещения	6	618.73	297 338 200.00	107 286 130.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	181	11 696.26	3 954 765 124.00	3 139 219 590.00

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	10 615 852 648.40	10 615 852 648.40	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора			0.00
	в т.ч. ДАУ	76 473 686.24	76 473 686.24	0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	219 338 549.44	222 338 549.44	3 000 000.00
	в т.ч. ДИУ	219 338 549.44	222 338 549.44	3 000 000.00
	НОК			0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11 265 640 030.00	560 735 185.75	422 700 000.00	-138 035 185.75	6 089 315 269.92	4 389 344 430.00	-1 699 970 839.92

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации. По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. За отчетный период отставание от гпр не наблюдается . Рекомендации от инжиниринговой компании: усилить контроль со стороны ИТР, увеличить количество квалифицированных работников, своевременно предоставить акт выполненных работ по СМР, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ, производить строительно-монтажные работы строго по графику производства работ. Все работы ведутся по рабочему проекту. Иные затраты за отчетный месяц отнесены по т.7 за счет собственных средств (освоение нет), по СМР оплата произведена в виде аванса по бюджету

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	901009450617 - ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ		NEW	
2	HEAD	790417301107 - ДЮСЕНОВ ДАНИЯР АЛШЫНОВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	510315399078 - НУГМАНОВ ХАСАН		NEW	
































Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

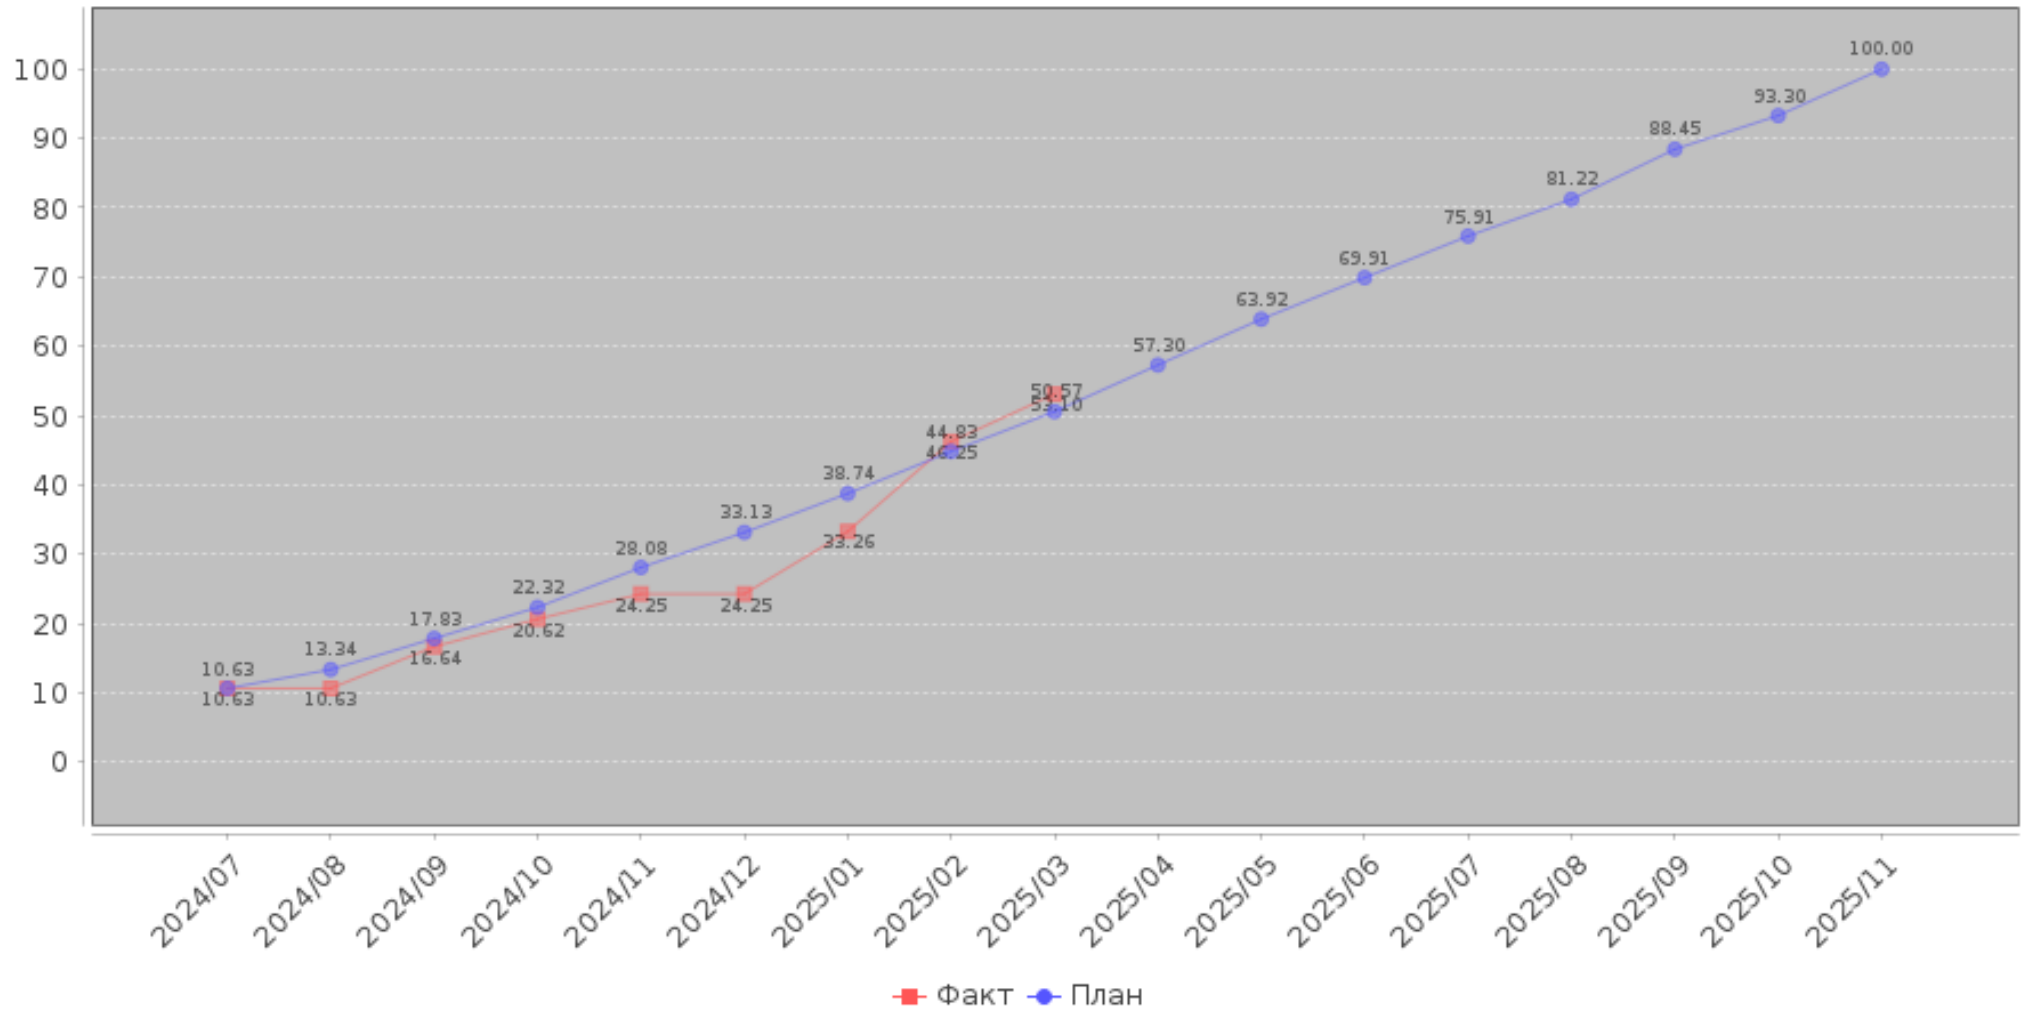

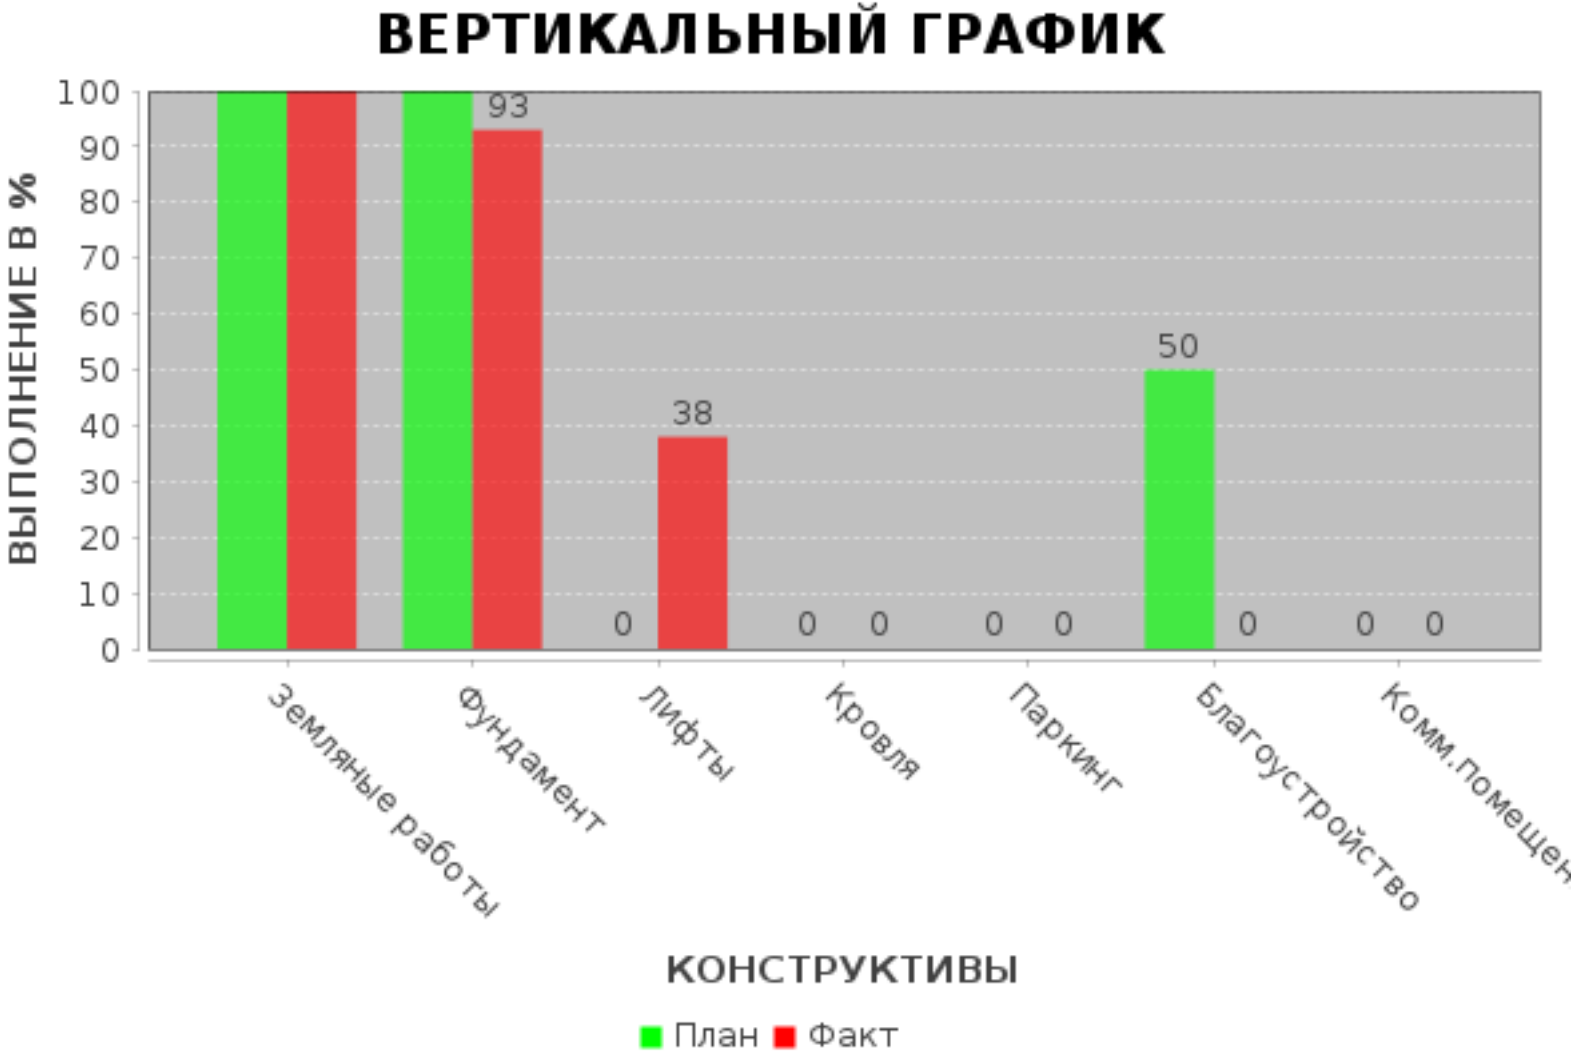

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

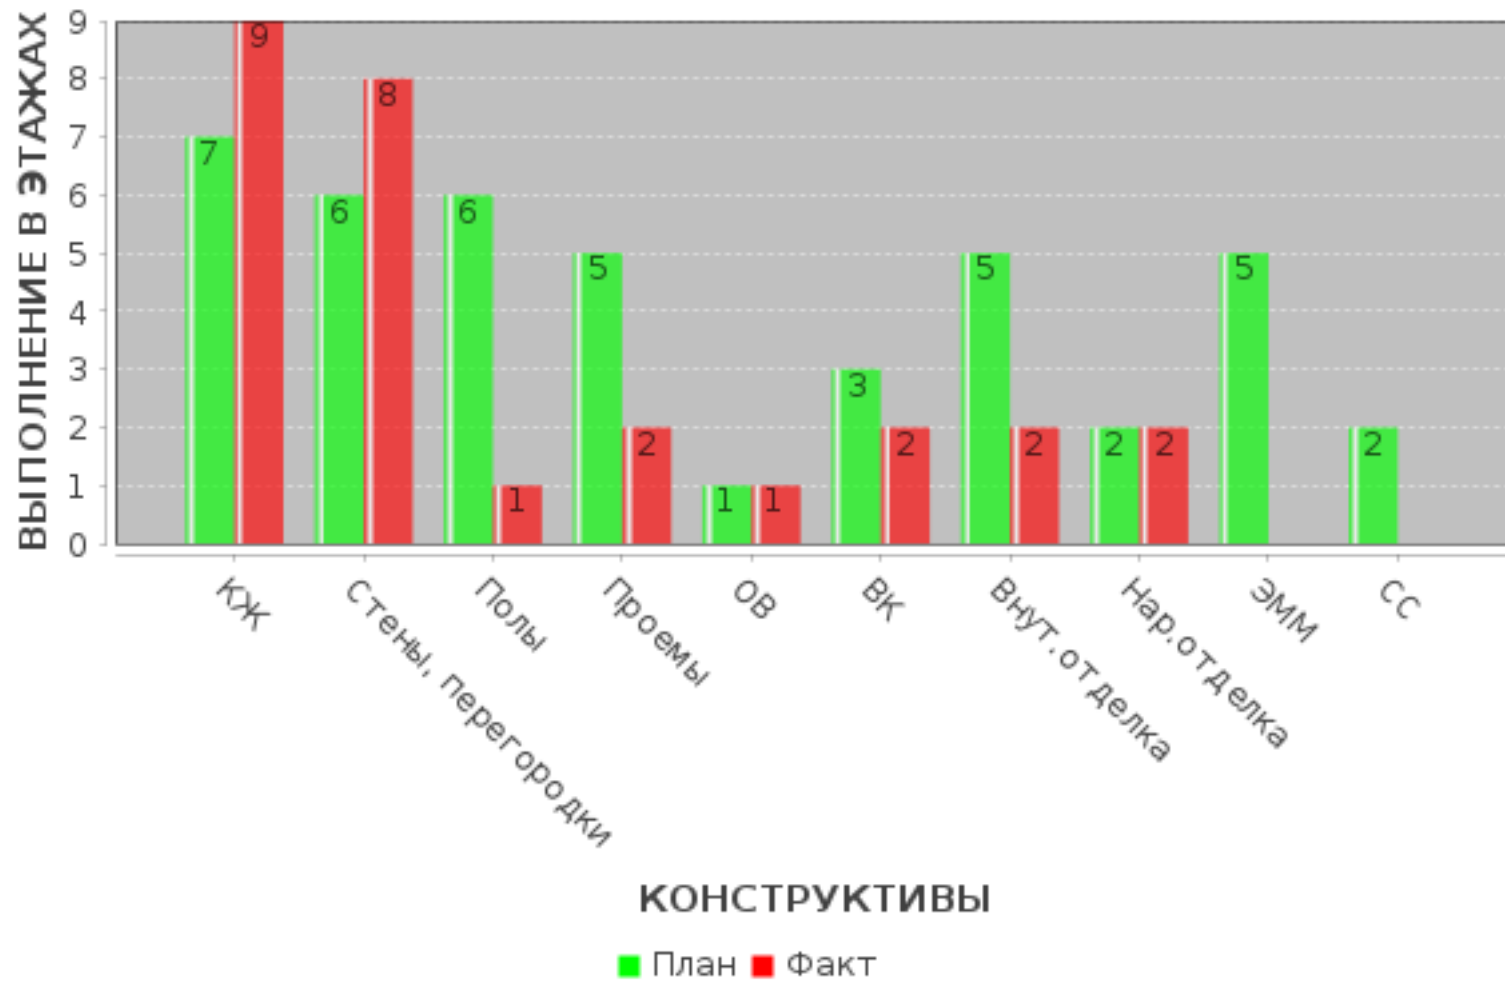

Фотофиксация за отчетный период



27 мар. 2025 г. 10:16:35
Karatau District
Shymkent



27 мар. 2025 г. 10:13:12
Karatau District
Shymkent





27 мар. 2025 г. 10:21:24
Karatau District
Shymkent



27 мар. 2025 г. 10:11:00
Karatau District
Shymkent

Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	15.04.2025 10:50	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отправка отчета
2	15.04.2025 10:51	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отчет подписан
3	15.04.2025 10:55	ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null	Отчет подписан
4	16.04.2025 06:54	НУГМАНОВ ХАСАН null	Отчет подписан
5	17.04.2025 05:28	МУЛЛАМУРАТ БАҚДӨУЛЕТ null	Отчет согласован
6	22.04.2025 10:09	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
7	22.04.2025 10:09	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
