



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

«Строительство многоквартирного жилого дома № 21 по ГП со встроенными коммерческими объектами в микрорайоне Береке, в городе Костанай, Костанайской области (без наружных сетей и благоустройства).

Код: ДПГ 25-10-048/189

Отчетный период: 202506

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.06.2025 года по 30.06.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: "Технадзор-Строй и К", БИН 160740001609

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», "БК-Береке 21"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: ДПГ 25-10-048/189/202506

Информация по проекту: «Строительство многоквартирного жилого дома № 21 по ГП со встроенными коммерческими объектами в микрорайоне Береке, в городе Костанай, Костанайской области (без наружных сетей и благоустройства).

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2025-05-13 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2027-03-01 года

Нормативный срок строительства: 23 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: СНКП-0191/24 от 2024-07-15 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	250140007724 - "БК-Береке 21"	Устав	ДИУ-25-10-021/046 , от 09.06.2025 года	Ким О.Р.	Директор	null, bk-invest18@bk.ru
2	Генеральный подрядчик	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»		ГСЛ №180211006 от 22.11.2018 года, от года	Ким И.Р.	Директор	+77142286442, bk_stroy@mail.ru
3	Авторский надзор	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»	ГСЛ №21020433 от 15.06.21 года II категория	, от года	Габдуллин А.Ж.	Главный инженер	+77015012964, bk_stroy@mail.ru
4	Инжиниринговая компания	160740001609 - "Технадзор-Строй и К"	Свидетельство об аккредитации №KZ86VWC00199352	09-01/01277, от 09.06.2023 года	Шаимов И.Б.	Директор	+77013182050, tehnadzork211291@mail.ru
5	Генеральный проектировщик	031040001233 - БК-СТРОЙ	ГСЛ №18010959 от 31.05.18 года	null, от года			+77142286442, bk_stroy@mail.ru

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Площадка строительства объекта расположена в городе Костанай микрорайон Береке.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Многоквартирный жилой дом – шести подъездное, пятиэтажное здание, с подвальным этажом и двухскатной чердачной кровлей, в блоках А, Б, Г и плоской кровлей с тех. этажом в блоке В, «Г» образной формой в плане, с размерами в осях 77,23х106,95 м. Состоит пятиэтажных жилых секций А, Б, В, Г. При этом секция А и Г состоит из двух подъездов, в то время как Б, В из одного.

В подвале располагаются электрощитовая, тепловой узел и технические помещения с проложенными коммуникация для дома. Подвал имеет обособленные, рассредоточенные выходы наружу и окна (продухи), и аварийные двери в прямках.

На первом этаже предусмотрены: лестницы, тамбура и жилые квартиры, коммерческие помещения.

На втором-пятом этаже предусмотрены лестницы, коридор, холл и жилые квартиры.

Высота жилых этажей – 2,70 м (от пола до потолка). Высота помещения чердачного этажа – 2,71-2,82 м (от пола до стропил под коньком).

Высота подвального этажа – 2,80 м (от пола до потолка)

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1
Этажность зданий	этаж	5
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II (нормальный)
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	2,7
Площадь застройки здания	квадратный метр	3063,52
Общая площадь здания	квадратный метр	16483,71
Общая площадь квартир	квадратный метр	10222,7
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	62,86
Строительный объем здания	кубический метр	63250,03
Количество квартир	шт.	189
в том числе: однокомнатные	шт.	75
в том числе: двухкомнатные	шт.	80
в том числе: трехкомнатные	шт.	30
в том числе: четырехкомнатные	шт.	4
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	3385,993
в том числе: СМР	миллион тенге	2960,795
в том числе: оборудование	миллион тенге	24,413
в том числе: прочие	миллион тенге	400,784

5. Анализ исходно–разрешительной документации

Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 31.05.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ13VUA00482614 от 02.08.2021 г.,
выдано ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай»;
акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный
участок с кадастровым номером 12-193-030-4118, площадью 0,5414 га, с целевым
назначением: для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными
коммерческими объектами;
договор об аренде земельного участка № 02-15/4207 от 26.10.2020 г.;
эскизный проект «Строительство многоквартирного жилого дома №20 по ГП со
встроенными коммерческими объектами в микрорайоне Береке в городе Костанай,
Костанайской области и (без наружных сетей и без благоустройства)» разработан в 2022
году ТОО «USMANOV Architects (Усманов Архитектс)»;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Строительство
многоквартирного жилого дома № 21 со встроенными коммерческими
помещениями по ГП в микрорайоне «Береке» в г. Костанай», выполненный в 2022 году
ТОО «Группа компаний «АСП»» (государственная лицензия № 20009373 от 30.06.2020
года);
технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный 05.05.2023
г. ТОО «Проектная студия «Доминанта» (государственная лицензия №12011698 от
24.08.2012 года);
раздел ООС «Строительство многоквартирного жилого дома №21 по ГП со
встроенными коммерческими объектами в микрорайоне Береке в городе Костанай,
Костанайской области и (без наружных сетей и без благоустройства)» выполнен ТОО
«Проектная студия «Доминанта» в 2023 году (государственная лицензия 04.03.2016 года
№ 02385Р);
протокол радиометрического контроля № 209 от 23 августа 2021 года, ТОО
«KazAtom» (лицензия № 17018625);
протокол дозиметрического контроля № 209 от 23 августа 2021 года, ТОО «KazAtom»
(лицензия № 17018625);
заключение (Положительное) № СНКП-0212/23 от 21.09.2023 г. по рабочему проекту
«Строительство многоквартирного жилого дома № 21 по ГП со встроенными
коммерческими объектами в микрорайоне Береке, в городе Костанай, Костанайской
области (без наружных сетей и благоустройства)», выданное ТОО «СНК-Проект».

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

- 1.1. Акты выполненных работ и оказанных услуг за период с начала строительства
- 1.2. Журнал технического надзора для ознакомления
- 1.3. Журнал авторского для ознакомления
- 1.4. Журнал ОТиТБ для ознакомления
- 1.5. Журнал производства работ для ознакомления
- 1.6. Журнал входного контроля материалов для ознакомления
- 1.7. Журнал бетонных работ для ознакомления
- 1.8. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
- 1.9. Журнал монтажа строительных конструкций
- 1.10 Журнал сварочных работ
- 1.11 Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
- 1.12 Акты скрытых работ

7. Анализ проектной документации

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период: за отчетный период выполнялись: по ГПР земляные работы и фундаменты.

На строительной площадке задействовано 8 рабочих.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

*С нарастающим итогом план по СМР на конец отчетного периода составляет 2,63%.

Фактическое выполнение СМР на конец отчетного периода составляет 2,51 %.

**Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода 2.61%.

Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода 2,49%.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	2.63	2.51	-0.13	2.63	2.51	-0.13
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Газоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Всего (только СМР)	2.63	2.51	-0.13	2.63	2.51	-0.13
11	Прочее	0.01	0.01	-0.00	0.01	0.01	-0.00

12	Всего (СМР + Прочее)	2.61	2.49	-0.12	2.61	2.49	-0.12
----	----------------------	------	------	-------	------	------	-------

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	-1	Причина отставания, погодные условия при бетонировании фундаментов.
Архитектурно-строительные решения (АР)	0	
Отопление вентиляция	0	
Водопровод канализация	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	
Лифты	0	
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
Газоснабжение	0	
Прочее	0	
Итого, за отчетный месяц	-1	
Итого, с нарастающим	-1	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

Предписаний на объекте нет

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии,риски неисполнения рекомендаций

Качество СМР удовлетворительное

- Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

-Рекомендации от инжиниринговой компании: усилить контроль со стороны ИТР, увеличить количество работников, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Отставание от графика 1 дн.

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений в проекте нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	20 859 819.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	700 000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	3 343 434 075.00			0.00	0.00	83 854 827.00	83 854 827.00	0.00	83 854 827.00
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	334 343 407.50			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Авторский надзор	1 000 000.00			0.00	0.00	25 080.45	25 080.45	0.00	25 080.45
5	Технический надзор	20 000 000.00			0.00	0.00	447 865.16	447 865.16	0.00	447 865.16
	Всего СМР	3 385 993 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 327 772.61	84 327 772.61	0.00	84 327 772.61
6	Иное	338 599 389.40			4 525.00	4 525.00	4 525.00	4 525.00	4 525.00	4 525.00
	Всего СМР и Иное	3 724 593 283.40	0.00	0.00	4 525.00	4 525.00	84 332 297.61	84 332 297.61	4 525.00	84 332 297.61

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	0.00	632 772.00
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	0.00	632 772.00
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	0.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	0.00	0.00
	ВСЕГО	0.00	632 772.00

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	0	0.00	0.00	0.00
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	0	0.00	0.00	0.00

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	3 343 434 074.00	3 343 434 075.00	1.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	20 000 000.00	20 000 000.00	0.00
	в т.ч. ДИУ	17 857 142.86	17 857 142.86	0.00
	НОК	2 142 857.14	2 142 857.14	0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3 385 993 894.00	79 729 449.80	0.00	-79 729 449.80	414 072 857.30	0.00	-414 072 857.30

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом

о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и

требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству)

- качество СМР удовлетворительное;
- изменений в проектной документации с момента получения гарантии нет;
- основной источник финансирования включает в себя поступления от дольщиков;
- по ГПР отставания 1 дн.

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

По т.7 поступления от дольщиков нет.

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	911221450909 - ТОКАРЕВА ИННА ВАДИМОВНА		NEW	
2	TECHNICAL_SUPERVISION	920315351376 - ШАИМОВ ИЛЪЯС БАЯНОВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	941019350494 - ШРЕМФ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ		NEW	
4	HEAD	920315351376 - ШАИМОВ ИЛЪЯС БАЯНОВИЧ		NEW	
5	TECHNICAL_SUPERVISION	941217350996 - ЕСЛЯМ ЖАНАТ ЕРБУЛАНҰЛЫ		NEW	























Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

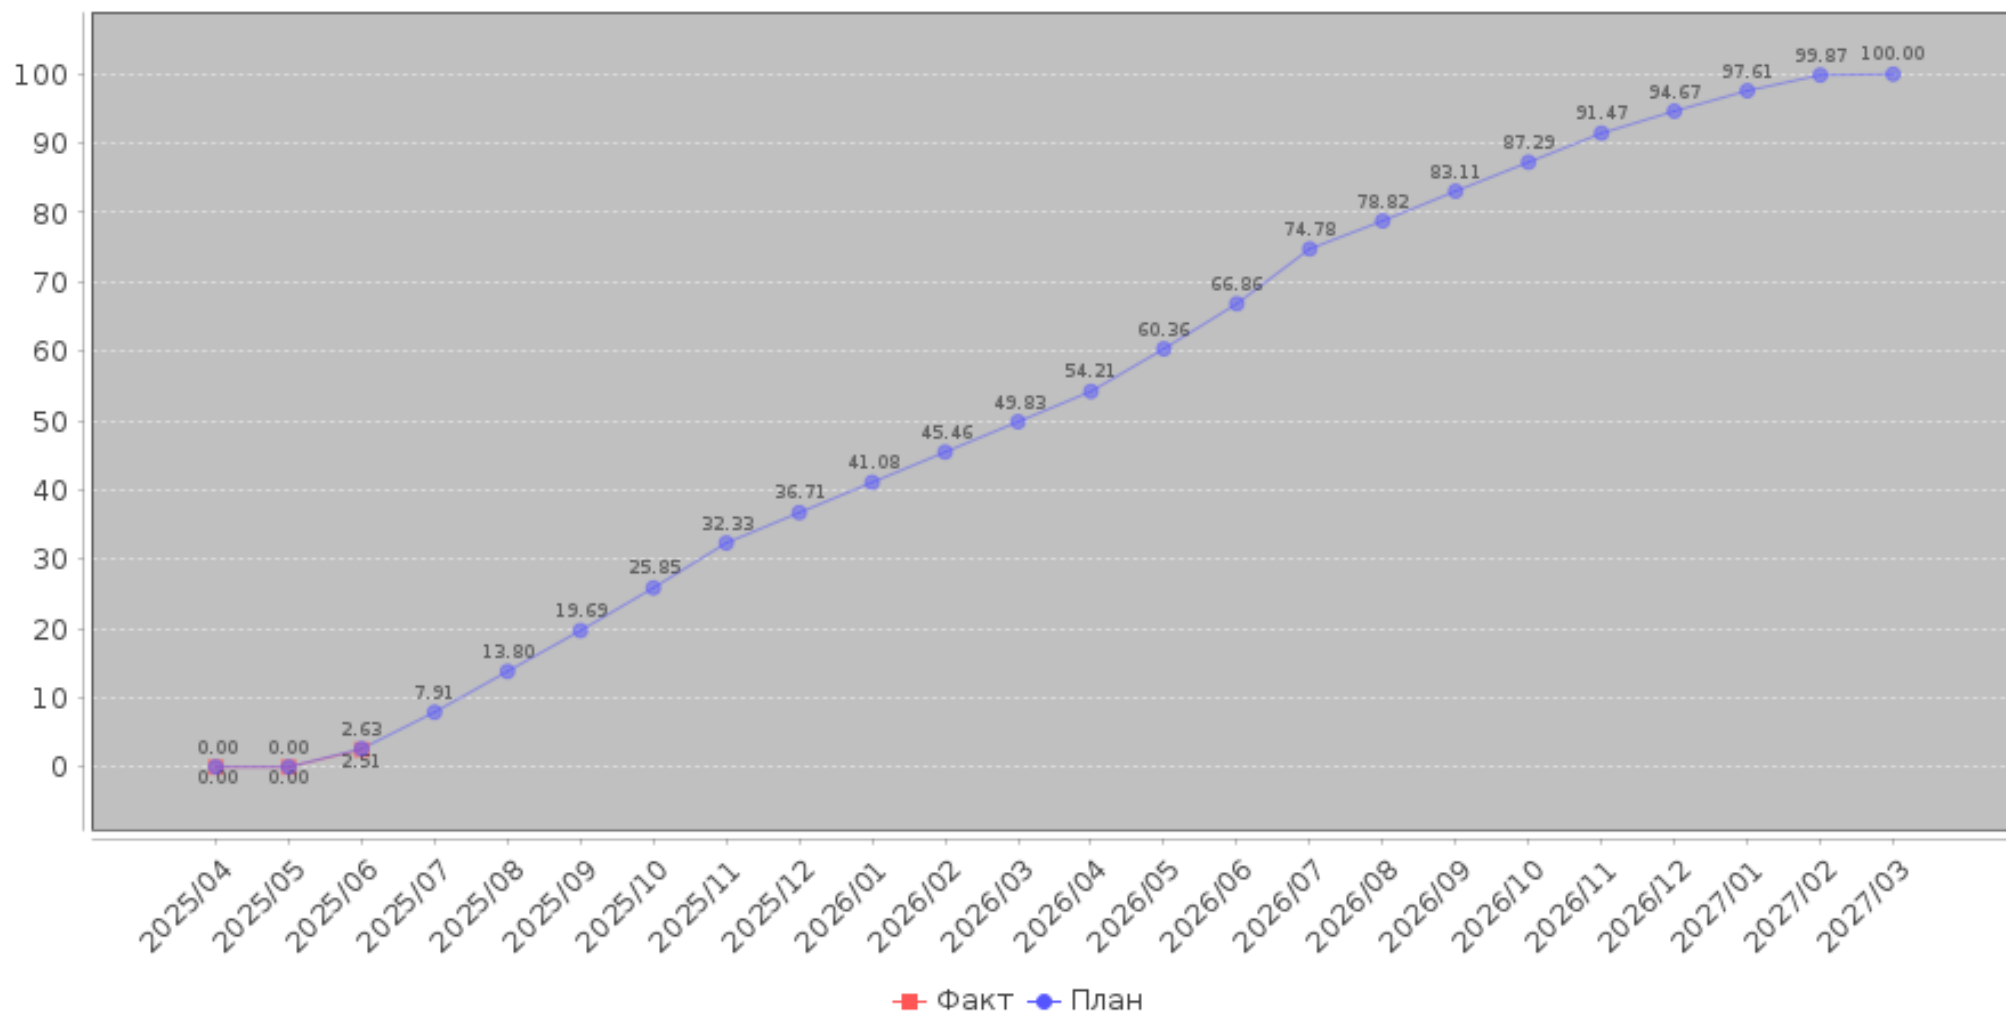



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

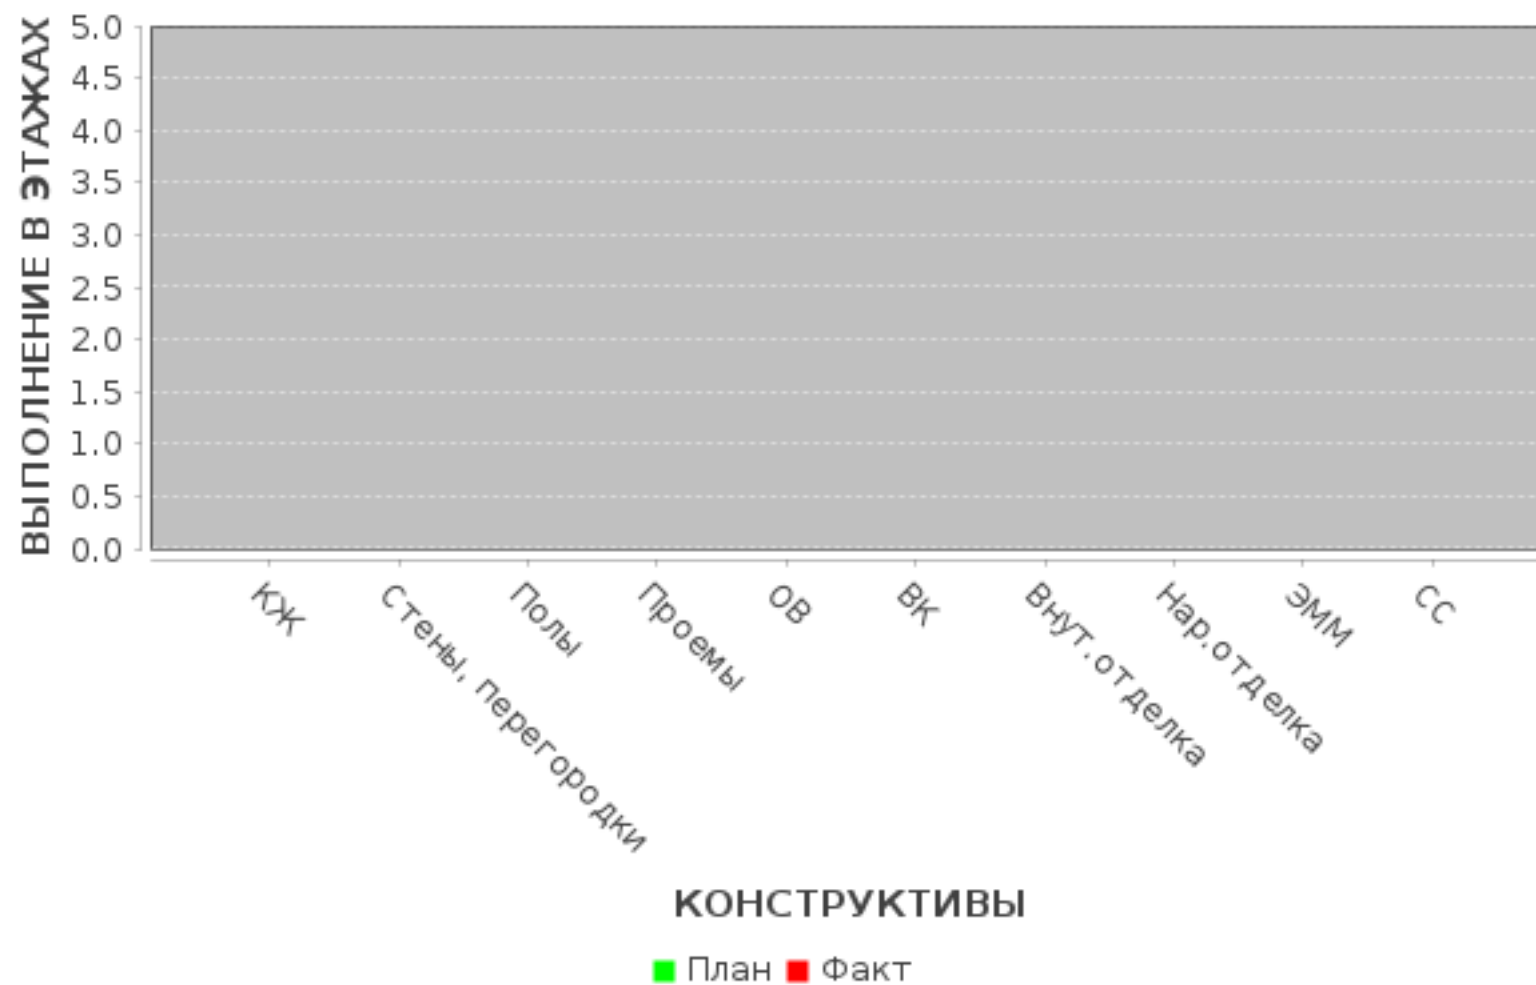

Фотофиксация за отчетный период

11 июля 2025 г., 11:09:50
Кустанай
Казахстан
Береке 21



11 июля 2025 г., 11:07:54
Кустанай
Казахстан
Береке 21



11 июля 2025 г., 11:09:48
Кустанай
Казахстан
Береке 21



11 июля 2025 г., 11:09:06
Кустанай
Казахстан
Береке 21



11 июля 2025 г., 11:08:59
Кустанай
Казахстан
Береке 21



Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	11.07.2025 09:06	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отправка отчета
2	11.07.2025 09:07	ТОКАРЕВА ИННА null	Отчет подписан
3	11.07.2025 09:18	ЕСЛЯМ ЖАНАТ null	Отчет подписан
4	11.07.2025 09:41	ШРЕМФ МАКСИМ null	Отчет подписан
5	11.07.2025 12:32	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отчет подписан
6	11.07.2025 12:34	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отчет подписан
7	11.07.2025 12:44	ҚАЙЫРДЕН ЕЛАМАН null	Отчет согласован
8	15.07.2025 06:50	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отказ в согласовании
9	21.07.2025 11:14	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отправка отчета
10	21.07.2025 11:15	ЕСЛЯМ ЖАНАТ null	Отчет подписан
11	21.07.2025 11:15	ТОКАРЕВА ИННА null	Отчет подписан
12	21.07.2025 12:18	ШРЕМФ МАКСИМ null	Отчет подписан
13	22.07.2025 04:33	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отчет подписан
14	22.07.2025 04:34	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отчет подписан
15	23.07.2025 07:06	ҚАЙЫРДЕН ЕЛАМАН null	Отчет согласован
16	25.07.2025 13:22	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
17	25.07.2025 13:23	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
