



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне Береке в городе Костанай,
Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Код: ДПГ-24-10-048-170 от 06.05.2024 г.

Отчетный период: 202506

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.06.2025 года по 30.06.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО Технадзор Строй и К , БИН 160740001609

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», "БК-Береке-18"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: ДПГ-24-10-048-170 от 06.05.2024 г./202506

Информация по проекту: Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне Береке в городе Костанай, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2024-05-06 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2025-06-02 года

Нормативный срок строительства: 9 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: СНКП-0159/23 от 2023-06-28 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	240140030559 - "БК-Береке-18"	Устав	№ ДПГ-24-10-048/170, от 06.05.2024 года	Ким О.Р.	Директор	+77015133390, bk-invest18@bk.ru
2	Генеральный подрядчик	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»	ГСЛ №180211006 от 22.11.2018 года	№09-02/05022, от 16.02.2024 года	Ким И.Р.	Директор	+77142286442, bk_stroy@mail.ru
3	Авторский надзор	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»	ГСЛ №21020433 от 15.06.21 года II категория	№09-02/05023, от 16.02.2024 года	Габдуллин А.Ж.	Главный инженер	+77015012964, bk_stroy@mail.ru
4	Инжиниринговая компания	160740001609 - ТОО Технадзор Строй и К	Свидетельство об аккредитации №KZ86VWC00199352	№09-01/01244, от 16.02.2024 года	Шаимов И.Б.	Директор	+77013182050, tehnadzork211291@mail.ru
5	Генеральный проектировщик	031040001233 - БК-СТРОЙ	ГСЛ №18010959 от 31.05.18 года	№01-01-02, от 16.02.2024 года	Ким И.Р.	Директор	+77142286442, bk_stroy@mail.ru

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Площадка строительства объекта расположена в городе Костанай микрорайон Береке.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Рабочим проектом предусмотрено строительство здания жилого дома № 18 который входит в состав жилого комплекса.

Класс функциональной пожарной опасности жилого здания – Ф1.3.

Класс жилья – IV.

Многоквартирный жилой дом – четырех подъездное пятиэтажное здание с подвальным этажом и четырехскатной кровлей в блоке А, В и плоской кровлей с техэтажом в блоке Б, «Г» образной формой в плане, с размерами в осях 50,70х77,23 м. Состоит пятиэтажных жилых секций А, Б, В. При этом секция В состоит из трех подъездов..

Высота жилого этажа в чистоте – 2,7 м. Высота подвала в чистоте – 2,76 м. Высота чердака в чистоте - 1,8 м.

Планировка квартир выполнена рационально, без проходных комнат. У каждой квартиры есть лоджия. Продолжительность освещения квартир соответствует СП РК 2.104-43-2012 «Естественное и искусственное освещение».

Класс жилья – IV, согласно таблице 1 СП РК 3.02-101-2012 «Здания жилые многоквартирные».

В рабочем проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению среды жизнедеятельности, с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения, согласно СП РК 3.06-101-2012. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы до планировочной отметки для входа в жилой дом с уровня асфальтового покрытия.

Для вертикальной связи между этажами рабочим проектом предусмотрены лестницы типа Л-1.

Эвакуация людей из помещений осуществляется:

- для помещений первого этажа – через тамбур непосредственно наружу;
- для помещений вышележащих этажей - из лестничной клетки на первый этаж через тамбур непосредственно наружу.

Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку, далее по металлическим стремянкам через люки на чердак, а с чердака через слуховые окна на кровлю.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающимися створками в наружных стенах.

Шумоизоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетами и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Во внутренней отделке помещений, с учетом их назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, используются современные отделочные материалы: стены и перегородки – окраска водоэмульсионной краской за 2 раза, кафельная плитка, фактурная штукатурка;

потолок – окраска водоэмульсионной краской, натяжной потолок;

двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88, алюминиевые по ГОСТ 22233-2001, металлопластиковые по ГОСТ 30970-2014;

входные двери в квартиры – стальные по ГОСТ 31173-2003;

полы – цементно-песчаная стяжка с железнением, покраска напольной краской, плитка керамическая, керамогранитная плитка, ламинат.

цоколь – бетонный камень с покраской фасадной краской;

стены – облицовочный керамический кирпич, алюминиевые кассеты на под конструкции, профлист с полимерным покрытием на под конструкции;

окна, балконные двери - металлопластиковые с однокамерными стеклопакетами с энергосберегающим остеклением по ГОСТ 24866-99;

витражи – алюминиевые с однокамерными стеклопакетами с энергосберегающим остеклением по ГОСТ 21519-2003;

наружные входные двери в здание - стальные, утепленные по ГОСТ 31173-2003;

балконные двери - металлопластиковые профили с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-99;

двери, люки – металлические ГОСТ 31173-2003, СТРК-2110-2011;

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1
Этажность зданий	этаж	5
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II (нормальный)
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	2,7
Площадь застройки здания	квадратный метр	2046,75
Общая площадь здания	квадратный метр	10974,61
Общая площадь квартир	квадратный метр	6795,68
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	
Строительный объем здания	кубический метр	41941,31
Количество квартир	шт.	120
в том числе: однокомнатные	шт.	45
в том числе: двухкомнатные	шт.	40
в том числе: трехкомнатные	шт.	31
в том числе: четырехкомнатные	шт.	4
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	2341,382
в том числе: СМР	миллион тенге	2039,908
в том числе: оборудование	миллион тенге	24,450
в том числе: прочие	миллион тенге	277,024

5. Анализ исходно–разрешительной документации

Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 22.05.2023 г.;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) «Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне Береке в городе Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)», № KZ72VUA00482522 от 02.08.2021 г., выдано ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай»;

акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок с кадастровым номером 12-193-030-4083, площадью 0,3586 га для строительства многоквартирного жилого дома;

договор об аренде земельного участка № 02-15/4204 от 26.10.2020 года;

эскизный проект «Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне Береке города Костанай, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» разработан в 2022 году ТОО «USMANOV Architects (Усманов Архитектс)»;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте «Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне «Береке» в г. Костанай», выполненный в 2023 году ТОО «Группа компаний «АСП»» (государственная лицензия № 20009373 от 30.06.2020 года);

технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный в 2023 г. ТОО «Проектная студия «Доминанта» (государственная лицензия № 12011698 от 24.08.2012 года);

раздел ООС «Строительство многоквартирного жилого дома № 18 по ГП в микрорайоне Береке города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» выполнен ТОО «Проектная студия «Доминанта» в 2023 году (государственная лицензия 04.03.2016 года № 02385Р);

протокол радиометрического контроля № 205 от 23 августа 2021 года, ТОО «KazAtom» (лицензия № 17018625);

протокол дозиметрического контроля № 205 от 23 августа 2021 года, ТОО «KazAtom» (лицензия № 17018625);

мотивированный отказ ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области» № KZ39VDC00097145 от 27.06.2023 года.

Письма:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай» № 4-5/5708 от 21 ноября 2022 года о зеленых насаждениях;

письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 14.11.2022 года № ЗТ-2022-02662504 о сибиреязвенных захоронениях;

письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай» № 612 от 29.05.2023 г. о

благоустройстве;

письмо-заявка Заказчика о проведении вневедомственной экспертизы, о начале строительства, о финансировании строительства № 12-01-40 от 10 января 2023 года;

письмо Заказчика о финансировании строительства № 12-01-24 от 10 января 2023 года;

письмо Заказчика №12-01-23 от 10 января 2023 года о вывозе грунта;

Технические условия:

технические условия на водоснабжение № 947 от 11.04.2023 года, выданы ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;

технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям № 4017-1312-405к от 13.12.2021 года, выданы Костанайским производственным филиалом АО «ҚазТранГаз Аймақ»;

технические условия на присоединение к тепловым сетям № 566 от 24.05.2023 года, выданы ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»;

технические условия на постоянное электроснабжение № 3-3/775 от 17.04.2023 года, выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;

технические условия на телефонизацию № Д10-40-04/23 от 07.04.2023 г., выданы АО «Казактелеком».

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

- 1.1. Акты выполненных работ и оказанных услуг за период с начала строительства
- 1.2. Журнал технического надзора для ознакомления
- 1.3. Журнал авторского для ознакомления
- 1.4. Журнал ОТиТБ для ознакомления
- 1.5. Журнал производства работ для ознакомления
- 1.6. Журнал входного контроля материалов для ознакомления
- 1.7. Журнал бетонных работ для ознакомления
- 1.8. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
- 1.9. Журнал монтажа строительных конструкций
- 1.10 Журнал сварочных работ
- 1.11 Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
- 1.12 Акты скрытых работ

7. Анализ проектной документации

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

В рабочем проекте учтены современные требования по оптимальности объемнопланировочных, конструктивных и других проектных решений.

При разработке проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2022 г. № КР ДСМ52 «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственнопитьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», гигиенических нормативов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 г. № КР ДСМ-71 «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности», санитарных правил, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от санитарных правил, утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № КР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной, пожарной безопасности и функциональному назначению объекта.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период: за отчетный период выполнялись по ГПР .

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

*С нарастающим итогом план по СМР на конец отчётного периода составляет –100%.

Фактическое выполнение СМР на конец отчётного периода составляет –100%.

**Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода –100%.

Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода –100%.

3) Соблюдение графика производства работ: по июнь

2025г. по ГПР.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	0.00	0.00	0.00	12.71	12.71	0.00
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	0.00	0.00	0.00	68.46	68.46	0.00
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	6.19	6.19	0.00
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	4.77	4.77	0.00
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	6.22	6.22	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Газоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00
10	Всего (только СМР)	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
11	Прочее	0.00	0.00	0.00	1.25	0.61	-0.64

12	Всего (СМР + Прочее)	0.00	0.00	0.00	100.00	99.36	-0.64
----	----------------------	------	------	------	--------	-------	-------

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	0	
Архитектурно-строительные решения (АР)	0	
Отопление вентиляция	0	
Водопровод канализация	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	
Лифты	0	
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
Газоснабжение	0	
Прочее	0	
Итого, за отчетный месяц	0	
Итого, с нарастающим	0	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

Предписаний на объекте нет

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации поустранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии,риски неисполнения рекомендаций

- Качество СМР удовлетворительное
- Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Согласно доп. соглашения к ДПГ в связи с не завершением строительства по благоустройству срок действия ДПГ продлен до 02.09.25г. (3 м-ц*2 раза)

11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений в проекте нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	13 114 550.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	186 670.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	2 312 081 430.28			100 000 000.00	1 909 253 427.00	0.00	2 312 081 430.28	1 909 253 427.00	2 312 081 430.28
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	231 208 143.03			0.00	231 208 143.03	0.00	231 208 143.03	231 208 143.03	231 208 143.03
4	Авторский надзор	1 000 000.96			0.00	0.00	0.00	1 000 000.96	0.00	1 000 000.96
5	Технический надзор	15 000 000.96			1 325 545.00	13 901 146.33	0.00	13 392 852.00	13 901 146.33	13 392 852.00
	Всего СМР	2 341 382 653.00	0.00	0.00	101 325 545.00	1 923 154 573.33	0.00	2 326 474 283.24	1 923 154 573.33	2 326 474 283.24
6	Иное	70 241 479.59			1 182 593.00	10 034 619.61	1 182 593.00	10 034 619.62	10 034 619.61	10 034 619.62
	Всего СМР и Иное	2 411 624 132.59	0.00	0.00	102 508 138.00	1 933 189 192.94	1 182 593.00	2 336 508 902.86	1 933 189 192.94	2 336 508 902.86

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	0.00	53 033 563.96
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	0.00	52 229 991.96
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	803 572.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	133 477 074.00	2 125 136 274.00
	ВСЕГО	133 477 074.00	2 178 169 837.96

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	106	6 019.57	2 305 039 835.00	2 122 936 274.00
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	2	0.00	2 200 000.00	2 200 000.00
	Всего	108	6 019.57	2 307 239 835.00	2 125 136 274.00

Примечание

Всего заключено 108 ДДУ, в т.ч. 106 квартир, 2 НП : распределение по способам продаж:
 через АО "Отбасы Банк" всего ДДУ- 82 квартир,
 прямые продажи 26 ДДУ, в т.т 24 квартиры , 2 НП.

Вывод: 97,57% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	2 312 081 430.28	2 312 081 430.28	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	1 000 000.96	1 000 000.96	0.00
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	14 999 994.96	15 000 000.96	6.00
	в т.ч. ДИУ	13 392 852.00	13 392 858.00	6.00
	НОК	1 607 142.96	1 607 142.96	0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 341 382 653.00	0.00	101 325 545.00	101 325 545.00	2 341 382 653.00	1 923 154 573.33	-418 228 079.67

13. Заключение

качество СМР удовлетворительное;

- изменений в проектной документации с момента получения гарантии нет;
- основной источник финансирования включает в себя поступления от дольщиков - хороший;

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

По стоимости строительно-монтажных работ – работы велись в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. В отчетном периоде СМР по строительству объекта выполнялись работы АР (стены, полы, кровля, наружная отделка), ЭММ, СС, Лифты, сантехнические работы (ВК, ОВ, Газ,).

На строительной площадке задействовано 41 рабочих..

На постоянной основе проводятся мероприятия по контролю качества работ по наружной кладке стен, монтажу перекрытий, перемычек и др. Отставание по объекту нет.

Согласно доп. соглашения к ДПГ в связи с не завершением строительства по благоустройству срок действия ДПГ продлен до 02.09.25г. (3 м-ц*2 раза) , проект на регистрации акта ввода.

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

По т.7 100% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	911221450909 - ТОКАРЕВА ИННА ВАДИМОВНА		NEW	
2	HEAD	920315351376 - ШАИМОВ ИЛЪЯС БАЯНОВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	551124350186 - СИМАЧКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ		NEW	
4	TECHNICAL_SUPERVISION	551005350357 - ТЕЛЕГИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ		NEW	
5	TECHNICAL_SUPERVISION	850424350296 - МАШИКОВ РИНАТ ТОЛКИНОВИЧ		NEW	



























Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

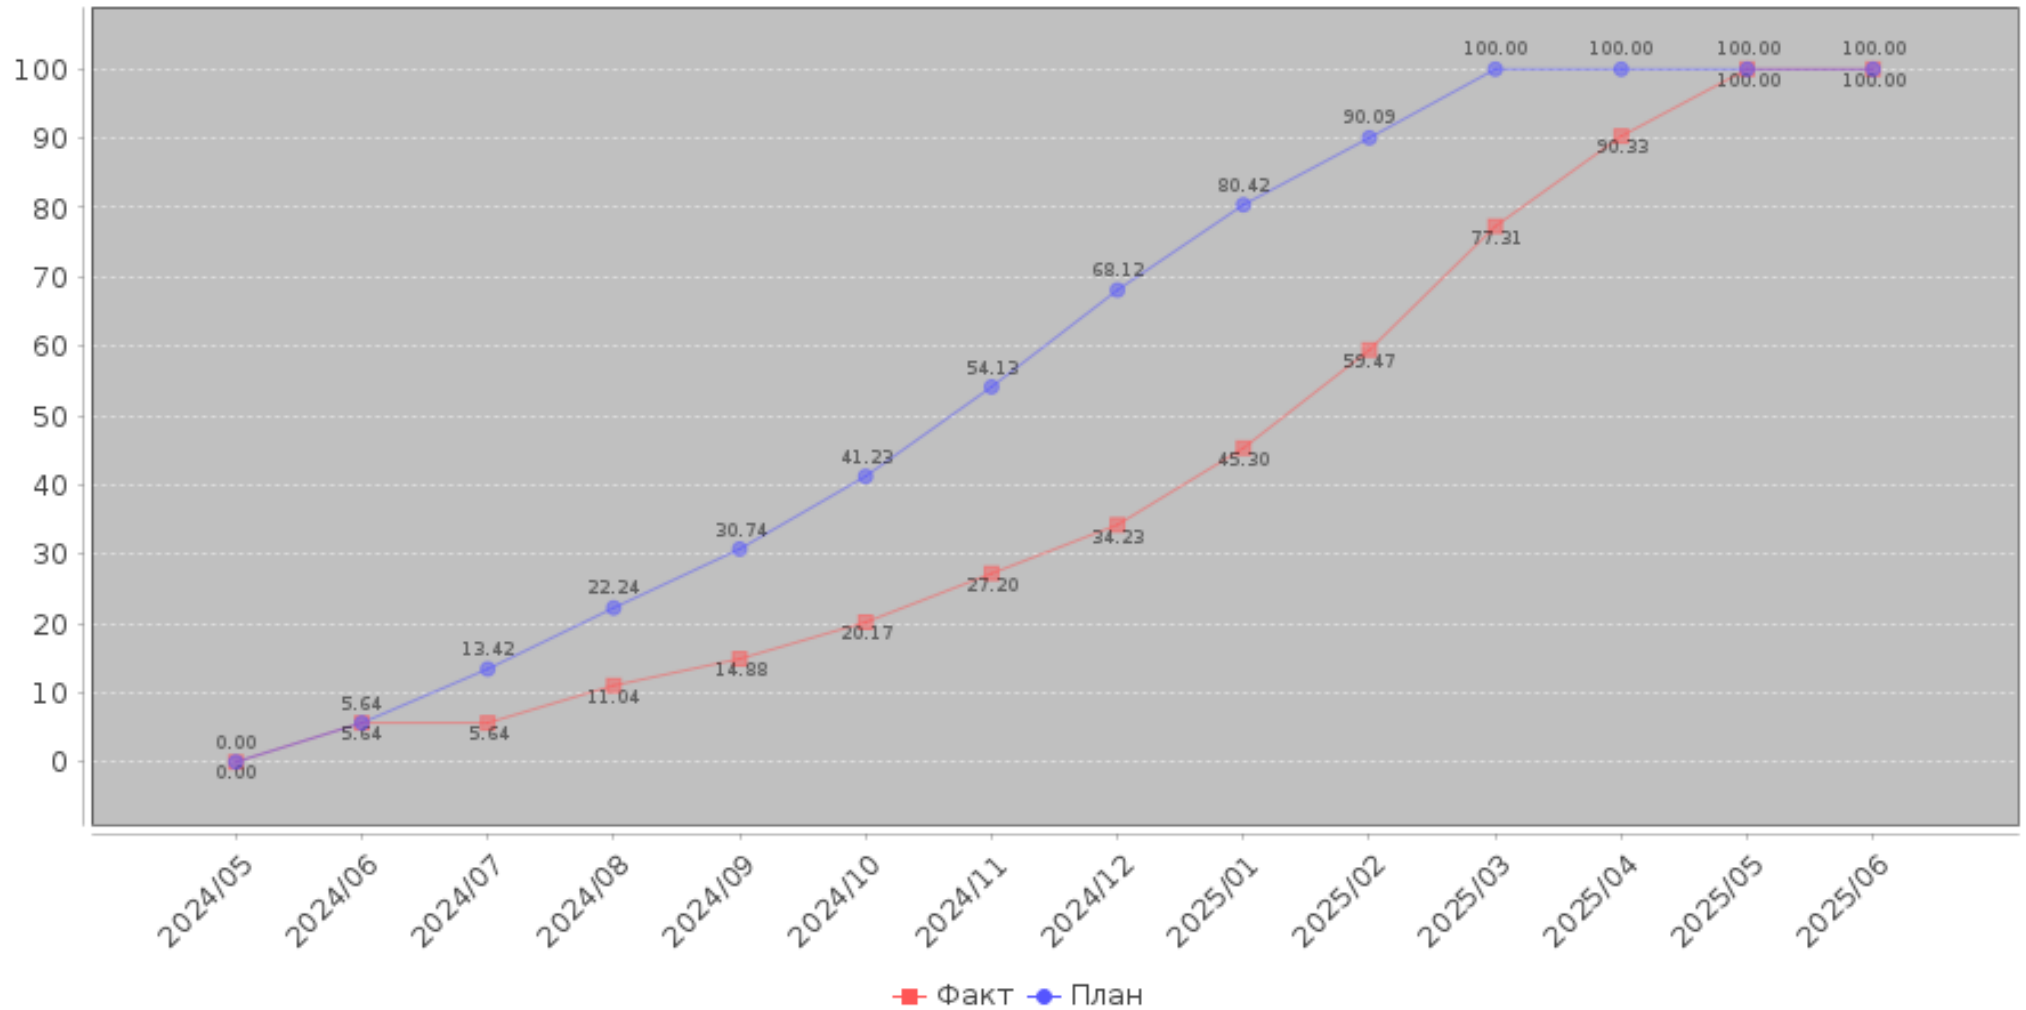



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК




Фотофиксация за отчетный период


11 июля 2025 г., 10:50:29
Кустанай
Казахстан
Береке 18




11 июля 2025 г., 10:52:51
Кустанай
Казахстан
Береке 18

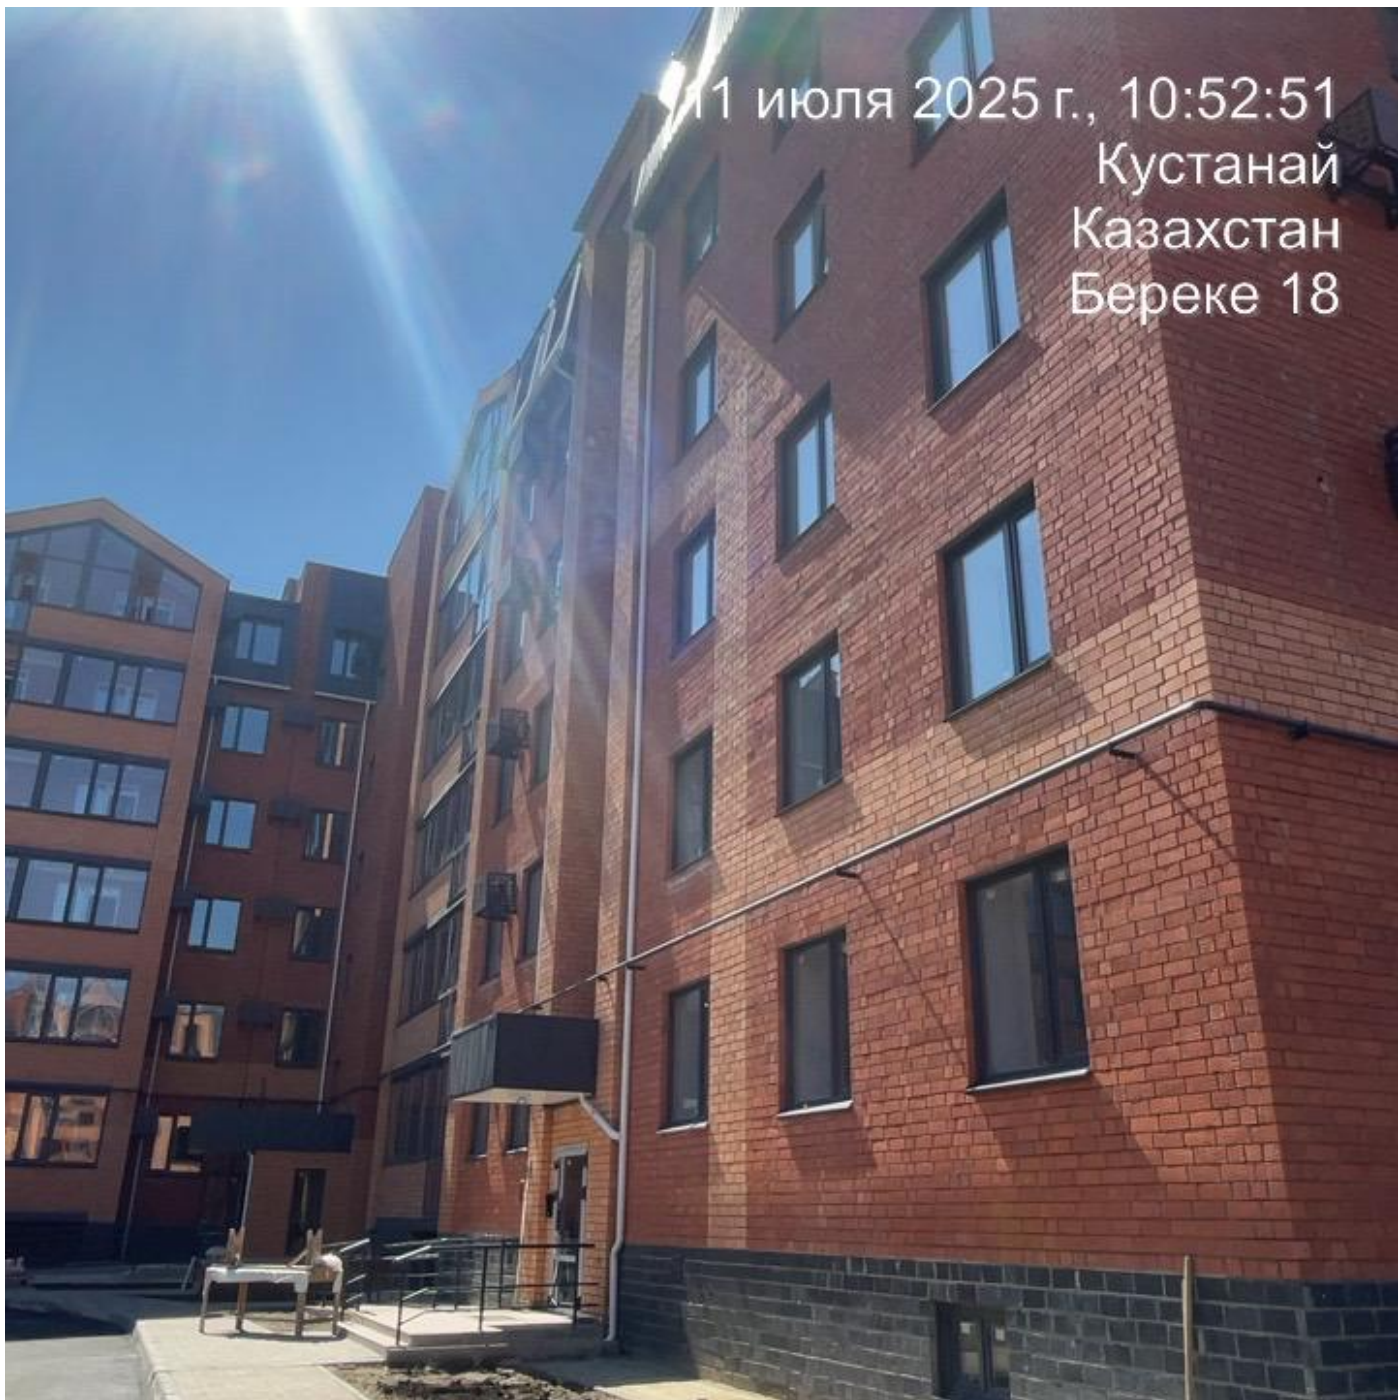

11 июля 2025 г., 10:51:53
Кустанай
Казахстан
Береке 18

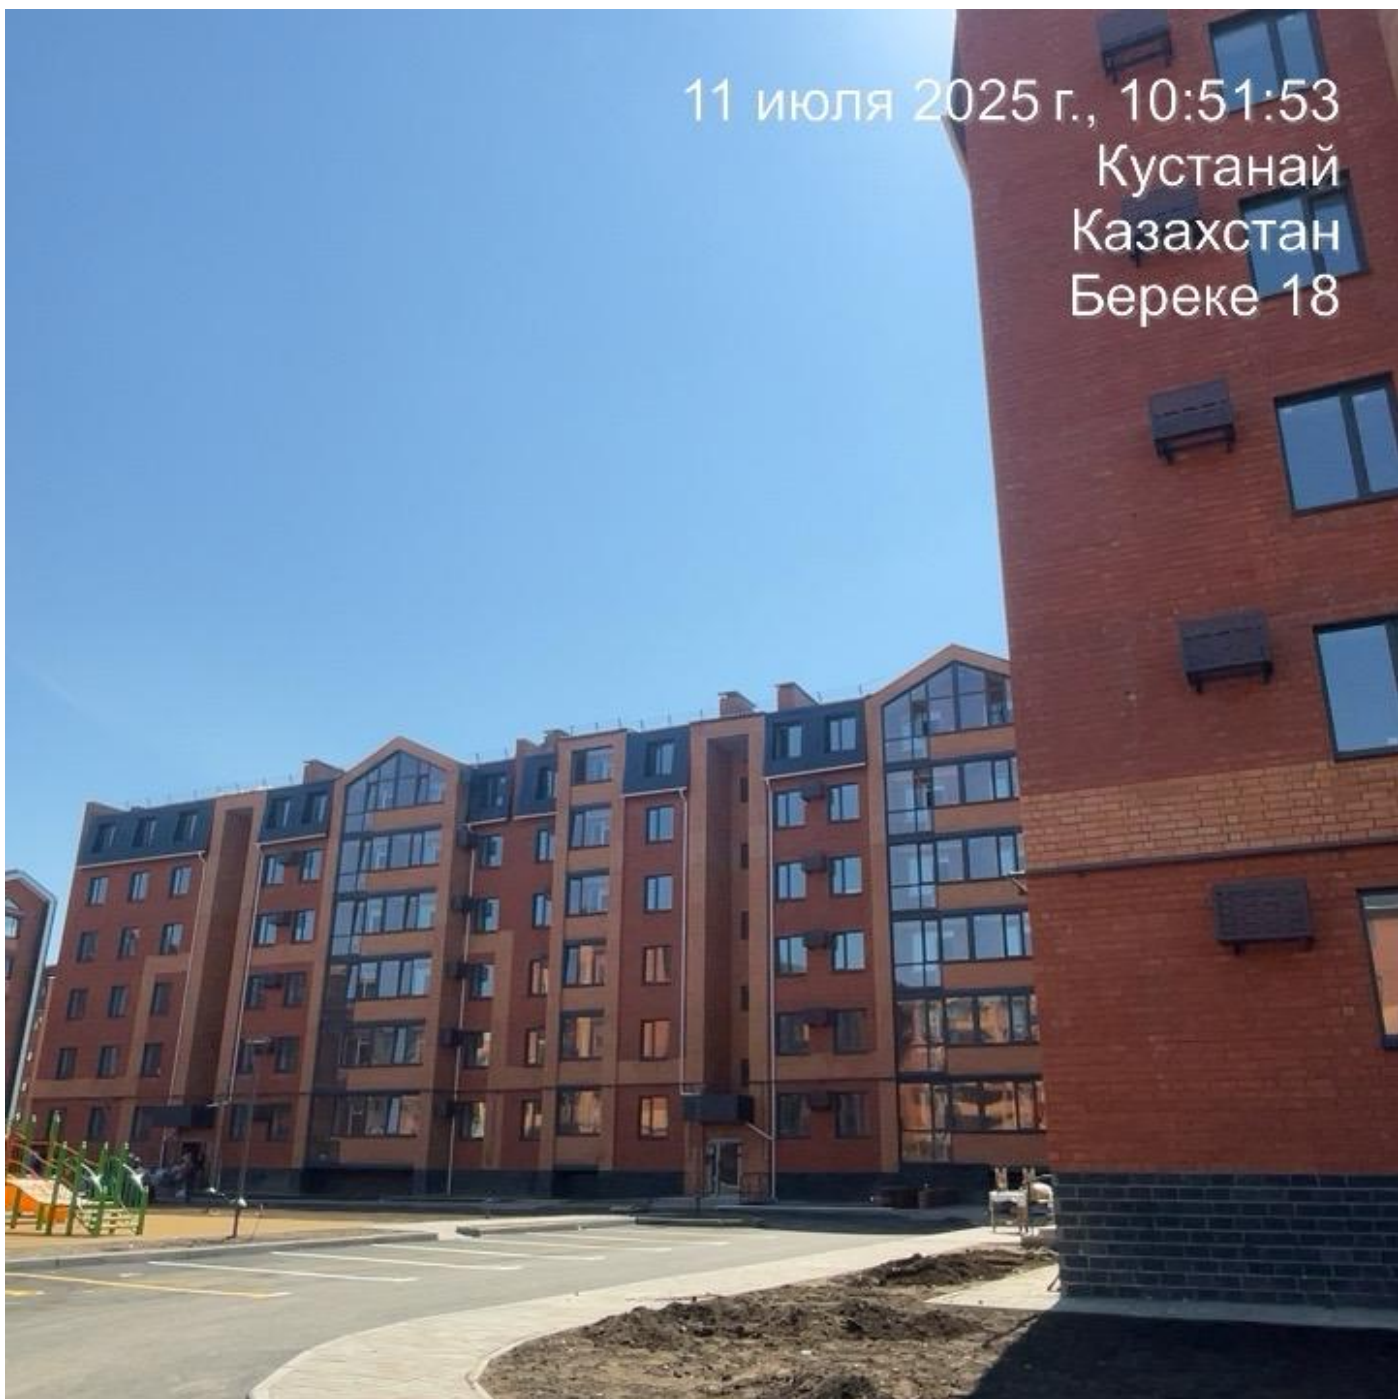

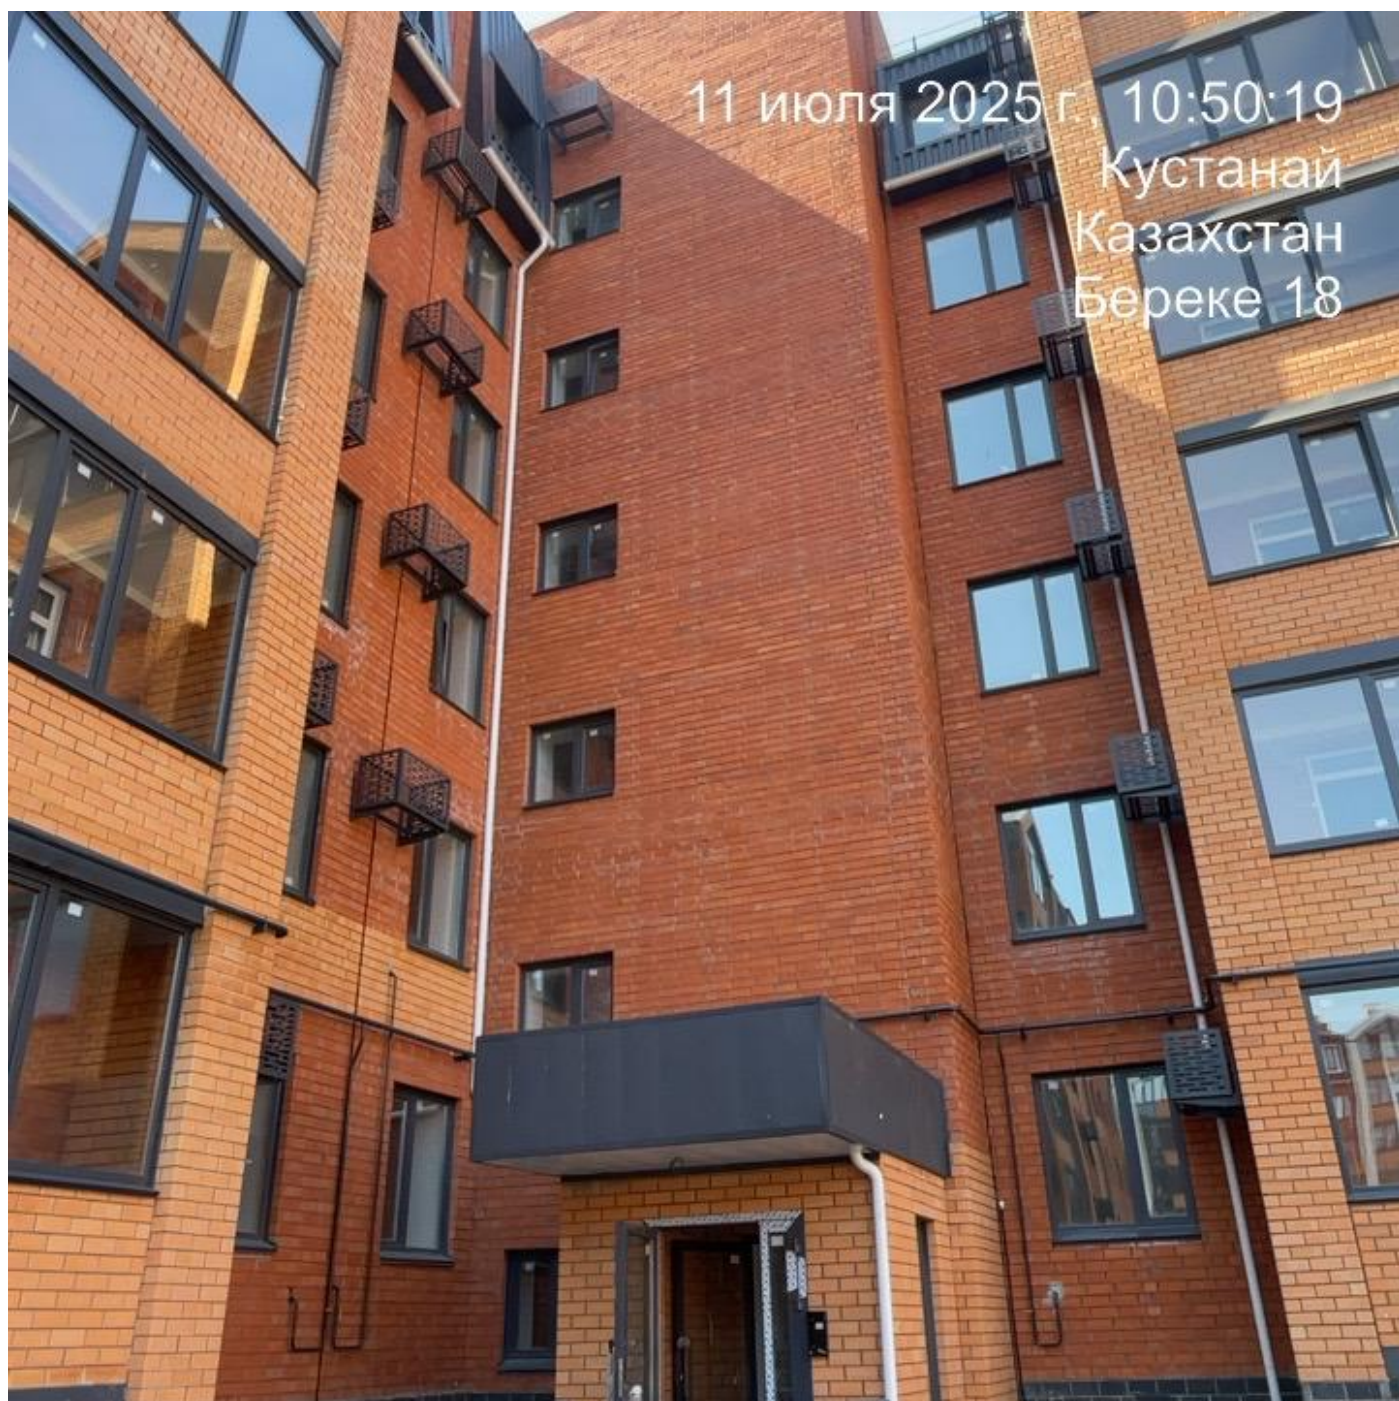

11 июля 2025 г. 10:50:19
Кустанай
Казахстан
Береке 18

11 июля 2025 г., 10:48:45
Кустанай
Казахстан
Береке 18



Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	11.07.2025 08:54	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отправка отчета
2	11.07.2025 09:07	ТОКАРЕВА ИННА null	Отчет подписан
3	11.07.2025 09:20	СИМАЧКОВ АЛЕКСЕЙ null	Отчет подписан
4	11.07.2025 09:21	ТЕЛЕГИН ГЕННАДИЙ null	Отчет подписан
5	12.07.2025 17:00	МАШИКОВ РИНАТ null	Отчет подписан
6	14.07.2025 04:18	ШАИМОВ ИЛЬЯС null	Отчет подписан
7	14.07.2025 05:25	ҚАЙЫРДЕН ЕЛАМАН null	Отчет согласован
8	18.07.2025 12:05	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
9	18.07.2025 12:05	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
