



Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого дома (жилого здания)

Строительство многоквартирного жилого дома №19 по ГП в микрорайоне Береке города Костанай
Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Код: (номер сертификата 250) ДПГ 24-10-048/179

Отчетный период: 202508

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.08.2025 года по 31.08.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "Технадзор-Строй и К", БИН 160740001609

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "БК-Береке 19"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: (номер сертификата 250) ДПГ 24-10-048/179/202508

Информация по проекту: Строительство многоквартирного жилого дома №19 по ГП в микрорайоне Береке города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2024-12-06 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2026-09-29 года

Нормативный срок строительства: 23 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: СНКП-0189/24 от 2024-07-14 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	240940029910 - ТОО "БК-Береке 19"	Устав	ДИУ-24-10-021/031, от 25.12.2024 года	Ким О.Р.	Директор	null, bk-invest18@bk.ru
2	Генеральный подрядчик	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»	ГСЛ №180211006 от 22.11.2018 года	№09-02/05584, от 13.10.2024 года			+77142286442, bk_stroy@mail.ru
3	Авторский надзор	031040001233 - ТОО «БК-СТРОЙ»	ГСЛ №21020433 от 15.06.21 года II категория	09-02/05585, от 13.10.2024 года	Габдуллин А.Ж.	Главный инженер	+77142286442, bk_stroy@mail.ru
4	Инжиниринговая компания	160740001609 - ТОО "Технадзор-Строй и К"	Свидетельство об аккредитации №KZ86VWC00199352	ДИУ-24-10-021/031, от 25.12.2024 года	Шаимов И.Б.	Директор	+77013182050, tehnadzork211291@mail.ru
5	Генеральный проектировщик	031040001233 - ТОО "БК-СТРОЙ"	ГСЛ №18010959 от 31.05.18 года	01-01-01, от 14.10.2024 года			+77142286442, bk_stroy@mail.ru

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)



Площадка строительства объекта расположена в городе Костанай микрорайон Береке.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Многоквартирный жилой дом – четырех подъездное пятиэтажное здание с подвальным этажом и четырехскатной кровлей в блоке А, В и плоской кровлей с техэтажом в блоке Б, «Г» образной формой в плане, с размерами в осях 50,70х77,23 м. Состоит пятиэтажных жилых секций А, Б, В. При этом секция В состоит из двух подъездов, в то время как остальные из одного.

В подвале располагаются электрощитовая, тепловой узел и технические помещения с проложенными коммуникация для дома. Подвал имеет обособленные, рассредоточенные выходы наружу и окна (продухи), и аварийные двери в прямках.

На первом этаже предусмотрены: лестницы, тамбура и жилые квартиры.

На втором-пятом этаже предусмотрены лестницы, коридор, холл и жилые квартиры.

Высота жилых этажей - 2,70 м (от пола до потолка).

Высота помещения чердачного этажа – 2,71 м (от пола до стропил под коньком).

Высота подвального этажа – 2,80 м (от пола до потолка)

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1
Этажность зданий	этаж	5
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	2,70
Площадь застройки здания	квадратный метр	2046,75
Общая площадь здания	квадратный метр	10974,61
Общая площадь квартир	квадратный метр	6795,68
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	
Строительный объем здания	кубический метр	41941,31
Количество квартир	шт.	120
в том числе: однокомнатные	шт.	45
в том числе: двухкомнатные	шт.	40
в том числе: трехкомнатные	шт.	31
в том числе: четырехкомнатные	шт.	4
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	2 296. 363
в том числе: СМР	миллион тенге	2000.455
в том числе: оборудование	миллион тенге	22.432
в том числе: прочие	миллион тенге	273.476

5. Анализ исходно–разрешительной документации

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 31.05.2024 года;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) № KZ42VUA00482577 от 02.08.2021 г.,
выдано ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Костанай»;
акт на право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный
участок с кадастровым номером 12-193-030-4084, площадью 0,3803 га для строительства
многоквартирного жилого дома;
договор об аренде земельного участка № 02-15/4205 от 26.10.2020 г.;
эскизный проект «Строительство многоквартирного жилого дома №19 по ГП в
микрорайоне Береке города Костанай, Костанайской области (без наружных инженерных
сетей и благоустройства)» разработан в 2022 году ТОО «USMANOV Architects (Усманов
Архитектс)»;
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте
«Строительство многоквартирного жилого дома № 19 по ГП в микрорайоне «Береке» в г.
Костанай», выполненный в 2022 году ТОО «Группа компаний «АСП»»
(государственная лицензия № 20009373 от 30.06.2020 года);
технический отчет по топографо-геодезическим изысканиям, выполненный 05.05.2023
г. ТОО «Проектная студия «Доминанта» (государственная лицензия №12011698 от
24.08.2012 года);
раздел ООС «Строительство многоквартирного жилого дома №19 по ГП в
микрорайоне Береке города Костанай, Костанайской области (без наружных инженерных
сетей и благоустройства)» выполнен ТОО «Проектная студия «Доминанта» в 2023 году
(государственная лицензия 04.03.2016 года № 02385Р);
протокол радиометрического контроля № 207 от 23 августа 2021 года, ТОО
«KazAtom» (лицензия № 17018625);
протокол дозиметрического контроля № 207 от 23 августа 2021 года, ТОО «KazAtom»
(лицензия № 17018625);
заключение (Положительное) № СНКП-0171/23 от 11.08.2023 г. по рабочему проекту
«Строительство многоквартирного жилого дома №19 по ГП в микрорайоне Береке города
Костанай, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)»,
выданное ТОО «СНК-Проект».

Письма:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог акимата города Костанай» № 4-5/5708 от 21 ноября 2022 года о
зеленых насаждениях;
письмо ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области» от 14.11.2022
года № ЗТ-2022-02662504 о сибиреязвенных захоронениях;
письмо ГУ «Отдел строительства акимата города Костанай» № 612 от 29.05.2023 г. о
благоустройстве;
письмо Заказчика о затратах на авторский и технический надзор и проектные работы;

письмо Заказчика о начале строительства;

письмо Заказчика №12-01-32 от 10 января 2023 года о вывозе грунта и строительного мусора;

письмо Заказчика №12-01-33 от 10 января 2023 года о финансировании.

Технические условия:

технические условия на водоснабжение № 946 от 11.04.2023 года, выданы ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;

технические условия на проектирование и подключение к газораспределительным сетям № 4017-1312-401к от 13.12.2021 года, выданы Костанайским производственным филиалом АО «ҚазТранГаз Аймақ»;

технические условия на присоединение к тепловым сетям № 569 от 24.05.2023 года, выданы ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»;

технические условия на постоянное электроснабжение № 3-3/776 от 17.04.2023 года, выданы ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»;

технические условия на телефонизацию № Д10-40-04/23 от 07.04.2023 г., выданы АО «Казактелеком».

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

- 1.1. Акты выполненных работ и оказанных услуг за период с начала строительства
- 1.2. Журнал технического надзора для ознакомления
- 1.3. Журнал авторского для ознакомления
- 1.4. Журнал ОТиТБ для ознакомления
- 1.5. Журнал производства работ для ознакомления
- 1.6. Журнал входного контроля материалов для ознакомления
- 1.7. Журнал бетонных работ для ознакомления
- 1.8. Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений
- 1.9. Журнал монтажа строительных конструкций
- 1.10 Журнал сварочных работ
- 1.11 Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов
- 1.12 Акты скрытых работ

7. Анализ проектной документации

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Материалы инженерных изысканий содержат достаточные данные, необходимые для разработки проектной документации.

В рабочем проекте учтены современные требования по оптимальности объемнопланировочных, конструктивных и других проектных решений.

При разработке проекта учтены местные природно-климатические и геологические условия площадки строительства

Рабочий проект соответствует требованиям санитарных правил, утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2022 г. № КР ДСМ52 «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», санитарных правил, утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.02.2023 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к источникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственнопитьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», гигиенических нормативов, утверждённых приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 г. № КР ДСМ-71 «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности», санитарных правил, утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от санитарных правил, утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 г. № КР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

Принятые решения с учетом внесенных изменений по п. 7.1 соответствуют государственным нормативным требованиям по экологической, санитарной, пожарной безопасности и функциональному назначению объекта.

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период выполнялись: кирпичная кладка наружных и внутренних стен, армирование кладки, монолитные перемычки, перекрытия, перегородки, стяжка полов, монтаж оконных блоков, лестницы, внутренняя отделка стен, отопление и вентиляционные работы и прочее.

На строительной площадке задействовано 65 рабочих.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

*С нарастающим итогом план по СМР на конец отчетного периода составляет –37,09%

Фактическое выполнение СМР на конец отчетного периода составляет – 50,67%.

**Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода – 36,81%.

Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода – 50,28%.

3) Соблюдение графика производства работ: по август 2025г. опережение 87 дня. (имеется не значительное отставание АР (наружная отделка))

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	0.00	0.00	0.00	12.69	12.69	0.00
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	4.65	7.47	2.82	24.39	35.97	11.58
3	Отопление вентиляция	0.00	1.96	1.96	0.00	1.96	1.96
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	Газоснабжение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Всего (только СМР)	4.65	9.43	4.78	37.09	50.67	13.58
12	Прочее	0.04	0.06	0.03	0.22	0.29	0.07
13	Всего (СМР + Прочее)	4.63	9.37	4.74	36.81	50.28	13.47

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	0	
Архитектурно-строительные решения (АР)	19	
Отопление вентиляция	13	
Водопровод канализация	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	
Лифты	0	
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
Газоснабжение	0	
Слабые токи	0	
Прочее	0	
Итого, за отчетный месяц	32	
Итого, с нарастающим	87	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	0	0	0	0	0
3.1	Конструкции железобетонные	0	0	0	0	0
3.2	Общестроительные работы АР	0	0	0	0	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0
3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	0	0	0	0	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

предписаний нет

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений в последствии, риски неисполнения рекомендаций

Качество СМР удовлетворительное

- Изменения в проектной документации с момента получения гарантии - нет

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется. Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период выполнялись: кирпичная кладка наружных и внутренних стен, армирование кладки, монолитные перемычки, перекрытия, перегородки, стяжка полов, монтаж оконных блоков, лестницы, внутренняя отделка стен, отопление и вентиляционные работы и прочее. На строительной площадке задействовано 65 рабочих. Соблюдение графика производства работ: по август 2025г. опережение 87 дня. (имеется не значительное отставание АР (наружная отделка)

11. Сведения об изменениях на Объекте

изменений нет

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	14 542 550.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Экспертиза	186 670.40			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	СМР и оборудование	2 265 634 443.76	190 158 190.88	190 158 190.88	0.00	791 594 000.00	213 711 360.00	957 775 249.00	981 752 190.88	1 147 933 439.88
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	226 563 444.38			0.00	226 563 444.38	23 329 190.95	104 552 802.78	226 563 444.38	104 552 802.78
4	Авторский надзор	1 000 000.00			0.00	0.00	94 327.38	506 671.96	0.00	506 671.96
5	Технический надзор	15 000 000.00			0.00	0.00	1 379 059.72	6 180 435.48	0.00	6 180 435.48
	Всего СМР	2 296 363 665.00	190 158 190.88	190 158 190.88	0.00	791 594 000.00	215 184 747.10	964 462 356.44	981 752 190.88	1 154 620 547.32
6	Иное	183 709 093.20			1 552 267.00	9 839 527.16	1 552 267.00	9 839 527.16	9 839 527.16	9 839 527.16
	Всего СМР и Иное	2 480 072 758.20	190 158 190.88	190 158 190.88	1 552 267.00	801 433 527.16	216 737 014.10	974 301 883.60	991 591 718.04	1 164 460 074.48

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	-6 144.19	5 044 329.07
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	-6 144.19	4 642 543.35
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	401 785.72
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	21 066 310.00	1 977 134 914.64
	ВСЕГО	21 060 165.81	1 982 179 243.71

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	109	5 683.26	2 369 363 064.00	1 977 134 914.64
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	109	5 683.26	2 369 363 064.00	1 977 134 914.64

Примечание

Всего заключено 109 ДДУ, в т.ч. распределение по способам продаж:

через АО "Отбасы Банк" всего ДДУ- 59 квартир,

39 квартир банк наличными,

11 квартир халык, бцк

Вывод: 99,75% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	2 265 634 443.76	2 265 634 443.76	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00
	в т.ч. ДИУ	13 392 857.14	13 392 857.14	0.00
	НОК	1 607 142.86	1 607 142.86	0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2 296 363 665.00	94 751 777.30	0.00	-94 751 777.30	1 000 852 106.91	981 752 190.88	-19 099 916.03

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом

о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и

требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству)

- качество СМР удовлетворительное;
- изменений в проектной документации с момента получения гарантии нет;
- основной источник финансирования включает в себя поступления от дольщиков;
- по ГПР опережение 87 дня. (имеется незначительное отставание АР (наружная отделка)

Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период выполнялись: кирпичная кладка наружных и внутренних стен, армирование кладки, монолитные перемычки, перекрытия, перегородки, стяжка полов, монтаж оконных блоков, лестницы, внутренняя отделка стен, отопление и вентиляционные работы и прочее. На строительной площадке задействовано 65 рабочих. Соблюдение графика производства работ: по август 2025г. опережение 87 дня. (имеется незначительное отставание АР (наружная отделка)

По т.7 99,75% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	HEAD	920315351376 - ШАИМОВ ИЛЬЯС БАЯНОВИЧ		NEW	
2	INITIATOR	911221450909 - ТОКАРЕВА ИННА ВАДИМОВНА		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	941217350996 - ЕСЛЯМ ЖАНАТ ЕРБУЛАНҰЛЫ		NEW	
4	TECHNICAL_SUPERVISION	960625351804 - ЗЕРНИН АРТЕМ МАРЛЕНОВИЧ		NEW	
5	TECHNICAL_SUPERVISION	950111350671 - НАМ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ		NEW	




























Приложение к отчету инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

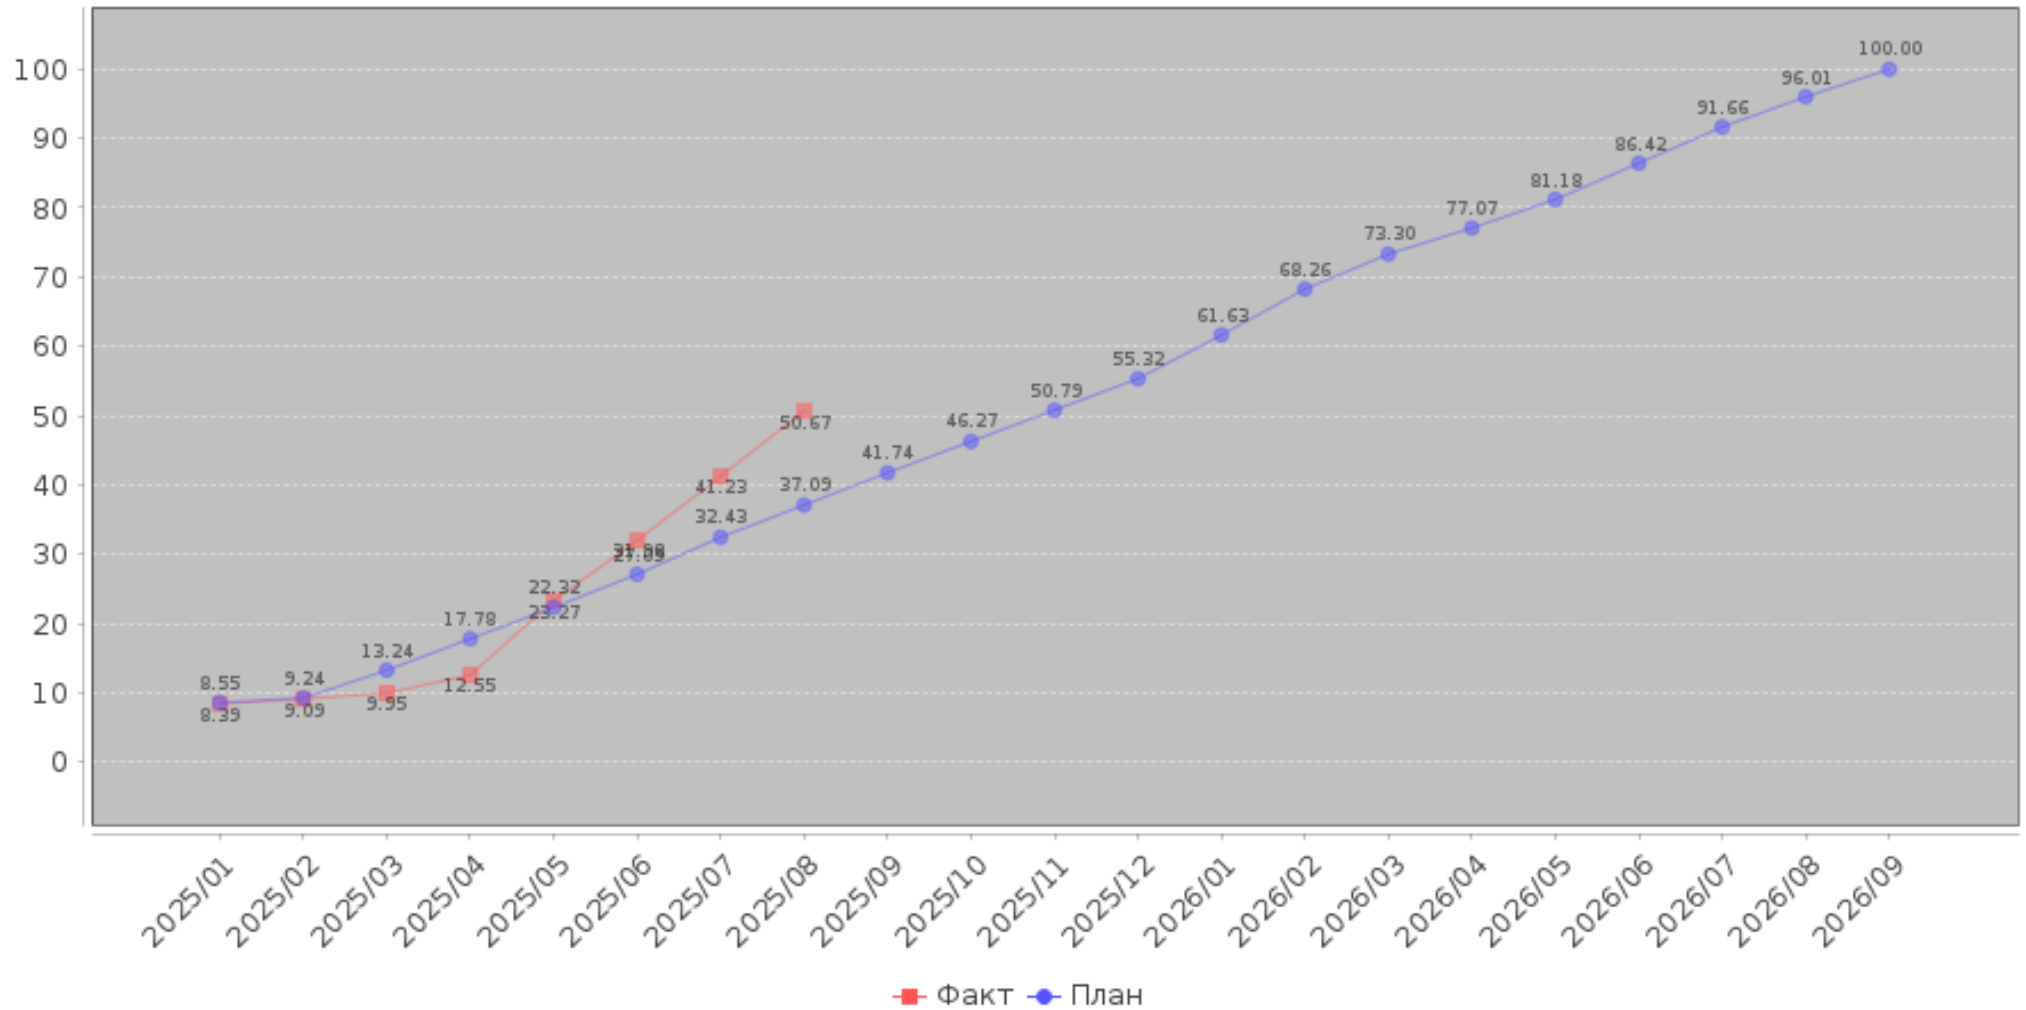

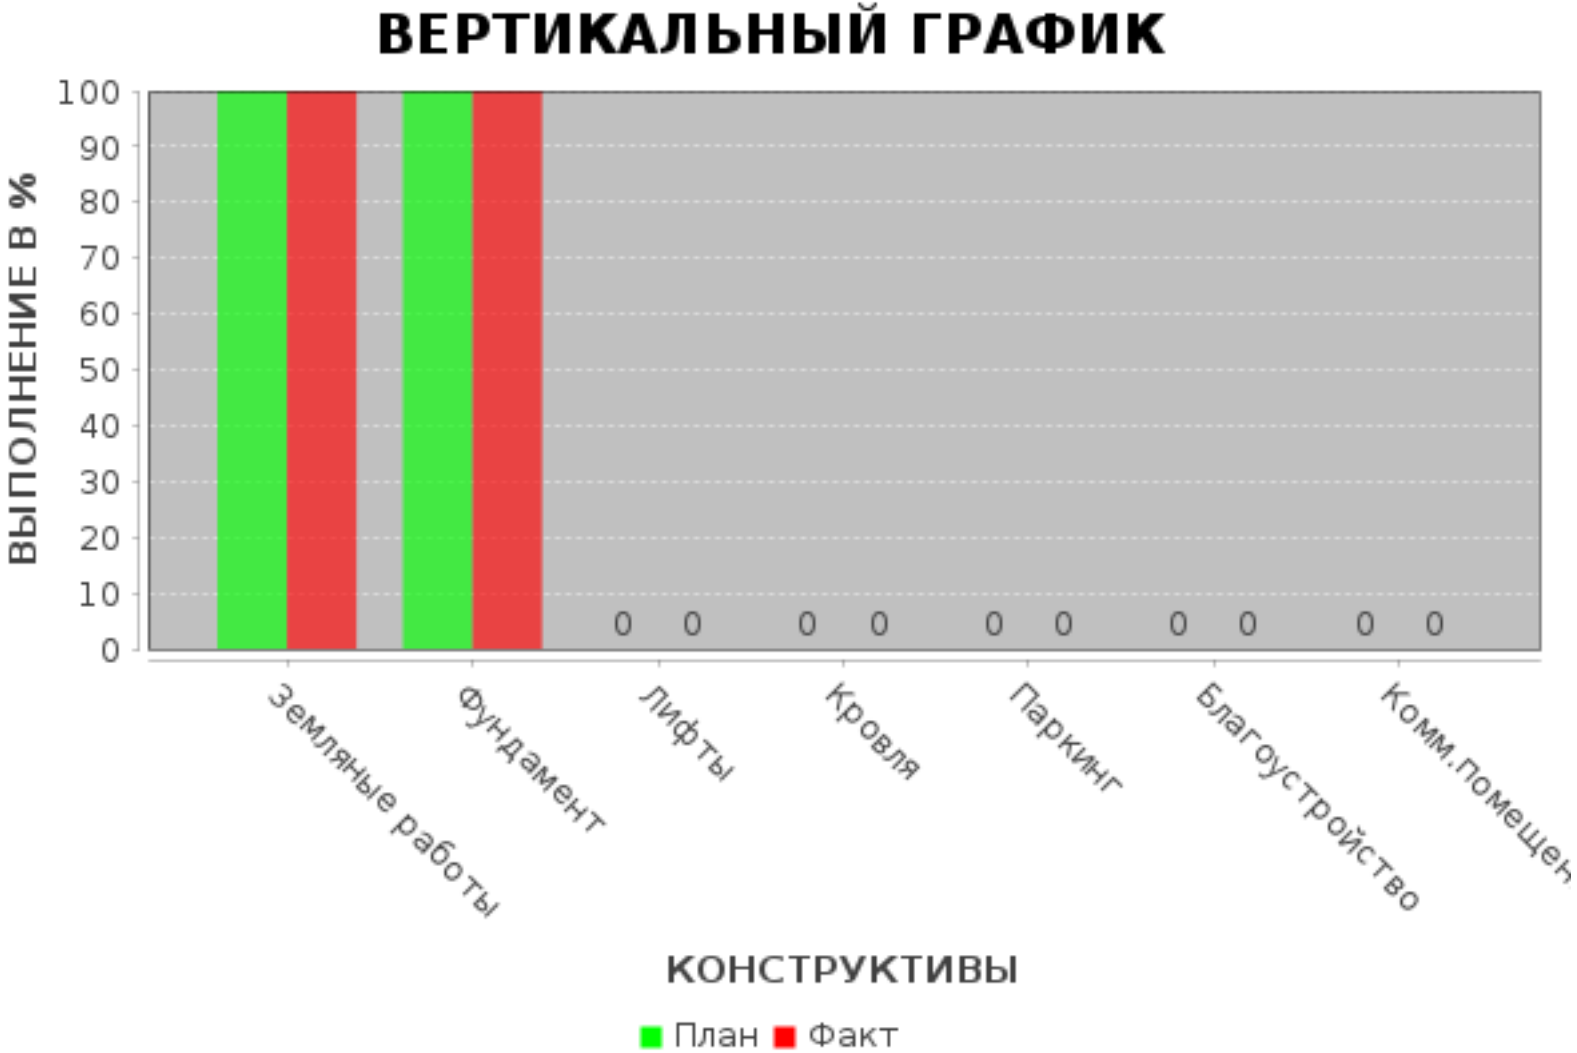

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

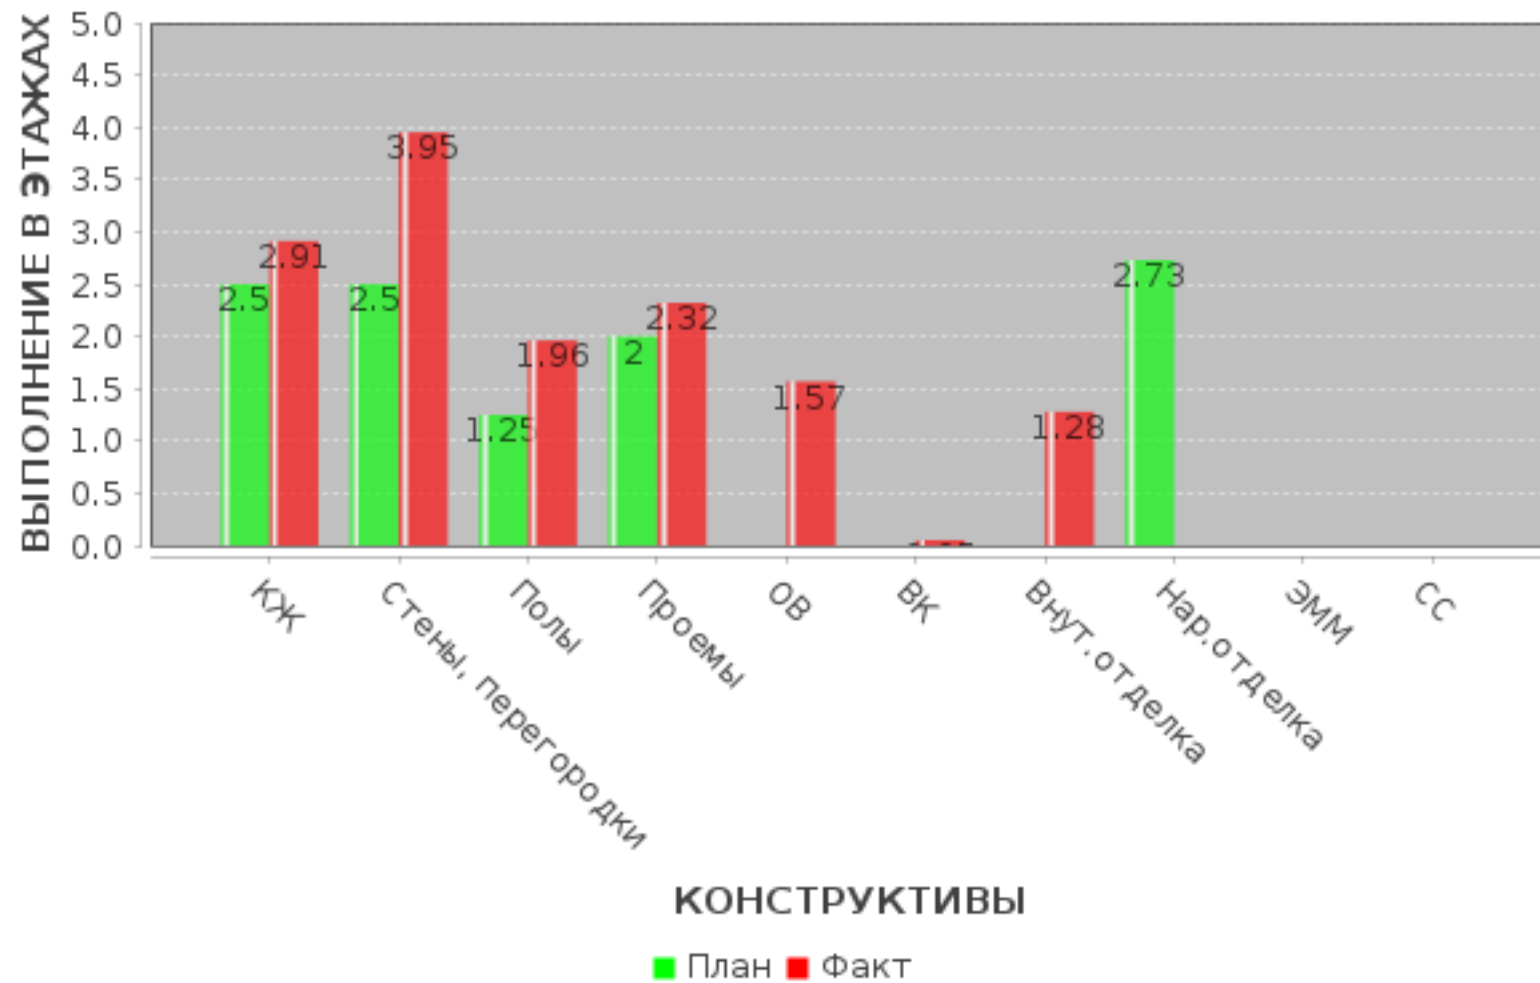


Фотофиксация за отчетный период

5 сент. 2025 г., 10:15:13
Кустанай
Казахстан
Береке 19



5 сент. 2025 г., 10:16:01
Кустанай
Казахстан
Береке 19

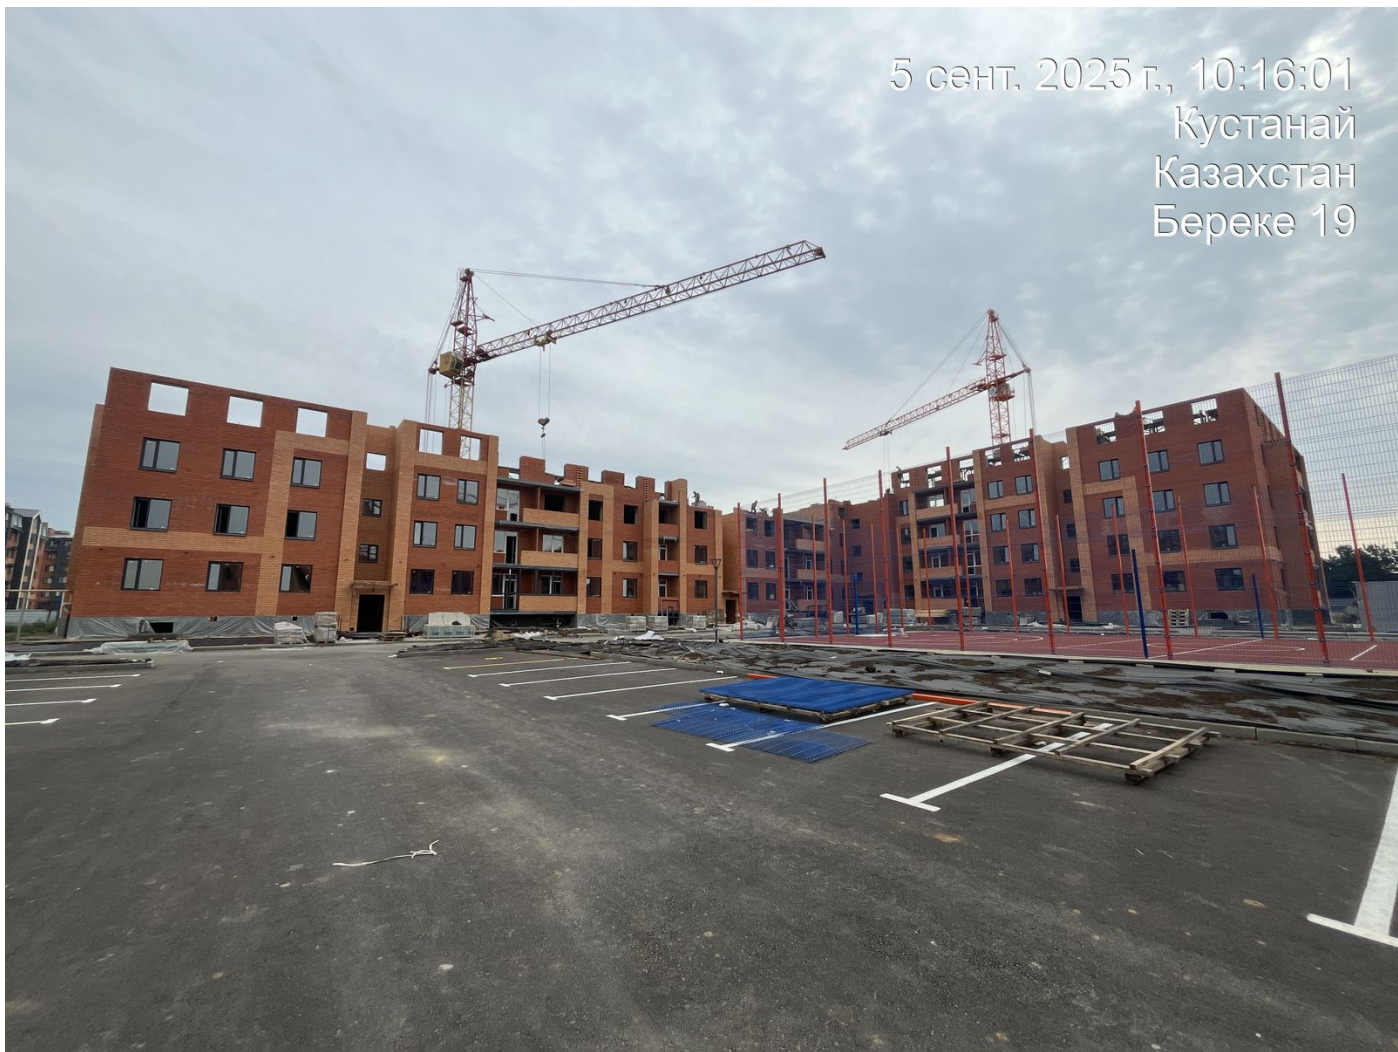

5 сент. 2025 г., 10:12:45
Кустанай
Казахстан
Береке 19







5 сент. 2025 г., 10:15:32
Кустанай
Казахстан
Береке 19

Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	08.09.2025 10:25	ШАИМОВ ИЛЪЯС null	Отправка отчета
2	08.09.2025 10:28	ЕСЛЯМ ЖАНАТ null	Отчет подписан
3	08.09.2025 10:28	ЗЕРНИН АРТЕМ null	Отчет подписан
4	08.09.2025 10:29	НАМ АЛЕКСАНДР null	Отчет подписан
5	08.09.2025 10:36	ТОКАРЕВА ИННА null	Отчет подписан
6	09.09.2025 04:20	ШАИМОВ ИЛЪЯС null	Отчет подписан
7	10.09.2025 05:22	ҚАЙЫРДЕН ЕЛАМАН null	Отчет согласован
8	15.09.2025 09:49	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
9	15.09.2025 09:50	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
10	16.09.2025 04:27	ИБРАИМОВ ЖАНДОС null	Отчет согласован
