



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном  
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого  
дома (жилого здания)**

«Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№11/3 (без наружных инженерных сетей), 3 очередь строительства»

Код: ДС №3 от 03.06.2025 г. к № ДПГ-23-17-050-159 от 28 декабря 2023 года

Отчетный период: 202506

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.06.2025 года по 30.06.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "D & J EMPORIO", БИН 081240016084

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО "Otbasu Satu"

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: ДС №3 от 03.06.2025 г. к № ДПГ-23-17-050-159 от 28 декабря 2023 года/202506

Информация по проекту: «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К. Тулеметова, уч.№11/3 (без наружных инженерных сетей), 3 очередь строительства»

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2025-05-02 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2027-01-13 года


Нормативный срок строительства: 22 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: № 19-0484/24 от 2024-12-04 года

## 1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	200440003119 - TOO "Otbasu Satu"	устав	№ 09/Otbasy, от 22.01.2024 года	Ибраймов Н.Б.	директор	+77077800501, null
2	Генеральный подрядчик	060340004172 - TOO «Kanfar Building»	Лицензия:12021953, 07.12.2012	№ 09/Otbasy, от 22.01.2024 года	Баймуханов Тлеу Кобегенович	директор	+77778808999, null
3	Авторский надзор	011040008574 - TOO "Компания TALAP PROJECT"		№ 24/01/2024, от 24.01.2024 года	Калмаганбетов Мадии Абилкасымович	директор	+77027604830, null
4	Инжиниринговая компания	081240016084 - TOO "D & J EMPORIO"	KZ39VWC0089618	№ДИУ-25-17-004/043, от 22.05.2025 года	Дюсенов Данияр Алшынович	директор	+77015447430, e-emporio@mail.ru
5	Генеральный проектировщик	050740007308 - TOO "ОЮ Project Group"	15- ГСЛ №002373	№1, от 29.01.2024 года	Хан А.Е.	директор	null, null

## 2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)

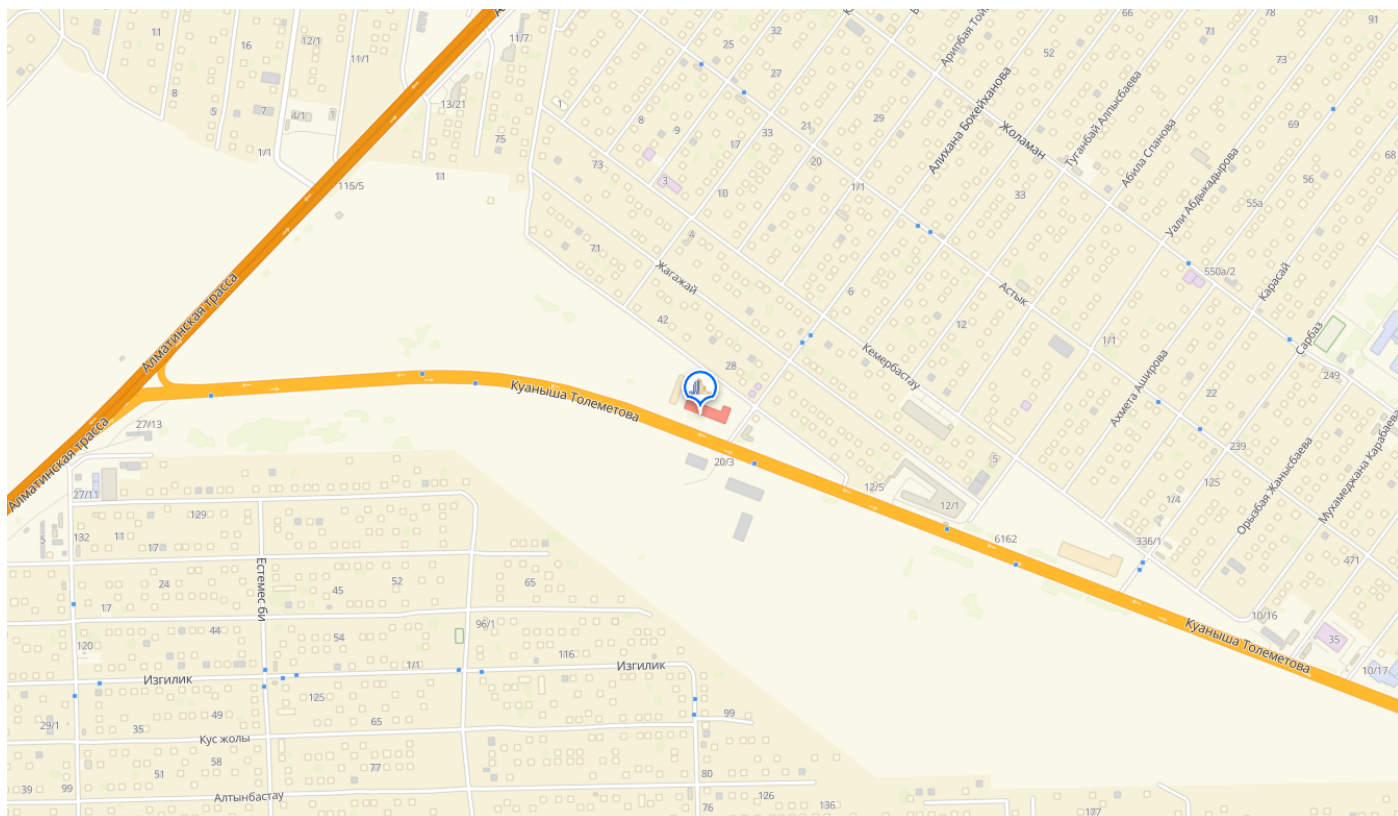

Площадка расположена на пересечении улиц К. Толметова и А2 города Шымкента.

### 3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Проектируемый объект «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - III очередь, размещается на отведенной территории в 2,2131 га.

III очередь строительства – 2,2131 га. III очередь строительства – 12 жилых блоков этажностью 9 этажей и одноэтажная коммерция.

В блоках III очереди строительства на первых этажах в зданиях в блоках 16, 17, 18, 19, 20, 21 на первом этаже располагаются встроенные помещения общественного назначения (офисы) с самостоятельными входными группами и санузлами, в блоках 15, 22, 23, 24, 25, 26

с первого по девятый этажи расположены жилые квартиры. В блоках предусмотрен подвал, для размещения технических помещений и коммуникаций. Входы в подъезды жилого дома расположены на первом этаже - со стороны главного фасада, а также со стороны двора.

В зданиях предусмотрены следующие виды инженерного оборудования: отопление автономное от газовых котлов расположенных в кухнях квартир, горячее водоснабжение от газовых котлов расположенных в кухнях квартир, водопровод, канализация, электроосвещение, телефонизация.

Характеристики здания.

Классификация жилья –IV класс.

Уровень ответственности – II- технически сложный.

Степень огнестойкости - II.

По функциональной пожарной опасности :

жилые помещения– Ф 1.3;

офисы – Ф 4.3

паркинг – Ф 5.2

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа, соответствующий абс. отм. на вертикальной планировке – 477,75.

#### 4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	12
Этажность зданий	этаж	9
Класс комфортности жилого здания	-	4
Уровень ответственности здания	-	2
Степень огнестойкости здания	-	2
Высота жилых этажей	метр	2,7
Площадь застройки здания	квадратный метр	15274,73
Общая площадь здания	квадратный метр	53182,13
Общая площадь квартир	квадратный метр	27631,8
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	7038,84
Строительный объем здания	кубический метр	222606,93
Количество квартир	шт.	508
в том числе: однокомнатные	шт.	230
в том числе: двухкомнатные	шт.	195
в том числе: трехкомнатные	шт.	83
в том числе: четырехкомнатные	шт.	
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	362
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	18501,444
в том числе: СМР	миллион тенге	15158,615
в том числе: оборудование	миллион тенге	615,240
в том числе: прочие	миллион тенге	2727,589

## 5. Анализ исходно–разрешительной документации

задание на проектирование рабочего проекта «Строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах, расположенного по адресу: г.Шымкент, ул. К.Тулеметова, уч.№11/3» (без наружных инженерных сетей) - II очередь, согласованное ТОО «ОЮ Project Group» и утвержденное ТОО «Otbasy Satu» 14.08.2023 года;

протокол общего собрания ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года с решением создать и учредить ТОО «Otbasy Satu» в размере 100% доли в уставном капитале;

решение единственного учредителя об учреждении ТОО «Otbasy Satu», выданное ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года;

справка о государственной регистрации юридического лица № 10100640898334 от 01.02.2023 года, выданная Управлением регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

передаточный акт №1 от 25.09.2023 года о передаче прав на имущество и документы, утвержденный ТОО «Kanfar Building»;

план очередности строительства, утверждённый ТОО «ОЮ Project Group» и ТОО «Otbasy Satu» в 2023 году;

архитектурно-планировочное задание №KZ02VUA00837444 от 13.02.2023 года на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.К.Тулеметова, уч.11/3, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент»;

протокол дозиметрического контроля №01-пл/д/РО-220-3109 от 26.12.2022 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №23-пл/д/РО-23-00869 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением РГП «Госэкспертиза»

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-1/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-2/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;



акт №2211051520627798 на земельный участок площадью 0,5023 га (кадастровый номер 22-330-033-1048), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

акт №2301231720706099 на земельный участок площадью 4,3376 га (кадастровый номер 22-330-033-1113), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент №0318-29-03-15/524 от 08.11.2022 года о разделении земельных участков с кадастровыми номерами 22-330-033-1048 и 22-330-033-1049;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02075053 от 23.10.2023 года о ПДП;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02642997 от 22.12.2023 года с пояснением об эскизном проекте;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» №21-08-12/3762 от 14.12.2022 года об отсутствии скотомогильников;

письмо ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» №39-08-04/2 от 04.01.2023 года об отсутствии зеленых насаждений;

письмо ТОО «Kanfar Building» №59-1 от 15.06.2023 года о согласовании трубошпунтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №34-Ш от 23.10.2023 года о разработке наружных инженерных сетей отдельным проектом;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №35-Ш от 23.10.2023 года о начале строительства – 1 квартал 2024 года;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №36-Ш от 23.10.2023 года об источнике финансирования – собственные средства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №37-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №38-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки супеси;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №39-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии вывозимого грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №40-Ш от 23.10.2023 года недостающие парковочные места и гостевые парковки для коммерческих помещений 1, 2, 4 очередей будут располагаться в паркинге 3 очереди строительства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №41-Ш от 23.10.2023 года не предусматривать затраты на управление проектом;

РГП «Госэкспертиза»

письмо ТОО «Otbasý Satu» №62-Ш от 20.12.2023 года – не предусматривать во 2 очереди паркинг;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №63-Ш от 20.12.2023 года о согласовании лифтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №65-Ш от 20.12.2023 года план благоустройства и озеленения будет выполнен после прокладки наружных инженерных сетей;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №66-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, деление на очереди условное, корректировка топосъемки не требуется;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №67-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована

будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, объемы по земляным работам котловна будут учтены отдельно по очередям строительства; в сметной документации стоимость материала грунтовой подушки не учитывать, учитывать только стоимость работ;

письмо ТОО «Otbasu Satu» №1-Ш от 10.01.2024 года о составе покрытия;

письмо ТОО «Otbasu Satu» №2-Ш от 15.01.2024 года не выделять в сметной стоимости затраты на жилую и офисную части, не выделять стоимость 1 м<sup>2</sup>;

письмо ТОО «Otbasu Satu» №3-Ш от 16.01.2024 года не учитывать в сметной стоимости затраты на газовые плиты;

письмо ТОО «Otbasu Satu» №4-Ш от 10.01.2024 года о корректировке парковочных мест и пересогласовании эскизного проекта;

письмо ТОО «Otbasu Satu» №6-Ш от 17.01.2024 года о согласовании трубошпунтов;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях (заказ №5577) и топографическая съемка, согласованная со всеми заинтересованными инстанциями, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в сентябре 2022 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Инженерные изыскания» (заказ №5577) в ноябре 2022 года.

## **6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации**

на водоснабжение и канализацию №871 от 27.07.2023 года, выданные ГКП «Управление водопровода и канализации» акимата города Шымкент;

на подключение к газораспределительным сетям №11-гор-2023-000004618 от 07.08.2023 года, выданные АО «КазТрансГазАймақ» Шымкентский производственный филиал;

на телефонизацию №4-387-23/Л от 31.07.2023 года, выданные АО «Қазақтелеком» ЮК ДЭСД;

на электроснабжение №18-07-42-1857 от 14.07.2023 года, выданные ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

## 7. Анализ проектной документации

протокол общего собрания ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года с решением создать и учредить ТОО «Otbasy Satu» в размере 100% доли в уставном капитале;

решение единственного учредителя об учреждении ТОО «Otbasy Satu», выданное ТОО «Kanfar Building» от 01.02.2023 года;

справка о государственной регистрации юридического лица № 10100640898334 от 01.02.2023 года, выданная Управлением регистрации филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

передаточный акт №1 от 25.09.2023 года о передаче прав на имущество и документы, утвержденный ТОО «Kanfar Building»;

план очерёдности строительства, утверждённый ТОО «ОЮ Project Group» и ТОО «Otbasy Satu» в 2023 году;

архитектурно-планировочное задание №KZ02VUA00837444 от 13.02.2023 года на строительство многоквартирного девятиэтажного жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом на нижних этажах расположенного по адресу: г.Шымкент, ул.К.Тулеметова, уч.11/3, выданное ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент»;

протокол дозиметрического контроля №01-пл/д/РО-220-3109 от 26.12.2022 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №23-пл/д/РО-23-00869 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением РГП «Госэкспертиза» Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-1/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе (почве) №22-пл/д-2/РО-23-00859 от 20.04.2023 года, выданный Шымкентским городским отделением Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Туркестанской области;

акт №2211051520627798 на земельный участок площадью 0,5023 га (кадастровый номер 22-330-033-1048), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

акт №2301231720706099 на земельный участок площадью 4,3376 га (кадастровый номер 22-330-033-1113), выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент;

письмо филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент №0318-29-03-15/524 от 08.11.2022 года о разделении земельных участков с кадастровыми номерами 22-330-033-1048 и 22-330-033-1049;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02075053 от 23.10.2023 года о ПДП;

письмо ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент» № 3Т-2023-02642997 от 22.12.2023 года с пояснением об эскизном проекте;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент» №21-08-12/3762 от 14.12.2022 года об отсутствии скотомогильников;

письмо ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент» №39-08-04/2 от 04.01.2023 года об отсутствии зеленых насаждений;

письмо ТОО «Kanfar Building» №59-1 от 15.06.2023 года о согласовании трубошпунтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №34-Ш от 23.10.2023 года о разработке наружных инженерных сетей отдельным проектом;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №35-Ш от 23.10.2023 года о начале строительства – 1 квартал 2024 года;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №36-Ш от 23.10.2023 года об источнике финансирования – собственные средства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №37-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №38-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии доставки супеси;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №39-Ш от 23.10.2023 года о расстоянии вывозимого грунта;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №40-Ш от 23.10.2023 года недостающие парковочные места и гостевые парковки для коммерческих помещений 1, 2, 4 очередей будут располагаться в паркинге 3 очереди строительства;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №41-Ш от 23.10.2023 года не предусматривать затраты на управление проектом;

РГП «Госэкспертиза»

письмо ТОО «Otbasý Satu» №62-Ш от 20.12.2023 года – не предусматривать во 2 очереди паркинг;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №63-Ш от 20.12.2023 года о согласовании лифтов;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №65-Ш от 20.12.2023 года план благоустройства и озеленения будет выполнен после прокладки наружных инженерных сетей;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №66-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, деление на очереди условное, корректировка топосъемки не требуется;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №67-Ш от 20.12.2023 года работы по производству котлована будут проводится одновременно для 1,2,3 очередей, объемы по земляным работам котлована будут учтены отдельно по очередям строительства; в сметной документации стоимость материала грунтовой подушки не учитывать, учитывать только стоимость работ;

письмо ТОО «Otbasý Satu» №1-Ш от 10.01.2024 года о составе покрытия;  
письмо ТОО «Otbasý Satu» №2-Ш от 15.01.2024 года не выделять в сметной стоимости затраты на жилую и офисную части, не выделять стоимость 1 м<sup>2</sup>;  
письмо ТОО «Otbasý Satu» №3-Ш от 16.01.2024 года не учитывать в сметной стоимости затраты на газовые плиты;  
письмо ТОО «Otbasý Satu» №4-Ш от 10.01.2024 года о корректировке парковочных мест и пересогласовании эскизного проекта;  
письмо ТОО «Otbasý Satu» №6-Ш от 17.01.2024 года о согласовании трубошпунтов;  
технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях (заказ №5577) и топографическая съемка, согласованная со всеми заинтересованными инстанциями, выполненные ТОО «Инженерные изыскания» в сентябре 2022 года;  
технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «Инженерные изыскания» (заказ №5577) в ноябре 2022 года.

## 8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

1) Краткое описание выполненных строительно-монтажных работ за отчетный период: выполнялись работы по армированию и бетонированию плит перекрытия и каркаса. На строительной площадке задействовано 66 рабочих.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта:

\*С нарастающим итогом план по СМР на конец отчетного периода составляет –13,4%.

Фактическое выполнение СМР на конец отчетного периода составляет –13,09%.

\*\*Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода –12,94%.

Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода –12,65%.

3) Соблюдение графика производства работ: по июнь 2025г. отставание 1 дн.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	1.85	1.54	-0.30	13.40	13.09	-0.30
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Газопровод	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Металлические конструкции	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Блок Б коммерция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	Освещение фасада	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<b>Всего (только СМР)</b>	<b>1.85</b>	<b>1.54</b>	<b>-0.30</b>	<b>13.40</b>	<b>13.09</b>	<b>-0.30</b>
14	Прочее	0.03	0.02	-0.01	0.15	0.14	-0.01
15	<b>Всего (СМР + Прочее)</b>	<b>1.79</b>	<b>1.49</b>	<b>-0.30</b>	<b>12.94</b>	<b>12.65</b>	<b>-0.30</b>



Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	-1	отставание связано с наращиванием темпа производства работ и нехватка рабочей силы
Архитектурно-строительные решения (АР)	0	
Отопление вентиляция	0	
Водопровод канализация	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	
Лифты	0	
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
Газопровод	0	
Металлические конструкции	0	
Блок Б коммерция	0	
Освещение фасада	0	
Прочее	0	
<b>Итого, за отчетный месяц</b>	<b>-1</b>	
<b>Итого, с нарастающим</b>	<b>-1</b>	

## 9. Мероприятия по контролю качества

### 1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

Оценка качество работ подрядных организаций положительная. Меры безопасности на объекте соблюдаются, отставание от гпр 2 дня.

### 2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
100	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
200	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	-7	-7	-7	-7	0
310	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
320	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
330	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
340	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
350	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
360	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
370	Не найдено	-1	-1	-1	-1	0
	Всего	-9	-9	-9	-9	0

### 3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

За отчетный период не имеется. Все замечания итн устраняются в срок.

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций

Работа субподрядных организаций оценивается положительно, замечания устраняются в срок, ведутся работы по армированию и бетонированию конструкций, Отставание от гпр 1 день.

## 10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Проблем ,влияющих на качество строительства и сроки ввода в эксплуатацию, нет.  
Отставание по ГПР 1 дн.

## 11. Сведения об изменениях на Объекте

Изменений в проекте нет.

## 12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	585 394 032.16	12 783 000.00	12 783 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 783 000.00	12 783 000.00
2	Экспертиза	10 124 341.92	10 124 341.92	10 124 341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10 124 341.92	10 124 341.92
3	СМР и оборудование	17 666 718 595.72	2 040 360 322.00	2 040 360 322.00	44 900 000.00	44 900 000.00	272 807 780.00	272 807 780.00	2 085 260 322.00	2 313 168 102.00
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	1 766 671 859.57			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Авторский надзор	44 166 796.80			300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
5	Технический надзор	195 040 574.40			0.00	0.00	3 405 053.51	3 405 053.51	0.00	3 405 053.51
	Всего СМР	18 501 444 341.00	2 063 267 663.92	2 063 267 663.92	45 200 000.00	45 200 000.00	276 512 833.51	276 512 833.51	2 108 467 663.92	2 339 780 497.43
6	Иное	185 014 443.41			305 500.00	305 500.00	305 500.00	305 500.00	305 500.00	305 500.00
	Всего СМР и Иное	18 686 458 784.41	2 063 267 663.92	2 063 267 663.92	45 505 500.00	45 505 500.00	276 818 333.51	276 818 333.51	2 108 773 163.92	2 340 085 997.43

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	34 451 717.24	34 480 753.32
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	28 600 500.00	28 629 536.08
1.3	Прочее 3% ИК	5 851 217.24	5 851 217.24
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	11 046 067.00	11 046 067.00
	ВСЕГО	45 497 784.24	45 526 820.32

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	6	284.30	100 385 520.00	10 000 000.00
2	Коммерческие помещения	2	109.03	60 547 800.00	1 046 067.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	<b>Всего</b>	<b>8</b>	<b>393.33</b>	<b>160 933 320.00</b>	<b>11 046 067.00</b>

### Примечание

Всего заключено 8 ДДУ, в т.ч. 6 квартир, 2 НП, распределение по способам продаж:  
через АО "Отбасы Банк" всего 0 ДДУ -0 квартиры,НП-0;  
рассрочка от застройщика 8 ДДУ (в т.ч. 6 квартир,НП-2);  
Вывод: 24,26% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.



Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	17 666 718 595.72	17 666 718 595.72	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *			0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	44 166 796.80	44 166 796.80	0.00
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	195 040 574.40	195 040 574.40	0.00
	в т.ч. ДИУ			0.00
	НОК			0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	18 501 444 341.00	294 421 691.08	45 200 000.00	-249 221 691.08	4 124 361 214.57	2 108 467 663.92	-2 015 893 550.65

### 13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Обобщая всю вышеизложенную информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что: По стоимости строительно-монтажных работ - работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Договоры на оказание услуг и генерального подряда заключены в пределах стоимости проектно-сметной документации. По объемам строительно-монтажных работ – все объемы, подтвержденные экспертами технического надзора, соответствуют рабочему проекту и проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. Соблюдение графика производства работ: по июнь 2025г. отставание от гпр 1 день Рекомендации от инжиниринговой компании: усилить контроль со стороны ИТР, увеличить количество квалифицированных работников, своевременно предоставить акт выполненных работ по СМР, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ, производить строительно-монтажные работы строго по графику производства работ. Все работы ведутся по рабочему проекту. Затраты, не предусмотренные проектом, отнесены за счет собственных средств Застройщика. По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет. В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

Вывод: низкий уровень 24,26% поступления денежных средств от дольщиков.

## Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	HEAD	790417301107 - ДЮСЕНОВ ДАНИЯР АЛШЫНОВИЧ		NEW	
2	INITIATOR	901009450617 - ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ ТУЛЕГЕНОВНА		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	650304300106 - РАЙМОВ ЖУМАДИЛДА БАЛТАБАЕВИЧ		NEW	





































ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

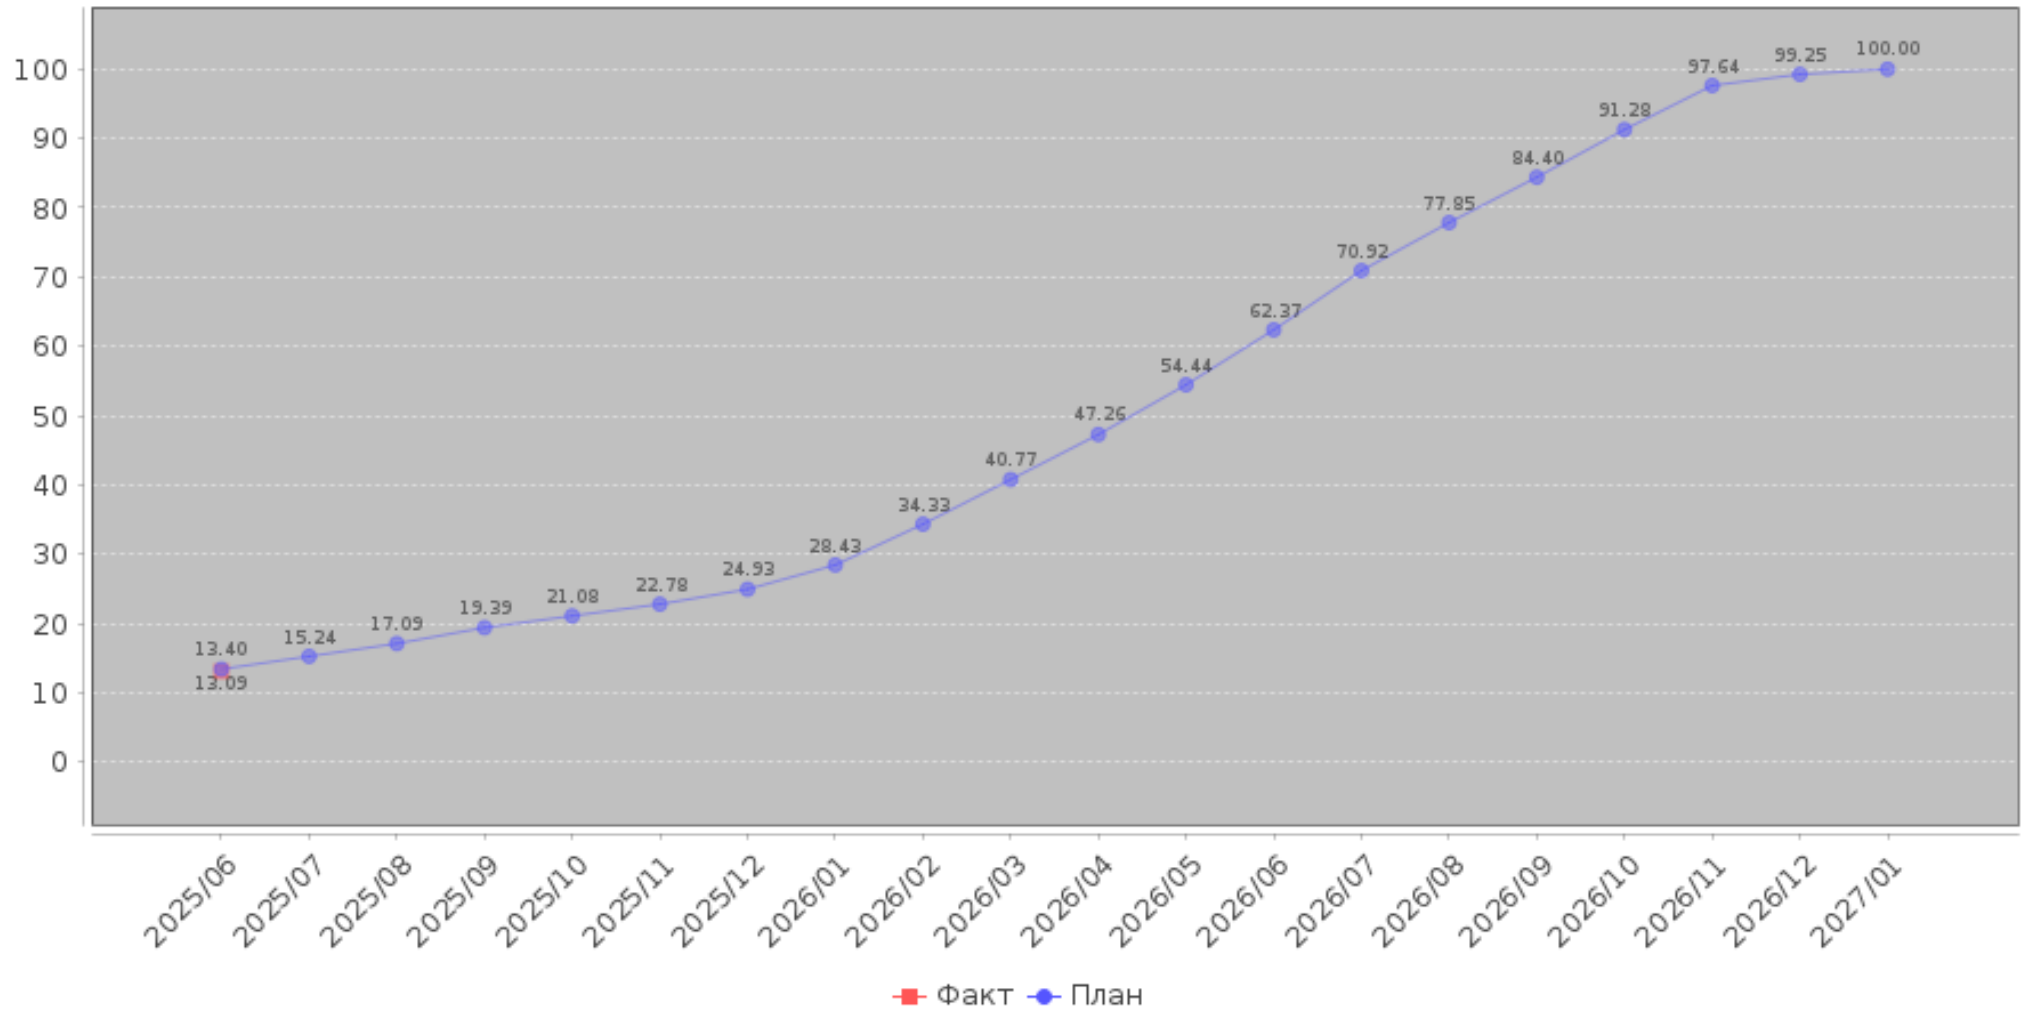



## ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

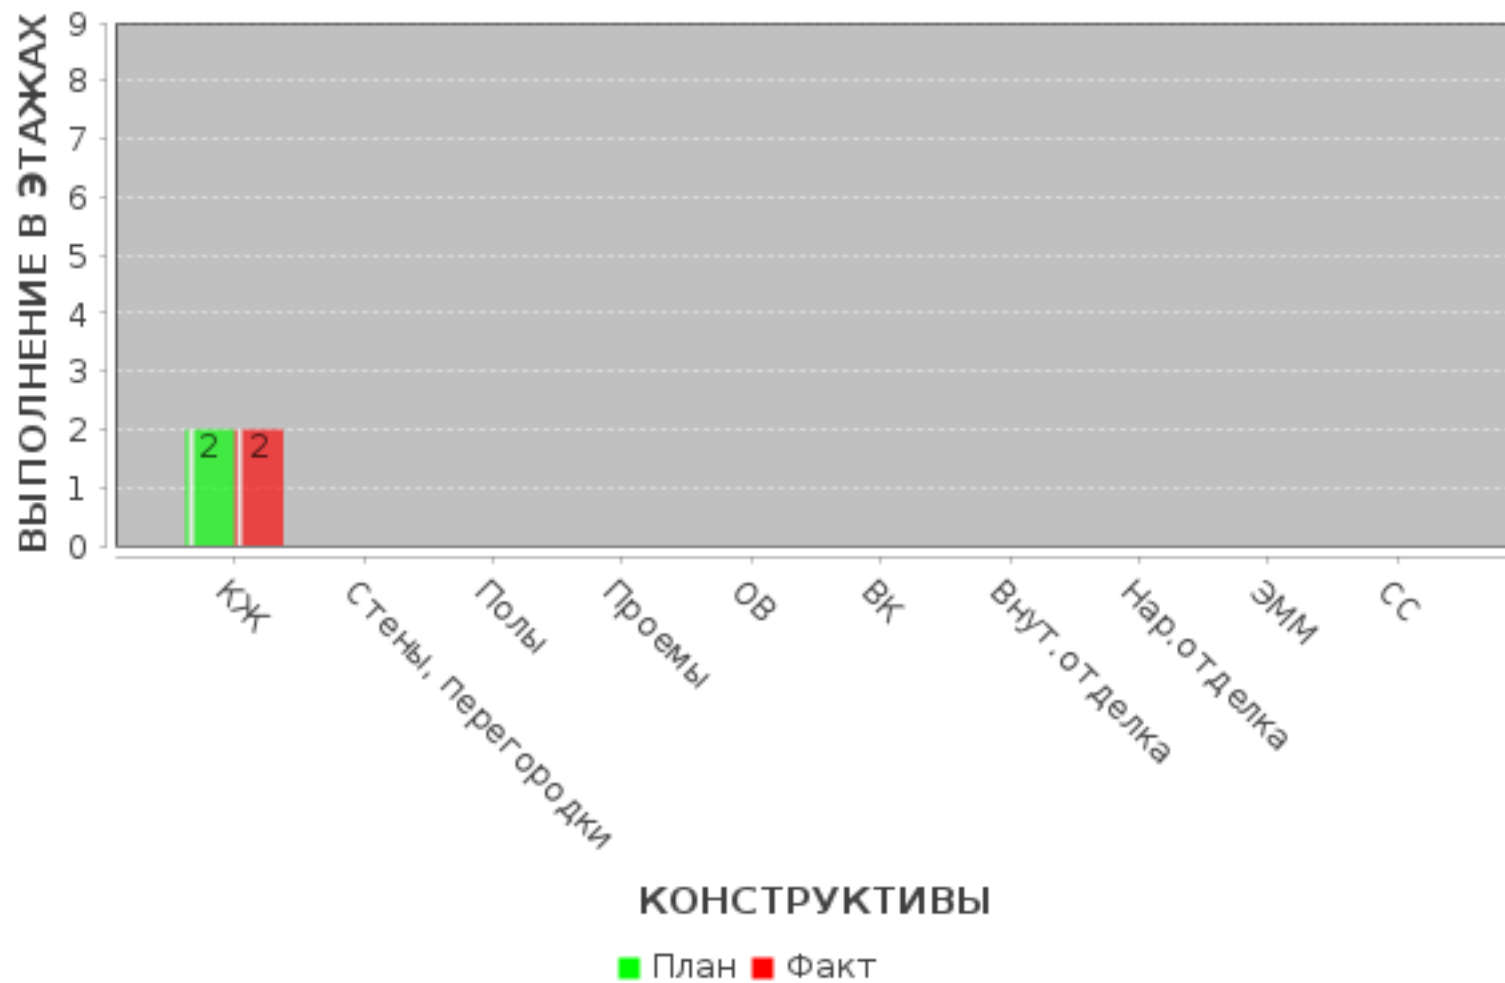

Фотофиксация за отчетный период

















### Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	16.07.2025 07:35	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отправка отчета
2	16.07.2025 07:36	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отчет подписан
3	16.07.2025 07:48	РАЙМОВ ЖУМАДИЛДА null	Отчет подписан
4	16.07.2025 07:48	ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null	Отчет подписан
5	16.07.2025 07:50	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отправка отчета
6	16.07.2025 07:51	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отчет подписан
7	16.07.2025 07:51	РАЙМОВ ЖУМАДИЛДА null	Отчет подписан
8	16.07.2025 07:52	ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null	Отчет подписан
9	16.07.2025 07:58	САТАЕВ БЕКМАГАМБЕТ null	Отчет согласован
10	22.07.2025 10:51	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отказ в согласовании
11	28.07.2025 08:59	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отправка отчета
12	28.07.2025 08:59	ИБРАГИМОВА АЙГАНЫМ null	Отчет подписан
13	28.07.2025 10:22	РАЙМОВ ЖУМАДИЛДА null	Отчет подписан
14	28.07.2025 10:22	ДЮСЕНОВ ДАНИЯР null	Отчет подписан
15	29.07.2025 08:44	САТАЕВ БЕКМАГАМБЕТ null	Отчет согласован
16	29.07.2025 10:32	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
17	29.07.2025 10:33	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
