



**Отчет инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном
строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства жилого
дома (жилого здания)**

МЖК Bestogai Qaragai

Код: (номер сертификата 268) ДПГ-25-01-036/193

Отчетный период: 202510

Индекс: 1-ОИК

Отчетный период мониторинга: с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года

Периодичность: ежемесячно

Круг лиц представляющих: ТОО "SAM-TEH-ABSOLUTE", БИН 180840029150

Куда предоставляется: АО «Казахстанская Жилищная Компания», ТОО «Sensata Build»

Сроки предоставления: ежемесячно к 15-му числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Порядковый номер отчета: (номер сертификата 268) ДПГ-25-01-036/193/202510

Информация по проекту: МЖК Bestogai Qaragai

Общие сроки реализации проекта:

Начало строительно-монтажных работ: 2025-07-01 года

Ввод объекта в эксплуатацию: 2026-03-18 года


Нормативный срок строительства: 9 месяцев

Заключение экспертизы рабочего проекта: № 01-0300/22 от 2022-07-04 года

1. Участники проекта

#	Участники процесса	Наименование организаций	Основания деятельности организации	Взаимоотношения участников по Договору (номер, дата)	ФИО	Должность	Контактные данные (телефон электронная почта)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заказчик	201240024454 - ТОО «Sensata Build»	Устав	№01/SeB-23-ГП , от 01.01.2023 года	Аубакиров Ж.К	Директор	null, null
2	Генеральный подрядчик	041040007551 - ТОО «Sensata Construction»	Договор	№01/SeB-23-ГП, от 01.01.2023 года	Моренков А.Н	Директор	null, null
3	Авторский надзор	010540003856 - ТОО «Проект ИНТЕХ Плюс»	Договор	№13/SeB-25/B01 от 23.01.2025г, от года	Шакенова А.Н	Директор	null, null
4	Инжиниринговая компания	180840029150 - ТОО "SAM-TEH-ABSOLUTE"	Договор	ДИУ-25-01-028/051 , от 14.07.2025 года	Кайрденов С.С	Директор	null, null
5	Генеральный проектировщик	891128300131 - ИП «Шакенова Н.Г»	Директор	№32/SeB-25/B01/1-1 от 03.03.2025г, от года	Шакенова А.Н	Директор	null, null

2. Месторасположение объекта (ситуационная схема)

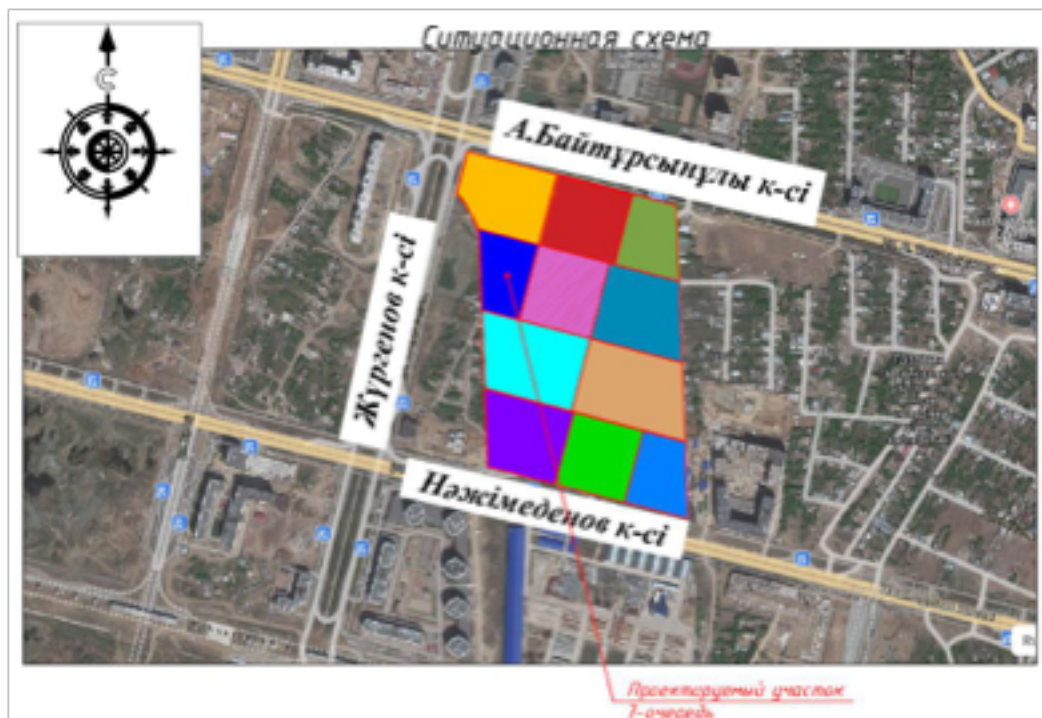

Проектируемый объект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, детским садом и паркингом, общественные здания на земельном участке расположенном в г.Нур-Султан, район Алматы, квадрат улиц А.Байтұрсынова, Т.Жүргенова, Нажимеденова и А51.», размещается на отведенной территории в 15,5672 га. Многоквартирный жилой комплекс разделен на одиннадцать очередей строительства. В данном проекте разработана 7 очередь строительства.

3. Краткое описание проекта (состав проекта)

Проектируемый объект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, детским садом и паркингом, общественные здания на земельном участке расположенном в г.Нур-Султан, район Алматы, квадрат улиц А.Байтурсынова, Т.Жургенова, Нажимеденова и А51.», размещается на отведенной территории в 15,5672 га.

Многоквартирный жилой комплекс разделен на одиннадцать очередей строительства. В данном проекте разработана 7 очередь строительства.

В конструктивном решении для жилых блоков принята каркасно-связевая система, где основные несущие конструкции образуются системой горизонтальных дисков-перекрытий и вертикальных диафрагм жесткости и пилонов.

Прочность, устойчивость и пространственная жесткость каркасно-связевой системы обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций.

Фундаменты – Монолитный железобетонный плитный ростверк на естественном основании, из бетона кл.С20/25, марки по водонепроницаемости – W6, марки по морозостойкости – F100 с добавлением добавки "BETOCRETE-CP350CI"

Плиты перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 20см из бетона кл.С20/25.

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные толщиной 25см из бетона кл. С20/25.

Пилоны - монолитные железобетонные толщиной 30, 25см из бетона кл. С20/25.

Шахты лифта - из монолитного железобетона толщиной 25; 20см из бетона кл. С20/25.

Лестницы - монолитные железобетонные марши из бетона кл. С20/25.

Наружные стены:

- стены подвала - монолитные железобетонные 20см, из бетона кл. С20/25, W6, F100 с добавлением добавки "BETOCRETE-CP350CI".

- 1 и типовые этажи из газобетонных блоков Б200 (250х250х625), плотностью D600кг/м³, толщиной 20см.

Межквартирные перегородки - из керамического полнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65 1 НФ/75/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, толщиной 25см.

Стены лоджий - из газобетонных блоков Б100 (100х250х625), плотностью D500кг/м³ толщиной 10см.

Перегородки внутренние - из газобетонных блоков Б100 (100х250х625), плотностью D500кг/м³ толщиной 10см.

Стены вентиляционных шахт на кровле - из керамического полнотелого кирпича Кр-р-по 250х120х65 1 НФ/75/2,0/50 по ГОСТ 530-2012, толщиной 12см.

Кровля – Плоская, совмещенная вентилируемая, рулонная с внутренним организованным водостоком.

Перекрытия – металлические индивидуального изготовления из уголков 50х5 и 75х5, и из арматуры $\square$ 14 S500 по СТ РК EN 10080-2011.

Все несущие конструкции зданий выполнить из тяжелого бетона с рабочей арматурой

класса S500 по СТ РК EN 10080-2011. Поперечная арматура (хомуты и шпильки) - класса S240 по СТ РК EN 10080-2011.

Соединение рабочей арматуры выполнять ручной дуговой сваркой в соответствии с указаниями ГОСТ 14098-2014, а также внахлест без сварки, при помощи скруток из вязальной проволоки.

4. Основные технико-экономические показатели проекта по рабочему проекту

Наименование показателя	Единица измерения	Показатель
1	2	3
Количество жилых домов	шт.	1
Этажность зданий	этаж	9,12
Класс комфортности жилого здания	-	IV
Уровень ответственности здания	-	II
Степень огнестойкости здания	-	II
Высота жилых этажей	метр	3
Площадь застройки здания	квадратный метр	2 085,69
Общая площадь здания	квадратный метр	17 540,39
Общая площадь квартир	квадратный метр	13 360,75
Площадь встроенно-пристроенных помещений	квадратный метр	
Строительный объем здания	кубический метр	71 969,75
Количество квартир	шт.	234
в том числе: однокомнатные	шт.	93
в том числе: двухкомнатные	шт.	71
в том числе: трехкомнатные	шт.	58
в том числе: четырехкомнатные	шт.	12
в том числе: пятикомнатные	шт.	
Количество машино-мест	шт.	
Общая сметная стоимость строительства	миллион тенге	5 373,91
в том числе: СМР	миллион тенге	4 402,393
в том числе: оборудование	миллион тенге	147,853
в том числе: прочие	миллион тенге	823,664

5. Анализ исходно–разрешительной документации

Уведомление о начале строительно-монтажных работ №KZ15REA00398008 от 18.06.2024г.

1.2 Заключение положительное на рабочий проект «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, детским садом и паркингом, общественные здания на земельном участке, расположенном в г. Нур-Султан, район Алматы, квадрат улиц А. Байтурсынова, Т. Жургенова, Нажимеденова и А51. 7 очередь строительства» (без наружных инженерных сетей)» №01-0300/22 от 04.07.2022г

1.3 Задание на проектирование (корректировку), утверждённое заказчиком от 18 августа 2021г;

1.4 Выписка из постановления акимата г. Астаны «О разрешении на проведение изыскательских и проектных работ объекта промышленно-гражданского назначения на земельном участке» от 21 января 2021 года № 510-172;

1.5 Схема расположения земельного участка в г. Астана для проведения обследования, изыскательских и проектных работ;

1.6 Архитектурно-планировочное задание на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 16 июля 2021 года № KZ90VUA00472692;

1.7 Эскизный проект, согласованный ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» от 26 октября 2021 года № KZ81VUA00542791;

Технические условия:

1.8 АО «Астана-Теплотранзит» от 24 июня 2021 года № 3744-11 на теплоснабжение;

1.9 ГКП «Астана Су Арнасы» от 19 мая 2021 года № 3-6/956 на забор воды из городского водопровода и сброс стоков в городскую канализацию;

2.0 ГУ на ПХВ «Elorda Eco System» от 13 мая 2021 года № ПО.2021.0010321 на проектирование и строительство сетей дренажной канализации;

2.1 АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» от 9 июля 2021 года №5-А-4/2-1238 на электроснабжение;

2.2 ТОО «КаР-Тел» от 10 ноября 2021 года № 120-10/11/2021 на телефонизацию.

6. Анализ исполнительной и приемо-сдаточной документации

Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ15REA00398008 от 18.06.2024г.

Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ15REA00398008 от 18.06.2024г.

1.3 Журнал производства работ;

1.4 Журнал забивки свай;

1.5 Журнал бетонных работ;

1.6 Журнал ухода за бетоном;

7. Анализ проектной документации

Вводная информация о договоре на проектирование (указание наименования проектной организации, номера договора, даты заключения договора, планируемый срок выполнения проектных работ), планируемых сроках выдачи документации с указанием статуса комплектности и достаточности полученной документации для выполнения СМР на дату составления отчёта:

1.1 Договор на проектирование №32/SeB-25/B01/1-1 от 03.03.2025г

1.2 На дату составления первого отчета Заказчиком на электронном носителе предоставлены положительные заключения РГП «Госэкспертиза» №01-0300/22 от 04.07.2022г

8. О ходе выполнения строительно-монтажных работ

За отчетный период выполнены следующие работы:

- КЖ (монолитные работы)

- АР (кладка стен)

На строительной площадке задействовано 83 рабочих.

2) Выполнение строительно-монтажных работ на соответствие плановым и фактическим показателям по разделам проекта: *С нарастающим итогом план по СМР на конец отчетного периода составляет –31,92%.

Фактическое выполнение СМР на конец отчетного периода составляет –28,10%.

**Плановое освоение по проекту СМР и прочее на конец отчетного периода –31,74%. Фактическое освоение по проекту на конец отчетного периода – 27,39%

3) Соблюдение графика производства работ: по октябрь 2025г. Отставание от ГПР 11 дней в связи с недостаточным количеством рабочей силы.

Таблица 3

	Разделы проекта	План, %	Факт, %	Отклонение (+/-), %	План с нарастающим, %	Факт с нарастающим, %	Отклонение по нарастающему (+/-), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Конструкции железобетонные	6.42	7.17	0.75	24.14	25.31	1.17
2	Архитектурно-строительные решения (АР)	5.20	2.79	-2.42	7.78	2.79	-4.99
3	Отопление вентиляция	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Водопровод канализация	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Электрооборудование, слабые токи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Лифты	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Паркинг	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Благоустройство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	Всего (только СМР)	11.63	9.96	-1.66	31.92	28.10	-3.83
10	Прочее	0.38	0.16	-0.22	1.46	0.74	-0.72
11	Всего (СМР + Прочее)	11.41	9.61	-1.79	31.74	27.39	-4.35

Таблица 4

Разделы проекта	Отставание (-)/опережение (+) по видам работ*	Причины отставания/опережения по видам работ
1	2	3
Конструкции железобетонные	2	
Архитектурно-строительные решения (АР)	-6	недостаточное количество рабочей силы
Отопление вентиляция	0	
Водопровод канализация	0	
Электрооборудование, слабые токи	0	
Лифты	0	
Паркинг	0	
Благоустройство	0	
Прочее	0	
Итого, за отчетный месяц	-4	
Итого, с нарастающим	-11	

9. Мероприятия по контролю качества

1) Указание оценки качества работ подрядчиков в отчетный период

-В отчетном периоде серьезных недостатков и дефектов СМР не выявлено.

-Строительно-монтажные работы производятся согласно утвержденной проектно-сметной документации;

-на объекте производится контроль над качеством выполняемых работ как со стороны ответственных ИТР, так и представителями инжиниринговой компании;

-результаты испытаний исполнителя и оценка достоверности испытаний подрядчика подтверждается протоколами лабораторных испытаний и исполнительными схемами;

-основные мероприятия по контролю качества (включая виды: входной, операционный и приемочный), проведенные в отчетный период, отражаются в журнале производства работ и технического надзора.

2) Статистика (количество) замечаний

Таблица 5

№	Замечания	Итого выявлено за период строительства	Итого устранено за период строительства	За отчетный период - выявлено	За отчетный период - устранено	Итого не устранено на текущую дату
1	2	3	4	5	6	7
1	Документация и организационные вопросы	0	0	0	0	0
2	По технике безопасности	0	0	0	0	0
3	По качеству строительно-монтажных работ, в том числе:	4	4	2	2	0
3.1	Конструкции железобетонные	3	3	1	1	0
3.2	Общестроительные работы АР	1	1	1	1	0
3.3	Лифты	0	0	0	0	0
3.4	Водоснабжение и канализация	0	0	0	0	0

3.5	Отопление и вентиляция	0	0	0	0	0
3.6	Электромонтажные работы	0	0	0	0	0
3.7	Слаботочные сети	0	0	0	0	0
4.1	Паркинг	0	0	0	0	0
4.2	Благоустройство	0	0	0	0	0
4.3	Сети электроснабжения	0	0	0	0	0
	Всего	4	4	2	2	0

3) Перечень предписаний, не устраненных на дату мониторингового отчета

В отчетном периоде было выдано одно замечание, которое устранили. На текущий период не устраненных замечаний нет.

4) Вывод о качестве выполняемых работ за отчетный период и рекомендации по устранению и профилактике недопущения нарушений впоследствии, риски неисполнения рекомендаций

Не имеется

10. Основные проблемы, возникающие в ходе реализации проекта

Перечень и описание проблем и ситуаций, возникших по ходу реализации проекта ведущих к ухудшению качества работ, срыву сроков завершения Объекта. Предложения по устранению этих проблем (при наличии): Проблем, ведущих к ухудшению качества работ на дату составления отчета, не имеется.

Анализ результатов устранения недостатков, установленных в предыдущий период (приведенных в отчете за предыдущий отчетный период): не устраненных замечаний нет. Отставание за месяц 4 дня, с начала строительства 11 дней в связи с недостаточным количеством рабочей силы.

11. Сведения об изменениях на Объекте

За отчетный период изменений в Объекте не было.

Перечень дополнительных (непредвиденных) работ, возникших в процессе строительства, реконструкции или капитального ремонта, с копиями обосновывающих материалов

За отчетный период дополнительных (непредвиденных) работ не возникало;

Идет процесс по смене Генподрядчика.

12. Анализ финансовой части

Таблица 6

№	Наименование статей расходов	Планируемый бюджет	Оплаты до получения гарантии	Освоение до получения гарантии	Оплаты за отчетный период	Оплаты с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Освоение за отчетный период	Освоение с нарастающим итогом с момента получения гарантии	Всего оплаты	Всего освоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Разработка ПСД	111 010 480.00	13 968 500.00	13 968 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 968 500.00	13 968 500.00
2	Экспертиза	3 490 254.88	3 490 254.88	3 490 254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3 490 254.88	3 490 254.88
3	СМР и оборудование	5 096 326 892.32	158 461 871.67	158 461 871.67	155 197 943.94	433 587 913.24	507 798 084.09	1 273 548 836.09	592 049 784.91	1 432 010 707.76
3.1	в том числе аванс, предусмотренный статьей 36 Закона РК от 7 апреля 2016 года 'О долевом участии в жилищном строительстве'	509 632 689.23			155 197 943.94	433 587 913.24	11 868 957.57	29 767 140.86	433 587 913.24	29 767 140.86
4	Авторский надзор	41 789 880.16			0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	600 000.00	600 000.00
5	Технический надзор	121 292 580.64			13 166 807.67	13 166 807.67	8 731 404.69	21 898 212.36	13 166 807.67	21 898 212.36
	Всего СМР	5 373 910 088.00	175 920 626.55	175 920 626.55	168 364 751.61	447 354 720.91	516 529 488.78	1 296 047 048.45	623 275 347.46	1 471 967 675.00
6	Иное	376 173 706.16			22 184 513.91	46 699 882.94	22 184 513.91	46 699 882.94	46 699 882.94	46 699 882.94
	Всего СМР и Иное	5 750 083 794.16	175 920 626.55	175 920 626.55	190 549 265.52	494 054 603.85	538 714 002.69	1 342 746 931.39	669 975 230.40	1 518 667 557.94

Таблица 7

№	Наименование источника финансирования	Поступления в отчетном периоде	Поступления с нарастающим итогом с момента получения гарантии
1	2	3	4
1	Заемные средства	191 012 208.68	495 379 020.24
1.1	Банк	0.00	0.00
1.2	Застройщик	191 012 208.68	495 379 020.24
1.3	Прочее 3% ИК	0.00	0.00
2.1	Бронь ДДУ	0.00	0.00
2.2	Поступление по другой очереди ДДУ	0.00	0.00
2.2	ДДУ	0.00	0.00
	ВСЕГО	191 012 208.68	495 379 020.24

№	Данные по ДДУ	Количество	Площадь, м2	Стоимость ДДУ, тенге	Оплачено, тенге
1	2	3	4	5	6
1	Квартиры	0	0.00	0.00	0.00
2	Коммерческие помещения	0	0.00	0.00	0.00
3	Паркинг	0	0.00	0.00	0.00
4	Кладовое помещение	0	0.00	0.00	0.00
	Всего	0	0.00	0.00	0.00

Примечание

Всего заключено ДДУ, в т.ч. распределение по способам продаж:

через АО "Отбасы Банк" всего ДДУ - нет;

прямые продажи всего ДДУ (в т.ч. квартира - , НП- 0 , парковочных мест -); рассрочка от застройщика всего ДДУ (в т.ч. квартир - , НП-0, парковочных мест -); через БВУ всего ДДУ (в т.ч. квартир , НП- 0 , парковочных мест - 0).

Вывод: поступлений ДС от дольщиков нет, в т.7 плохо - 0% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Использованы средства застройщика.

Таблица 8

№	Наименование договоров	Стоимость по договору	Стоимость по проектно-сметной документации	Разница
1	2	3	4	5
1	Договор генерального подряда	5 096 326 892.32	5 096 326 892.32	0.00
	Договора поставки материалов, договора аренды техники *	2 558 441 096.00	2 558 441 096.00	0.00
2	Договор оказание услуг авторского надзора	2 700 000.00	41 789 880.16	39 089 880.16
	в т.ч. ДАУ			0.00
	НОК			0.00
3	Договор оказание услуг технического надзора	84 904 806.00	121 292 580.64	36 387 774.64
	в т.ч. ДИУ	84 904 806.00	121 292 580.64	36 387 774.64
	НОК			0.00

Таблица 9. Анализ плана финансирования

№	Общая сумма по плану финансирования	План на отчетный месяц	Факт на отчетный месяц	Отклонение	Итого План финансирования с нарастающим	Итого Факт финансирования с нарастающим	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5 373 910 088.00	551 751 027.01	168 364 751.61	-383 386 275.40	2 063 658 425.41	623 275 347.46	-1 440 383 077.95

13. Заключение

Обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной рабочей документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству.

На строительной площадке задействовано 83 рабочих.

Обобщая информацию, инжиниринговая компания делает вывод, что:

- по стоимости строительно-монтажных работ работы ведутся в пределах стоимости проектно-сметной документации, утвержденной заключением государственной экспертизы. -
- по объемам строительно-монтажных работ – в отчетном периоде акты выполненных работ закрыты по кж и ар.
- по качеству выполняемых работ грубых нарушений в процессе производства работ нет на момент подачи данного отчета, вся исходно-разрешительная, приемо-сдаточная и проектная документации имеется в наличии. Отставание строительно-монтажных работы связано с отсутствием (нехваткой) рабочих на площадке.

Отставание по ГПР - 11 дней в связи с недостаточным количеством рабочей силы.

Выводы:

По т.8 перебора по Бюджету по договорам ГП,ДИУ, АН нет.

В отчетном периоде по т.6 и т.7 нецелевого использования денежных средств не зафиксировано

Поступлений ДС от дольщиков нет, использованы средства застройщика.

В т.7 - 0% от общего поступления денежных средств, средства дольщиков.

Рекомендации от инжиниринговой компании: АВР по СМР закрыты не в полном объеме, закрыть актами выполненные работы, продолжить мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

Состав инжиниринговой компании:

Руководитель организации:

Директор ТОО «Sam-Teh-Absolute» _____ Кайрденев С.С

Эксперт технического надзора ТОО «Sam-Teh-Absolute» _____ Кужанбаев А.С

Эксперт технического надзора ТОО «Sam-Teh-Absolute» _____ Шайдуллинов Р.К.

Эксперт технического надзора ТОО «Sam-Teh-Absolute» _____ Алибеков Д.С

Специалист по учету затрат ТОО «Sam-Teh-Absolute» _____ Шарапатова А.А.

Дата составления отчета «_1_» __ноября__2025 г.

Подписанты

#	Участники процесса	ИИН - ФИО	Организация	Статус	Дата подписи
1	2	3	4	5	6
1	INITIATOR	961008451026 - ШАРАПАТОВА АЙГЕРИМ		NEW	
2	HEAD	900903351190 - КАЙРДЕНОВ САМАТ СЕРИКОВИЧ		NEW	
3	TECHNICAL_SUPERVISION	781130399065 - ШАЙДУЛЛИНОВ РУСЛАН КАЖИКАБИДЕНОВИЧ		NEW	
4	TECHNICAL_SUPERVISION	800312300433 - ЛИ КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВИЧ		NEW	
5	TECHNICAL_SUPERVISION	911117351023 - АЛИБЕКОВ ДОСЖАН СЕРИКБАЕВИЧ		NEW	




























ГРАФИЧЕСКОЕ И ПРОЦЕНТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

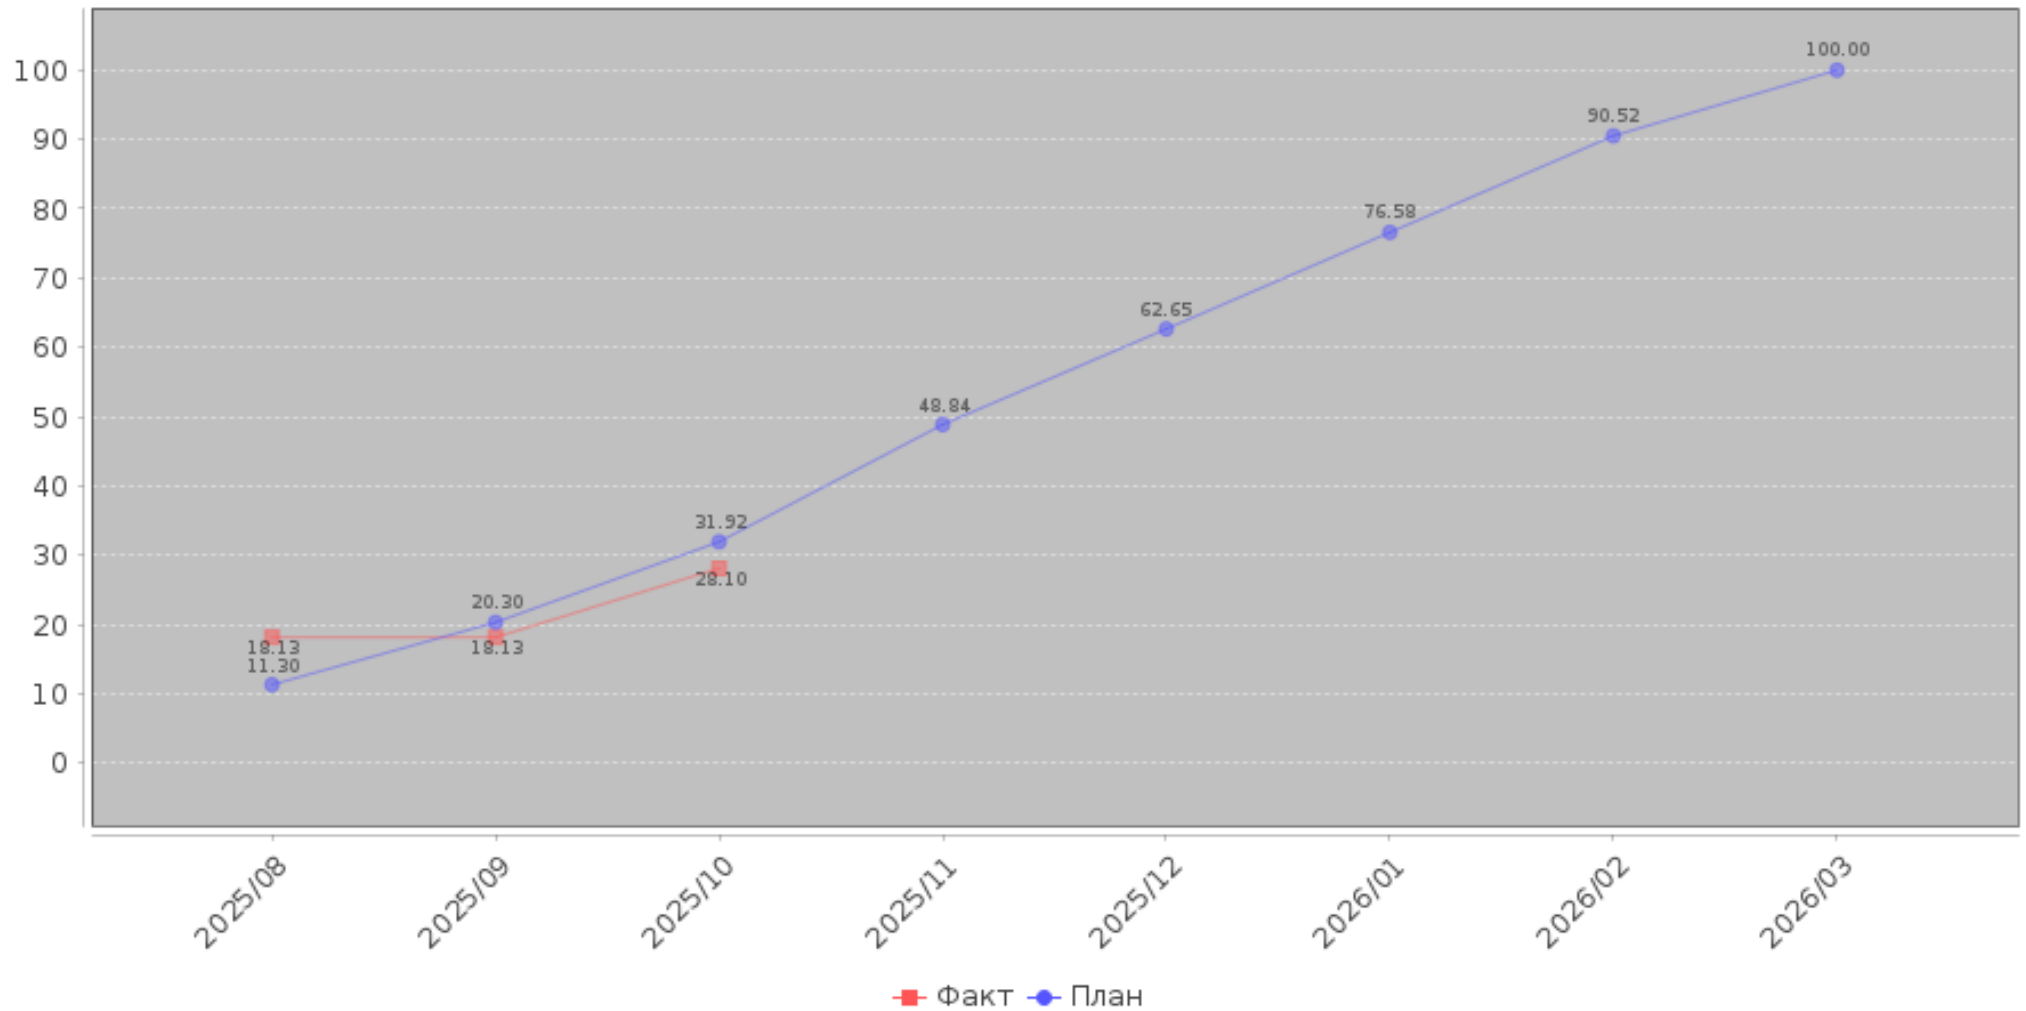

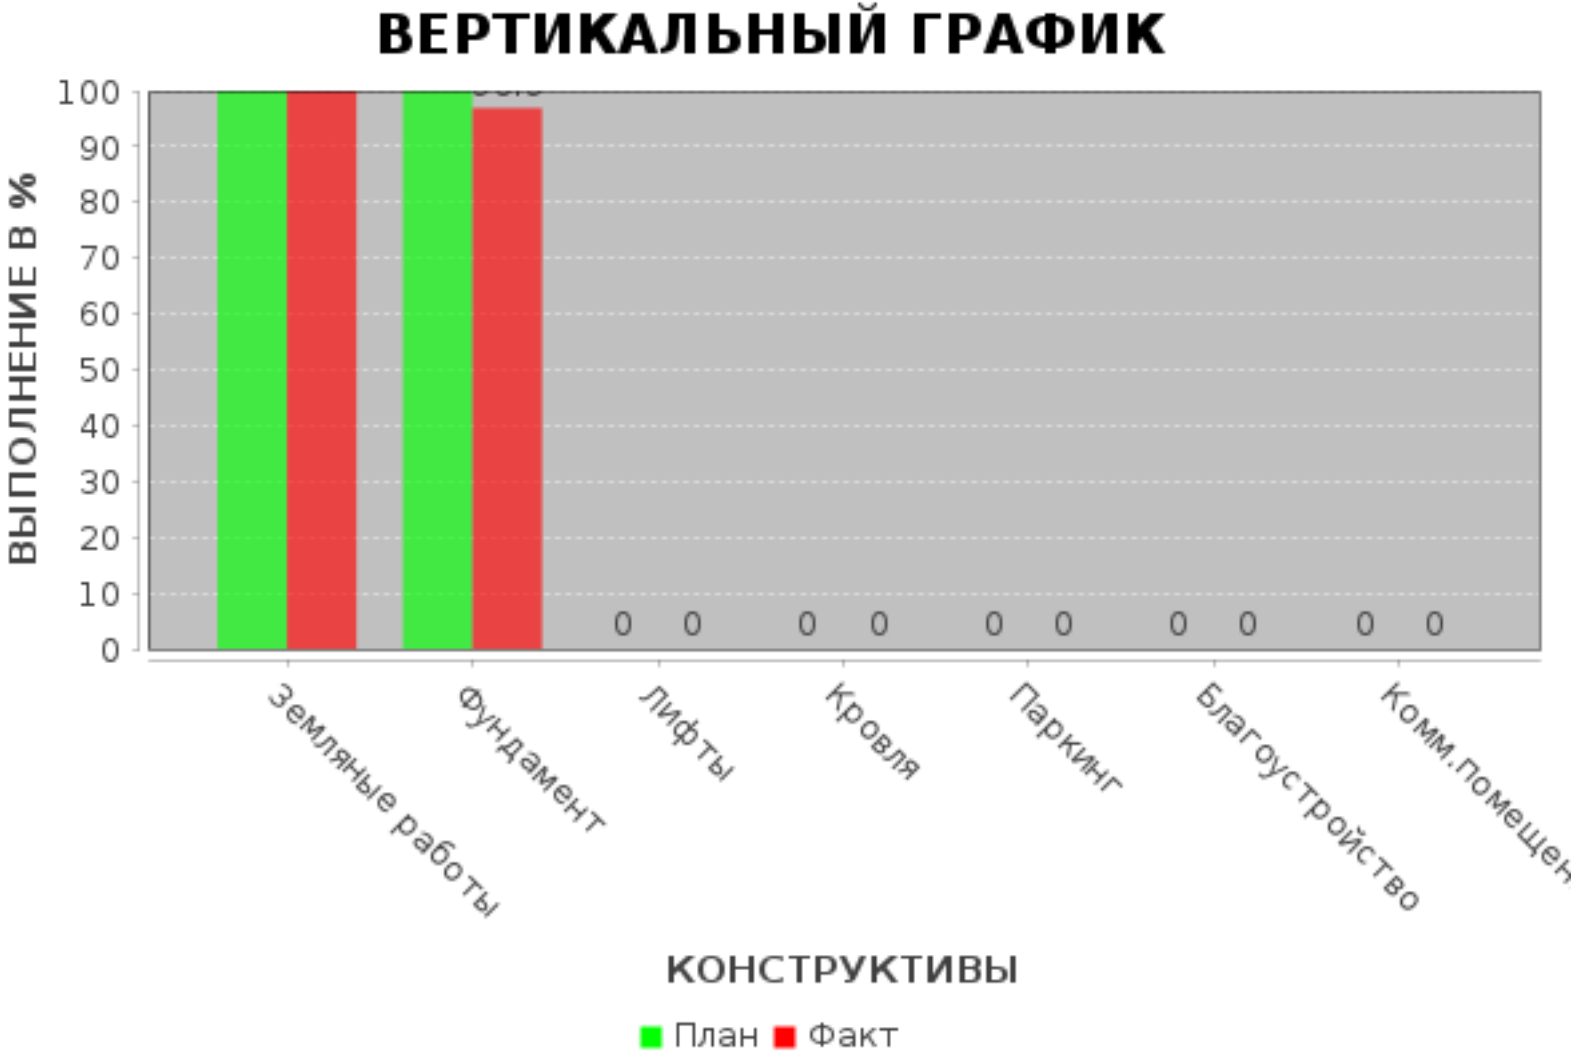

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГРАФИК

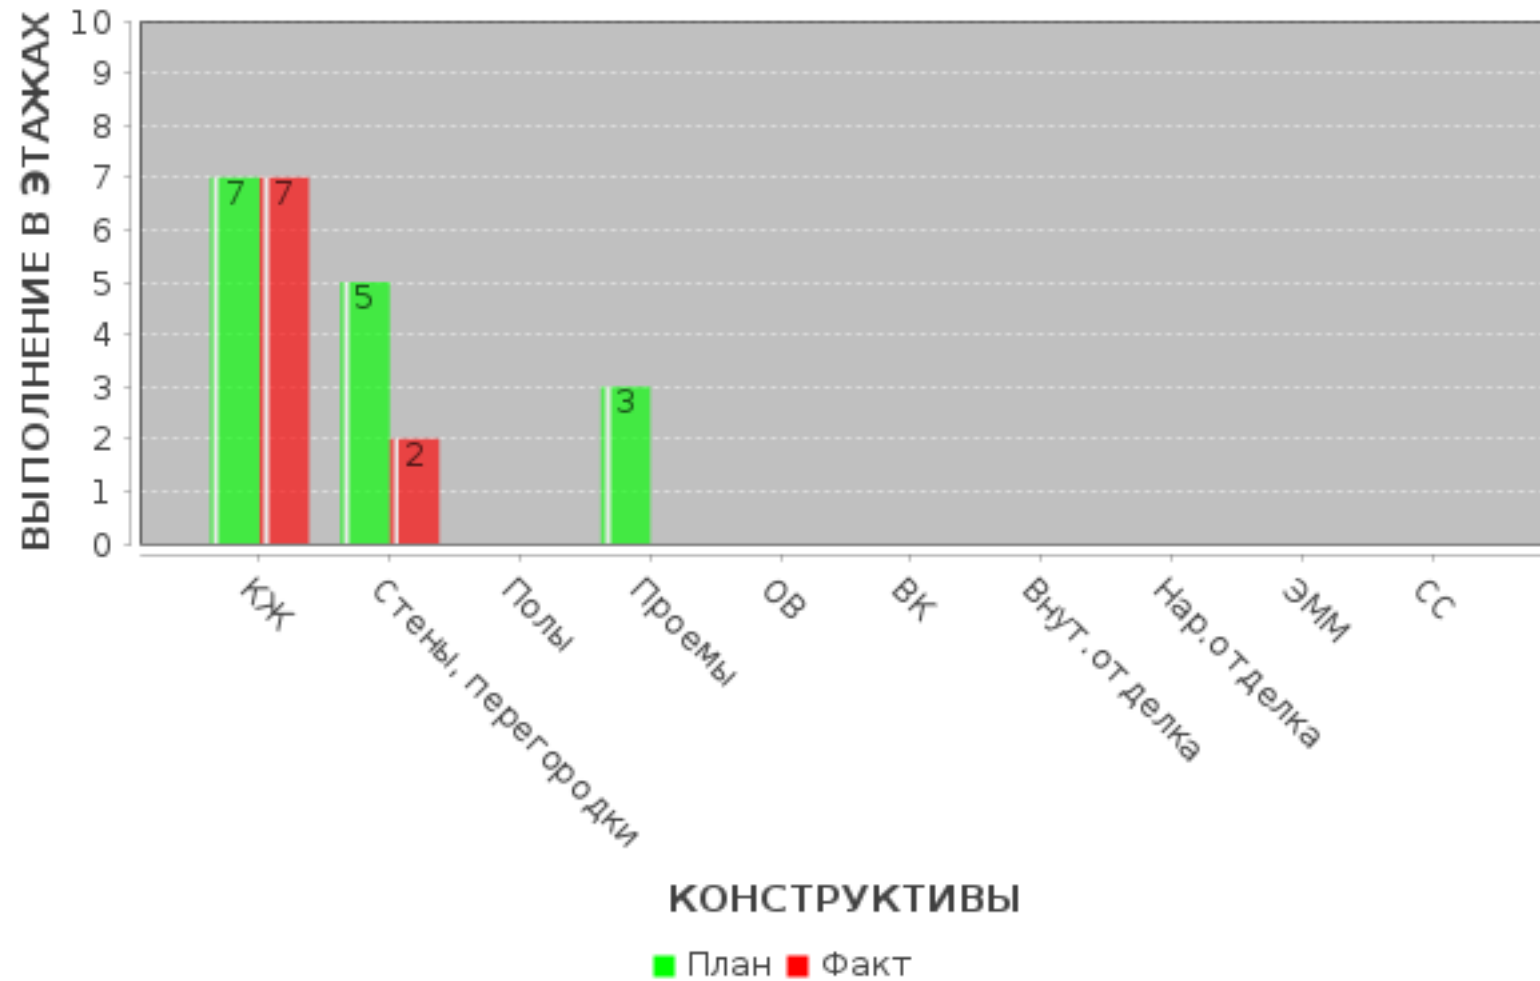

Фотофиксация за отчетный период





© WBP14LP9R4YGTH Timemark Verified

15:37 | 07 ноя 2025
Пт

Астана, Целиноград

Примечания: Бестогай Карагай 5 блок

Timemark
Camera



© CD1EKKLW6PNXD4 Timemark Verified

15:38

07 ноя 2025

Пт

Астана, Целиноград

Примечания: Бестогай Карагай 3 блок

Timemark
Camera



© KX69WET64Uw6LM Timemark Verified

15:34

07 ноя 2025

ПТ

Астана, Целиноград

Примечания: Бестогай Карагай 1 блок

Timemark
Camera

Лист согласования

#	Дата	ФИО	Комментарий
1	12.11.2025 20:53	ШАРАПАТОВА АЙГЕРИМ null	Отправка отчета
2	12.11.2025 20:54	ШАРАПАТОВА АЙГЕРИМ null	Отчет подписан
3	13.11.2025 04:43	АЛИБЕКОВ ДОСЖАН null	Отчет подписан
4	13.11.2025 05:17	ШАЙДУЛЛИНОВ РУСЛАН null	Отчет подписан
5	14.11.2025 06:06	ЛИ КОНСТАНТИН null	Отчет подписан
6	14.11.2025 06:16	КАЙРДЕНОВ САМАТ null	Отчет подписан
7	14.11.2025 06:53	ҚАЙЫРДЕН ЕЛАМАН null	Отчет согласован
8	21.11.2025 07:03	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
9	21.11.2025 07:03	ЯРКОВА ВАЛЕНТИНА null	Отчет согласован
10	21.11.2025 07:15	ИБРАИМОВ ЖАНДОС null	Отчет согласован
